Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

P.O.74.24

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA y ANEJOS
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
DOCUMENTO Nº 3: PPTP
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

JULIO 2024

IDOM

Asistencia técnica de soporte al Departamento de Infraestructuras para la redacción de proyectos en el periodo de 2023 y 2024

ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

ANEJO Nº 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO Nº 2: ANTECEDENTES

ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA

ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

ANEJO Nº 5: GESTIÓN DE RESIDUOS

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PRESUPUESTO

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

IDOM

ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS EN EL PERIODO DE 2023 Y 2024

Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

P.O. 74.24

MEMORIA

Septiembre de 2024

TABLA DE REVISIONES

Edición	Fecha	Redactado	Revisado	Verificado	Objeto de Edición
1	01/10/23	ACA	CTF	MPT	
2	11/03/24	ACA	CTF	MPT	
3	24/07/24	AGA	CTF	MPT	
4	02/09/24	AGA	CTF	MPT	

ÍNDICE

1. OBJETO 5
2. ANTECEDENTES 5
3. NORMATIVA APLICABLE 6
3.1 Generales 6
3.2 Accesibilidad 7
3.3 Edificación y obra civil 7
3.4 Portuario 8
3.5 Seguridad y salud 8
3.6 Medio ambiente 8
3.7 Residuos 8
4. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 8
4.1 Introducción Informe de Accesibilidad 9
4.2 Puerto de Alcudia 10
4.3 Puerto de Maó 13
4.4 Puerto de Eivissa 14
4.5 Puerto de La Savina 15
5. PROGRAMAS DE ORDENADOR UTILIZADOS 16
6. CARTOGRAFÍA. BASES DE REPLANTEO 17
7. INTERFERENCIAS CON LA EXPLOTACIÓN PORTUARIA 17
8. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 17
9. SERVICIOS AFECTADOS 17
10. SEGURIDAD Y SALUD 17
11. REVISIÓN DE PRECIOS 18
12. DECLARACIÓN DE LA OBRA COMPLETA 18
13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 18
14. PRESUPUESTO 19
15. CONSIDERACIÓN FINAL 20

1. OBJETO

Tiene por objeto el presente documento servir de base para la contratación de las obras correspondientes al expediente **"Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina." (P.O.74.24).**

2. ANTECEDENTES

En fecha de agosto de 2023, la APB adjudica a IDOM el contrato de "A.T. de soporte al departamento de infraestructuras para la redacción de proyectos en el periodo 2023-2024" (referencia PO 102.22). El objeto de dicho contrato es el de ofrecer soporte técnico continuado al Departamento de Infraestructuras en la elaboración de los documentos que forman parte de los expedientes del Plan de Inversiones durante el periodo de tiempo indicado.

En el marco del citado contrato, se solicita a IDOM la redacción de un expediente para las **"Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina." (P.O.74.24).**

Se incluyen en el presente expediente las actuaciones correspondientes a los edificios abiertos al público general de los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

En fecha de febrero de 2022, IDP redacta los siguientes documentos que han servido de referencia para la preparación del presente expediente:

- "Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Eivissa"
- "Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de La Savina"
- "Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Maó"
- "Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia"

En dicho documento, se detallan las actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los espacios de uso público de las edificaciones de los puertos mencionados. Los elementos considerados, por haber sido detectados incumplimientos en materia de accesibilidad en los edificios, son los siguientes:

1. Elementos exteriores
    - Pavimentos
    - Aceras
    - Pendientes
    - Vados
    - Rampas

- Pasarelas

2. Espacios interiores
    - Pasillos y áreas de conexión
    - Escaleras
    - Baños
3. Instalaciones
    - Iluminación
4. Equipamiento
    - Asientos
    - Puertas
    - Ascensores
    - Pasamanos y barandillas
    - Señalización y paneles informativos

En el presente expediente se han revisado las actuaciones y criterios propuestos, y se incluyen las actuaciones de edificios de prioridad media y alta que por parte del informe emitido por IDP se consideran que necesitan adaptarse.

Cabe destacar que los informes se prepararon con anterior normativa de accesibilidad, ORDEN VIV/561/2010, ya derogada, así como con normativa portuaria específica de accesibilidad “Manual Técnico de Accesibilidad en el Ámbito Portuario”.

En el presente proyecto se ha actualizado conforme a la normativa vigente, Orden TMA/851/2021. Por lo tanto, existen ciertos umbrales admisibles que difieren ligeramente de lo indicado en las fichas incluidas en el Anejo Nº1 Antecedentes, los cuales se han tenido en cuenta en la propuesta de medidas. En el apartado 4.1 del presente documento se indica a modo de resumen los parámetros a cumplir para las actuaciones consideradas en el presente proyecto.

3. NORMATIVA APLICABLE

Todas las normas citadas, así como los anexos y/o adendas a las mismas, deberán ser tenidas en cuenta en su última edición en el momento de las obras.

En caso de discrepancia entre las normas citadas o entre éstas y la presente especificación, será de aplicación aquella que sea más restrictiva.

3.1 Generales

- Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Con carácter supletorio, se aplicará:

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
- Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas

3.2 Accesibilidad

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. (Normativa Nacional).
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (Normativa Nacional).
- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
- Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia.
- Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, únicamente en el texto no derogado por la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears, en particular el capítulo III del título I («Barreras arquitectónicas en los medios de transporte»), en todo lo que no se oponga al Real decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de las formas de transporte para personas con discapacidad.

3.3 Edificación y obra civil

- Código estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de Junio.
- NCSE-02: Norma de construcción Sismo-resistente: Parte general y edificación (Real decreto 997/2002, de 27 de septiembre)

3.4 Portuario

- CTE DB SE-AE: Código Técnico de Edificación Documento Básico Seguridad Estructural: Acciones en la edificación.
- CTE DB SE: Código Técnico de Edificación Documento Básico Seguridad Estructural

3.5 Seguridad y salud

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre
- Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, modificada por última vez por la Ley 32/2010 de 5 de agosto.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, modificado por última vez por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo

3.6 Medio ambiente

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

3.7 Residuos

- Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES

El Departamento de Desarrollo de Infraestructuras de la APB, encargado de todos los trabajos relacionados con el desarrollo de las infraestructuras portuarias en los cinco puertos gestionados por la APB, requiere la realización de diversas actuaciones en materia de mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

4.1 Introducción Informe de Accesibilidad

Las actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso público deben cumplir con los siguientes requerimientos, de acuerdo con normativa aplicable de accesibilidad:

1. Elementos de urbanización y acceso a edificios
    - Pavimentos. El pavimento debe ser estable y seguro, asegurando continuidad en este. Además, tampoco debe contar con hundimientos y cumplir con la exigencia de resbaladicidad.
    - Aceras. Según la normativa, la acera debería tener una anchura mínima de 1,80 m y excepcionalmente en zonas urbanas consolidadas se permiten anchuras libres de paso de 1,50 metros.
    - Pendiente. La pendiente longitudinal máxima será del 6% y la transversal de 2% según la Orden TMA/851/2021.
    - Rampas. Según la Orden TMA/851/2021, tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y la longitud máxima en proyección horizontal será de 9,00 m. La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3,00 m de longitud, y del 8% para tramos de hasta 9,00 m de longitud, medidos en proyección horizontal. Se colocarán pasamanos a ambos lados. Al inicio y final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos.
    - Puertas de acceso. Siguiendo las indicaciones de la normativa la puerta de acceso deberá tener un ancho de paso mínimo de 80 cm y alto de 210 cm. Las puertas batientes situadas en acceso deben llevar, siempre que sea posible, una barra de accionamiento, de lado a lado, por ambas caras y a una altura de 80 cm ± 5 cm, así como un resorte o dispositivo de cierre automático que evite que queden entreabiertas. Se asegurará un espacio horizontal previo y posterior a la puerta de acceso donde se pueda inscribir un círculo de diámetro de 150 cm. En puertas de vidrio deberá de contar con señalización.

2. Zonas interiores
    - Señalización del itinerario accesible. Utilización de placas de señalización colgadas del techo o adhesivos en paramentos verticales o puertas.
    - Puertas de paso. Deberán tener una altura superior a 210 cm y una anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja de 80 cm mínimo. Se asegurará un espacio horizontal previo y posterior a la puerta de acceso donde se pueda inscribir un círculo de diámetro de 120 cm.
    - Escaleras fijas interiores. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la escalera y fondo de 1,20 m. Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. Se debe disponer de

pasamanos a ambos lados a doble altura y prolongados en los embarques en 30 cm para guiar el recorrido y servir como elemento de apoyo y agarre durante la circulación. Los pasamanos deberán quedar rematados de forma curva o hacia abajo de modo que se eviten colisiones o enganches en los extremos.

- Aseos adaptados. Es necesario que exista señalización SIA en alto relieve y con contraste cromático junto al marco derecho de la puerta en sentido de la entrada a una altura de 160 cm. La puerta debe tener altura libre de mínimo 210 cm y franja inferior abierta. Es indispensable el sistema de llamada de auxilio e iluminación de emergencia, así como una cancela desbloqueable desde el exterior que tenga indicación de ocupación. El inodoro debe estar a una altura de entre 45cm y 50 cm, espacio de transferencia a ambos lados y sus barras no superarán más de 65- 70 cm de separación. La altura de las barras estará entre 70 y 75 cm.

3. Elementos interiores

- Asientos. Dispondrán de un diseño ergonómico con el plano de asiento de una profundidad entre 40 y 45 cm, y una altura entre 40 y 45 cm. Tendrán reposabrazos y un respaldo con altura mínima de 45 cm formando un ángulo máximo de 105° con el plano del asiento. A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 60 cm de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un espacio libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo, que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible.
- Ascensores. En el exterior de las cabinas se debe disponer franjas de pavimento táctil de acanaladura colocadas en sentido transversal a la marcha frente a la puerta del ascensor, en todos los niveles, de 120 cm de ancho por 120 cm de fondo, cromáticamente contrastadas. Además, tiene que contar con señalización de indicador de planta en braille y alto relieve en la jamba sentido salida indicando planta, así como el símbolo SIA normalizado h =160 cm, junto al marco, a la dcha. sentido de la entrada. Se deben colocar pasamanos en las paredes de la cabina donde no existan puertas, el pasamanos debe estar interrumpido al llegar a la botonera. Por último, al ser un ascensor de uso público, también deberá disponer de bucle de inducción magnética.
- Mostradores de atención al cliente. Los mostradores se deben señalizar desde el acceso mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m. Se recomienda dotar al menos a un mostrador de venta de billetes con bucle de inducción y con su pertinente señalización normalizada. Se debe aumentar la anchura del plano de trabajo del mostrador a 100 cm y dotarlo de un espacio libre inferior de 70 cm de altura x100 cm de ancho y 60 cm de profundidad.

4.2 Puerto de Alcudia

Se recogen a continuación el listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso público, agrupados según la codificación original del *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia*.

- E1: En este grupo se incluyen actuaciones relativas a corregir la accesibilidad a los edificios.
- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E3: Se incluye la mejora de accesibilidad de los vestíbulos.
- E5: Las actuaciones consisten en la adecuación de las puertas de paso.
- E6: Se estudian las medidas para mejorar la accesibilidad de los pasillos, pasarelas y áreas de conexión existentes entre los diferentes ámbitos de los edificios.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E10. Se analizan en este apartado las escaleras mecánicas existentes en la Estación Marítima.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E17: Se comprueba que los asientos garanticen comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas en las áreas de espera.
- E22: Se analizan los controles de paso y seguridad.

Se incluye información específica adicional de cada una de las deficiencias detectadas en el Anejo Nº1 Antecedentes, donde se han extraído de los documentos de *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina*, preparados por IDP, las fichas relevantes cuyas actuaciones se incluyen en el presente proyecto.

A continuación, se presenta el listado de actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación de las deficiencias detectadas:

Actuaciones previas

En el puerto de Alcudia, se requieren ejecutar las siguientes actuaciones previas:

- Demolición de estructura del mostrador no accesible con medios manuales.
- Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales.
- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales.
- Repicado de superficie de hormigón.
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos.

Actuaciones de mejora de accesibilidad

Con el fin de mejorar la accesibilidad, se proyectan las siguientes actuaciones, que deberán ser llevadas a cabo de acuerdo con las indicaciones recogidas en la Orden TMA/851/2021, y según detalle de planos:

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado.
- Suministro y colocación de puerta interior de madera para un hueco de obra existente.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Reposición pavimento de loseta para acera similar a las losetas existentes, para las actuaciones de adecuación de mostradores no accesibles.
- Colocación de baldosas con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura, en zonas próximas a paso de peatones y vados peatonales. Además, también se emplean en la entrada y salida de rampas y escaleras, tendrán una anchura igual a la de la rampa y escalera, así como, frente a los mostradores de atención al cliente. La profundidad será hasta edificación existente o si no la hubiere, de 4 metros.
- Colocación de tubo de acero galvanizado de señal vertical, colocado en tierra hormigonado.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.
- Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
- Desmontaje, traslado y posterior montaje de señal existente.
- Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, dos hojas batientes, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible.
- Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible.
- Instalación de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de dimensiones adecuadas para el hueco de obra.
- Formación de rampa compuesta por recrecido de hormigón de 15 cm de espesor medio y suministro y colocación de pavimento cerámico, recibido con mortero adhesivo, previa preparación de la superficie a la colocación.
- Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada.

4.3 Puerto de Maó

Se recogen a continuación el listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los espacios de uso público, agrupados según la codificación original del *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Maó*.

- E1: En este grupo se incluyen actuaciones relativas a corregir la accesibilidad a los edificios.
- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E3: Se incluye la mejora de accesibilidad de los vestíbulos.
- E5: Las actuaciones consisten en la adecuación de las puertas de paso.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E8: Se estudian las rampas interiores de los edificios.
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E12: Las actuaciones incluidas consisten en la mejora de accesibilidad en los ascensores.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E17: Se comprueba que los asientos garanticen comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas en las áreas de espera.
- E24: Se estudia los baños adaptados situados en el interior de los edificios.
- E25: En esta ficha se analiza el diseño de los vestuarios con el objetivo de que garantice la utilización segura y cómoda por parte de cualquier usuario.

Se incluye información específica adicional de cada una de las deficiencias detectadas en el Anejo Nº1 Antecedentes, donde se han extraído de los documentos de *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina*, preparados por IDP, las fichas relevantes cuyas actuaciones se incluyen en el presente proyecto.

A continuación, se presenta el listado de actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación de las deficiencias detectadas:

<u>Actuaciones previas</u>

- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales.
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos.

<u>Actuaciones de mejora de accesibilidad</u>

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.

- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.
- Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.

4.4 Puerto de Eivissa

Se recogen a continuación el listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los espacios de uso público, agrupados según la codificación original del *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Eivissa*.

- E1: En este grupo se incluyen actuaciones relativas a corregir la accesibilidad a los edificios.
- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E3: Se incluye la mejora de accesibilidad de los vestíbulos.
- E5: Las actuaciones consisten en la adecuación de las puertas de paso.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E8: Se estudian las rampas interiores de los edificios.
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E17: Se comprueba que los asientos garanticen comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas en las áreas de espera.

Se incluye información específica adicional de cada una de las deficiencias detectadas en el Anejo Nº1 Antecedentes, donde se han extraído de los documentos de *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina*, preparados por IDP, las fichas relevantes cuyas actuaciones se incluyen en el presente proyecto.

A continuación, se presenta el listado de actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación de las deficiencias detectadas:

<u>Actuaciones previas</u>

- Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales.
- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales.
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos.

<u>Actuaciones de mejora de accesibilidad</u>

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Colocación de baldosas con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura, en zonas próximas a paso de peatones y vados peatonales. Además, también se emplean en la entrada y salida de rampas y escaleras, tendrán una anchura igual a la de la rampa y escalera, así como, frente a los mostradores de atención al cliente. La profundidad será hasta edificación existente o si no la hubiere, de 4 metros.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.
- Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
- Suministro y colocación de marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor.

4.5 Puerto de La Savina

Se recogen a continuación el listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los espacios de uso público, agrupados según la codificación original del *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de La Savina*.

- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E24: Se estudia los baños adaptados situados en el interior de los edificios.

Se incluye información específica adicional de cada una de las deficiencias detectadas en el Anejo Nº1 Antecedentes, donde se han extraído de los documentos de *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina*,

preparados por IDP, las fichas relevantes cuyas actuaciones se incluyen en el presente proyecto.

A continuación, se presenta el listado de actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación de las deficiencias detectadas:

Actuaciones previas

- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales.
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos.

Actuaciones de mejora de accesibilidad

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Colocación de baldosas con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura, en zonas próximas a paso de peatones y vados peatonales. Además, también se emplean en la entrada y salida de rampas y escaleras, tendrán una anchura igual a la de la rampa y escalera, así como, frente a los mostradores de atención al cliente. La profundidad será hasta edificación existente o si no la hubiere, de 4 metros.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.

5. PROGRAMAS DE ORDENADOR UTILIZADOS

Para la redacción del presente proyecto se han utilizado los siguientes programas informáticos:

- Documentación escrita: MICROSOFT WORD, EXCEL
- Plan de obra: MICROSOFT PROJECT
- Documentación gráfica: AUTOCAD 2022
- Presupuestos: PRESTO

6. CARTOGRAFÍA. BASES DE REPLANTEO

La documentación gráfica que incluye el presente proyecto se ha desarrollado sobre la base cartográfica del puerto facilitada por la APB, por lo que todos los planos están referenciados a las coordenadas originales de dicha cartografía. Por lo tanto, a partir de los planos CAD de este proyecto es posible definir las bases de replanteo de los trabajos que se describen.

7. INTERFERENCIAS CON LA EXPLOTACIÓN PORTUARIA

Las obras se realizarán de tal manera que se minimicen las interferencias con la explotación portuaria.

Si resultase necesario el desplazamiento de equipos o instalaciones o interrumpir las obras por causas derivadas de la explotación portuaria, sea de la titularidad que sea, dichos desplazamientos o interrupciones se efectuarán sin que por ello el Adjudicatario tenga derecho a percepción alguna.

8. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

De acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, no es preceptiva la confección de ningún estudio de impacto ambiental debido a las actuaciones descritas en este proyecto.

En cualquier caso, se describirán los aspectos relevantes en materia medioambiental recogidos en el presente proyecto. Los residuos generados en la demolición se gestionarán adecuadamente mediante transporte y tratamiento a vertedero autorizado.

9. SERVICIOS AFECTADOS

Se prevé la afección de servicios, de la red de baja tensión. Se procederá a la desconexión de los servicios existentes previamente al comienzo de los trabajos.

10. SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con los preceptos fijados en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se redactará un Estudio de Seguridad y Salud Laboral en el que estén recogidas las directrices en cuanto a prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales y enfermedades a terceros. Este documento se incluirá como anejo de esta memoria.

11. REVISIÓN DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecución de los trabajos es INFERIOR A UN AÑO no procede la aplicación de cláusula alguna de revisión de precios, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

12. DECLARACIÓN DE LA OBRA COMPLETA

Conforme a la normativa vigente, se hace constar que el proyecto corresponde a una obra completa, susceptible de ser entregada, una vez terminada, al uso general y/o correspondiente.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO

El presente proyecto consta de los siguientes documentos:

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS

- MEMORIA
- ANEJO Nº 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
- ANEJO Nº 2: ANTECEDENTES
- ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA VALORADO
- ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
- ANEJO Nº 5: GESTIÓN DE RESIDUOS

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

- MEDICIONES
- CUADRO DE PRECIOS Nº 1
- CUADRO DE PRECIOS Nº 2
- PRESUPUESTO
- RESUMEN PRESUPUESTO

14. PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	PUERTO ALCUDIA	112.530,09	43,78
02	PUERTO MAÓ	28.883,38	11,24
03	PUERTO EIVISSA	77.715,63	30,24
04	PUERTO LA SAVINA	32.631,21	12,70
05	SEGURIDAD Y SALUD	5.250,00	2,04

		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**257.010,31**
13,00	% Gastos generales	33.411,34	
6,00	% Beneficio industrial	15.420,62	
	Suma		48.831,96
		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	**305.842,27**
	21% IVA		64.226,88
		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	**370.069,15**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

15. CONSIDERACIÓN FINAL

Con todo lo expuesto en esta memoria y en los documentados citados en el apartado anterior, quedan completamente definidas las obras contenidas en este proyecto, y se justifica la solución adoptada, razón por la que se da por finalizado el presente documento.

En Palma de Mallorca, septiembre de 2024

El Autor del Proyecto

Carlos Torralba Feliu

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Revisado y conforme,

El Jefe de Área de Infraestructuras

Víctor Darder Gallardo

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Vº Bº

El Director

Antonio Ginard López

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

ANEJO Nº 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. P.O. 74.24 "ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

N.º INFORME: 0/2003857/1/012/02141

INGENIERÍA | CONTROL DE CALIDAD | GEOTECNICA | EDIFICACIÓN | CERTIFICACIÓN | I+D+I | SEGURIDAD Y SALUD

C\ Benaque, 9

T. + 34 952 230 842 Cell Phone +34 600 111 222

www.cemosa.es

Delegación de Málaga

cemosa
Ingeniería y Control

ÍNDICE DE CONTENIDO

MEMORIA 1

1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 2

1.1 Datos generales del proyecto y del estudio básico de seguridad y salud 2

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 4

2.1 Cálculo mensual del número medio de trabajadores a intervenir 9

2.2 Planificación de la obra 10

2.3 Tráfico rodado, peatonal y accesos 11

2.4 Organización de obra. Ubicación de instalaciones de higiene y bienestar y zona de acopio de material de obra 12

2.5 Servicios afectados, condiciones del entorno y ambientales 12

3 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 13

4 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 13

5 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 14

6 INSTALACIONES HIGIÉNICAS Y DE BIENESTAR 14

7 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 15

7.1 Identificación de riesgos evitables 15

7.2 Identificación de riesgos no evitables de las unidades de obra, equipos técnicos y medios auxiliares 16

7.3 Unidades de obra con tareas críticas 17

7.4 Riesgos durante la implantación de seguridad y salud 19

7.5 Previsión e información para efectuar en condiciones de seguridad y salud los previsibles trabajos posteriores de reparación, conservación y mantenimiento. 19

8 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 19

9 ACTUACIONES ANTE UNA EMERGENCIA. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES 21

10 SISTEMA PARA EL CONTROL DE ACCESOS 27

11 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 28

12 VALORACIÓN PREVENTIVA 29

APÉNDICE 1: FICHAS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS UNIDADES DE OBRA 30

1 TRABAJOS PREVIOS. VALLADO Y SEÑALIZACIÓN 31

2 TRABAJOS PREVIOS. ACOMETIDA ELÉCTRICA PROVISIONAL 33

3 TRABAJOS PREVIOS. INSTALACIÓN DE CASETAS. 37

4 TRABAJOS PREVIOS. RETIRADA DE RESIDUOS NO PELIGROS E INERTES 39
5 TRABAJOS PREVIOS. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO 42
6 TRABAJOS PREVIOS. DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE. 43
7 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA 49
8 SOLERÍAS 51
9 COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR 52
10 ACABADOS 55
11 TRABAJOS CON HORMIGON 58
12 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 61
13 CARPINTERÍA DE MADERA Y DE ALUMINIO 64
14 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 70
15 VIDRIERÍAS 72
16 COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 76
17 PINTADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 78
18 MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN ZONAS COMUNES 79
19 GENERAL. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 81
20 GENERAL-TRABAJOS DE SOLDADURA 86
21 GENERAL-MANEJO MANUAL DE CARGAS 88
22 GENERAL. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES 93
23 TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL- MOVIMIENTO DE CARGAS SUSPENDIDAS 96
24 TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL. TRABAJOS EN ALTURA 98
APÉNDICE 2: FICHAS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES 106
1 CARRETILLA DE MANO 107
2 ESLINGAS, CABLES Y GANCHOS 107
3 ESCALERA MANUAL 108
4 ANDAMIOS SOBRE RUEDAS 109
5 TRANSPALETA MANUAL 111
APÉNDICE 3: FICHAS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA 113
1 MÁQUINAS HERRAMIENTAS 114
2 HERRAMIENTAS MANUALES 115
3 HERRAMIENTAS MANUALES ELÉCTRICAS 116
4 BOMBA DE HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN 117
5 COMPRESOR 119

6 MARTILLO NEUMATICO. 122

7 PALA CARGADORA 123

8 RETROEXCAVADORA 126

9 CAMIÓN GRÚA 128

10 CAMIÓN DE TRANSPORTE 130

11 HORMIGONERA 132

12 PULIDORA 134

13 MÁQUINA P/ PINTAR BANDA VIAL AUTOPROPULSADA 135

14 EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA 137

15 EMBARCACIONES AUXILIARES- BARCAZA O PONTONA 138

PLIEGO DE CONDICIONES 144

1 NORMATIVA 145

2 CARACTERÍSTICA DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE OBRA 152

2.1 Características de empleo y conservación de máquinas 152

2.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas 153

3 CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS PREVENTIVOS. 153

3.1 Equipos de protección individual 153

3.2 Equipos de protección colectiva 155

4 CONDICIONES GENERALES 157

4.1 Condiciones generales de la obra 157

4.2 Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra 157

5 CONDICIONES LEGALES 163

5.1 Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y que deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución 163

5.2 Otras especificaciones para la obra proyectada 171

5.3 Obligaciones en relación a la ley 32/2006 178

6 CONDICIONES FACULTATIVAS 182

6.1 Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra proyectada relativas a contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 182

6.2 Vigilancia de la Salud 193

7 CONDICIONES TÉCNICAS.....195

7.1 Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso, comedores y primeros auxilios 195

7.2 Requisitos de los equipos de protección individual y sus accesorios en cuanto a su diseño, fabricación, utilización y mantenimiento 197

7.3 Requisitos de los equipos de protección colectiva 198

7.4 Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, seguridad vial, etc. .. 201

7.5 Requisitos para la correcta utilización y mantenimiento de los útiles y herramientas portátiles..... 202

7.6 Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de los medios auxiliares..... 203

7.7 Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria 204

7.8 Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de las instalaciones provisionales..... 205

7.9 Índices de control..... 208

MEMORIA

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD P.O. 74.24 “ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Autor: Dña. Cristina Cobalea Medina

Ingeniero Industrial- Nº Col: 980

1 Antecedentes y objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud

A petición AUTORIDAD PORTURARIA DE BALEARES con C.I.F.: Q0767004E solicita a CEMOSA la elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud, constatándose la no existencia de obligación de redacción de un Estudio de Seguridad y Salud ya que no se cumplen ninguno de los supuestos del artículo 4.1 del R.D. 1627/97:

Se redacta, por tanto, un Estudio Básico de Seguridad y Salud y en cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 4 y del artículo 6, el promotor designa como redactor a Dña. Cristina Cobalea Medina, Ingeniero Industrial- Nº Col: 980. Dicho Estudio se redactará en cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, en su artículo 5, y tiene como finalidad principal, establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, durante la ejecución y trabajos posteriores, del proyecto de construcción de P.O. 74.24 "ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Para la redacción del presente estudio se ha recurrido a las siguientes fuentes:

- Proyecto de obra. Relación de unidades, especificaciones y valoración, propuesta por la Autoridad Portuaria de Baleares.

1.1 Datos generales del proyecto y del estudio básico de seguridad y salud

DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	
Promotor de la obra:	Autoridad Portuaria de Baleares MOLL VELL, 3-5 07012, PALMA DE MALLORCA, BALEARES 971228150 Q0767004E
Proyecto sobre el que se trabaja:	P.O. 74.24 "ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"
Autor:	Dña. Cristina Cobalea Medina Ingeniero Industrial- Nº Col: 980

	CEMOSA, C/ Benaque Nº9, 29004, Málaga
Plazo para la ejecución de la obra:	SEIS (6) MESES
Presupuesto de Ejecución Material	257.010,31 €
Presupuesto de Seguridad y Salud	5.250 €
Localización de la obra	Edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Elvissa y La Savina
Tipología de la obra a construir:	Edificación

Es voluntad del autor de este Estudio Básico de Seguridad y Salud identificar los riesgos y evaluar la eficacia de la prevención prevista sobre el proyecto y consecuentemente, diseñar la prevención que pueda idear a su buen saber y entender técnico.

Confía en que, si surgiese alguna laguna preventiva, el contratista, como empresario principal, a la hora de elaborar su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, proponiendo la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que el promotor AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES.

Se confía en que, con los datos mencionados anteriormente y el perfil empresarial exigible al contratista, el contenido de este Estudio Básico de Seguridad y Salud sea coherente con la tecnología utilizable por el mismo, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que elabore encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo.

En este trabajo, se considera que es obligación del Contratista, disponer los recursos materiales, económicos, humanos, preventivos y de formación necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea seguro.

Los objetivos de este trabajo preventivo son:

- Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los procedimientos de trabajo y organización previstos para la ejecución de la obra, así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
- Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción.
- Colaborar con el proyectista para estudiar y adoptar soluciones técnicas y de organización que permitan incorporar los Principios de Acción Preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que eliminen o disminuyan los riesgos.
- Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.
- Relacionar los riesgos inevitables especificando las soluciones para controlarlos y reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.

- Diseñar, proponer y poner en práctica tras la toma de decisiones de proyecto y como consecuencia de la tecnología que se utilizará definir las: soluciones por aplicación de tecnología segura en sí misma, protecciones colectivas, equipos de protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y comunes, a implantar durante todo el proceso de esta construcción.
- Presupuestar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la comprensión de la prevención proyectada.
- Ser base para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud por el contratista y formar parte junto al mismo y el plan de prevención de empresa, de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.
- Divulgar la prevención proyectada para esta obra, a través del Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista. La divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción. Se espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia el contratista, los subcontratistas y los trabajadores autónomos que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. En cualquier caso, se recuerda, que en virtud del RD 171/2004, cada empresario, se convierte en "contratista principal de aquellos a los que subcontrata y estos a su vez de los que subcontraten, por consiguiente, el estudio básico de seguridad y salud deberá resolver eficazmente el método de comunicación de riesgos y su solución en dirección a las subcontrataciones y de éstas hacia los diversos "empresarios principales".
- Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz.
- Definir las actuaciones a seguir en el caso de accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.
- Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.
- Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.
- Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.

2 Descripción general de la obra

Se recibe por parte del Promotor el encargo de la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud del P.O. 74.24 "ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA".

Las obras se realizarán íntegramente en los espacios urbanizados abiertos al público general del puerto de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

Las actuaciones por realizar para mejorar la accesibilidad de los espacios públicos de las instalaciones de los puertos parten de los planes estratégicos para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de cada uno de los puertos mencionados.

Las actualizaciones mencionadas son las siguientes:

1. **Elementos exteriores:** • Pavimentos • Aceras • Pendientes • Vados• Rampas • Pasarelas

2. Espacios interiores: • Pasillos y áreas de conexión • Escaleras • Baños

3. Instalaciones: • Iluminación

4. Equipamiento: • Asientos • Puertas • Ascensores • Pasamanos y barandillas • Señalización y paneles informativos

A continuación, se procede a detallar las actuaciones proyectadas en cada uno de los cuatro puertos que forman parte del proyecto objeto de estudio y un listado de actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación de las deficiencias detectadas.

En el Anejo Nº2 Antecedentes se incluye información específica adicional de cada una de las deficiencias detectadas donde se han extraído de los documentos de Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina, preparados por IDP, las fichas relevantes cuyas actuaciones se incluyen en el presente proyecto.

Puerto de Alcudia

Listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso publico

- E1: En este grupo se incluyen actuaciones relativas a corregir la accesibilidad a los edificios.
- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E3: Se incluye la mejora de accesibilidad de los vestíbulos.
- E5: Las actuaciones consisten en la adecuación de las puertas de paso.
- E6: Se estudian las medidas para mejorar la accesibilidad de los pasillos, pasarelas y áreas de conexión existentes entre los diferentes ámbitos de los edificios.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E10. Se analizan en este apartado las escaleras mecánicas existentes en la Estación Marítima.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E17: Se comprueba que los asientos garanticen comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas en las áreas de espera.
- E22: Se analizan los controles de paso y seguridad

  – Actuaciones previas

- En el puerto de Alcudia, se requieren ejecutar las siguientes actuaciones previas: -
- Demolición de estructura del mostrador no accesible con medios manuales.
- Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales.
- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales.
- Repicado de superficie de hormigón.
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos.

- Actuaciones de mejora de accesibilidad

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado.
- Suministro y colocación de puerta interior de madera para un hueco de obra existente.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Reposición pavimento de loseta para acera similar a las losetas existentes, para las actuaciones de adecuación de mostradores no accesibles.
- Colocación de baldosas con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura, en zonas próximas a paso de peatones y vados peatonales. Además, también se emplean en la entrada y salida de rampas y escaleras, tendrán una anchura igual a la de la rampa y escalera, así como, frente a los mostradores de atención al cliente. La profundidad será hasta edificación existente o si no la hubiere, de 4 metros.
- Colocación de tubo de acero galvanizado de señal vertical, colocado en tierra hormigonado.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.
- Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
- Desmontaje, traslado y posterior montaje de señal existente.
- Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, dos hojas batientes, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible.
- Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible.
- Instalación de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de dimensiones adecuadas para el hueco de obra.
- Formación de rampa compuesta por recrecido de hormigón de 15 cm de espesor medio y suministro y colocación de pavimento cerámico, recibido con mortero adhesivo, previa preparación de la superficie a la colocación.
- Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada.

Puerto de Eivissa

Listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso publico

- E1: En este grupo se incluyen actuaciones relativas a corregir la accesibilidad a los edificios.
- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E3: Se incluye la mejora de accesibilidad de los vestíbulos.
- E5: Las actuaciones consisten en la adecuación de las puertas de paso.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E8: Se estudian las rampas interiores de los edificios.

- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E17: Se comprueba que los asientos garanticen comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas en las áreas de espera

  – Actuaciones previas

- Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales.
- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales.
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos.

  – Actuaciones de mejora de accesibilidad

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Colocación de baldosas con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura, en zonas próximas a paso de peatones y vados peatonales. Además, también se emplean en la entrada y salida de rampas y escaleras, tendrán una anchura igual a la de la rampa y escalera, así como, frente a los mostradores de atención al cliente. La profundidad será hasta edificación existente o si no la hubiere, de 4 metros.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.
- Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
- Suministro y colocación de marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor.

Puerto de Maó

Listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso publico

- E1: En este grupo se incluyen actuaciones relativas a corregir la accesibilidad a los edificios.
- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E3: Se incluye la mejora de accesibilidad de los vestíbulos.
- E5: Las actuaciones consisten en la adecuación de las puertas de paso.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E8: Se estudian las rampas interiores de los edificios.
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E12: Las actuaciones incluidas consisten en la mejora de accesibilidad en los ascensores.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E17: Se comprueba que los asientos garanticen comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas en las áreas de espera.

- E24: Se estudia los baños adaptados situados en el interior de los edificios.
- E25: En esta ficha se analiza el diseño de los vestuarios con el objetivo de que garantice la utilización segura y cómoda por parte de cualquier usuario.

  – Actuaciones previas

- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales.
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos.

  – Actuaciones de mejora de accesibilidad

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.
- Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.

Puerto de la Savina

Listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso publico

- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E24: Se estudia los baños adaptados situados en el interior de los edificios.

  – Actuaciones previas

- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales.
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos.

  – Actuaciones de mejor de accesibilidad

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Colocación de baldosas con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura, en zonas próximas a paso de peatones y vados peatonales. Además, también se emplean en la entrada y salida de rampas y escaleras, tendrán una anchura igual a la de la

rampa y escalera, así como, frente a los mostradores de atención al cliente. La profundidad será hasta edificación existente o si no la hubiere, de 4 metros.

- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. - Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.

2.1 Cálculo mensual del número medio de trabajadores a intervenir

Para saber el número de trabajadores que es necesario que intervengan en la obra, se utiliza el cálculo global de la influencia en el precio de mercado, de la mano de obra necesaria.

CALCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES	
Presupuesto de Ejecución Material	257.010,31 €
Importe la mano de obra	64.252,58 €
N.º medio de horas trabajadas por los trabajadores en un año	1.736 horas
Plazo de ejecución	SEIS (6) MESES
Plazo para la ejecución de la obra:	1736/12*6=868horas
Precio medio hora/ trabajadores	21 €/h
Coste global / trabajador en el plazo de ejecución de la obra	868 * 21€/h = 18.228 €
Número de trabajadores estimados por el autor	64.252,58 €/ 18.228 €= 3,5 20 % en punta: 4*1.2 = 5 **5 trabajadores**

El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores", arroja como resultado **5 trabajadores** de media, correspondiente al número de trabajadores que pueden intervenir en la obra ya que en determinados momentos puntuales la cantidad de trabajadores puede aumentar el 20%.

Sí es cierto que existirán situaciones especiales en que la actividad de presencia de personal será mayor o menor, por ello se tomará la cantidad de trabajadores reflejada como una estimación, quedando a disposición del contratista principal la decisión del número de trabajadores si efectuara alguna modificación en el estudio, debiendo adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad, y según el plan de ejecución de las obras que tenga pensado realizar.

2.2 Planificación de la obra

La planificación de los trabajos será la que determine la empresa encargada de la ejecución de los trabajos y siempre bajo el acuerdo del jefe de obra. Se seguirá para dicha planificación el orden que se establece en las correspondientes unidades de obra.

Esta planificación podrá verse modificada antes o durante el transcurso de los trabajos, ya que, inevitablemente, toda ella estará condicionada por la operativa de ejecución que plantee la empresa adjudicataria, así como por los condicionantes que puedan imponer tanto la Autoridad Portuaria de Baleares u otros imprevistos o circunstancias que pudieran presentarse con el inicio y desarrollo de los trabajos. Se establece como suficiente para la ejecución de las obras un plazo de SEIS (6) MESES a partir del Acta de Comprobación del Replanteo.

La planificación de la obra se encuentra detallada en el ANEJO 3: PLAN DE OBRA de proyecto, la cual se encuentra planificada de la siguiente manera

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
PUERTO ALCUDIA						
OFICINAS APB						
ESTACIÓN MARÍTIMA						
LONJA						
PUERTO EIVISSA						
APB						
ESTACIÓN MARÍTIMA						
EDIFICIO MARTILLO						
PUERTO MAÓ						
EM CRUCEROS						
EM COS NOU						
PUERTO LA SAVINA						
ESTACIÓN MARÍTIMA						
SEGURIDAD Y SALUD						

En cualquier caso, la empresa adjudicataria en el Plan de seguridad y salud debe incluir un plan de trabajos donde haya tenido en cuenta los criterios preventivos a la hora de proponer la secuencia de trabajos; que evite el solape entre distintas actividades de obra, en particular cuando se realicen actividades fundamentalmente de manipulación de cargas suspendidas no debe realizarse otra actividad en las cercanías, además de realización de trabajos a diferentes niveles, trabajos en horas de mayor nivel de calor, trabajos nocturnos.

2.3 Tráfico rodado, peatonal y accesos

El acceso a la zona de actuación se realizará a través de los accesos establecidos en cada uno de los espacios urbanizados abiertos al público general del puerto de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

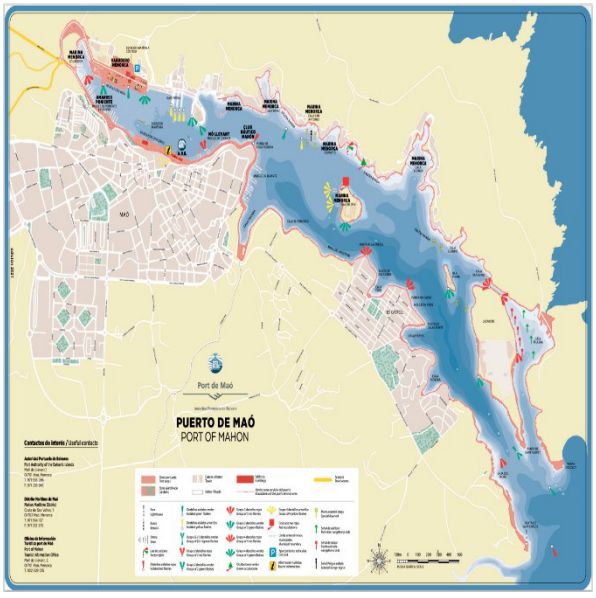

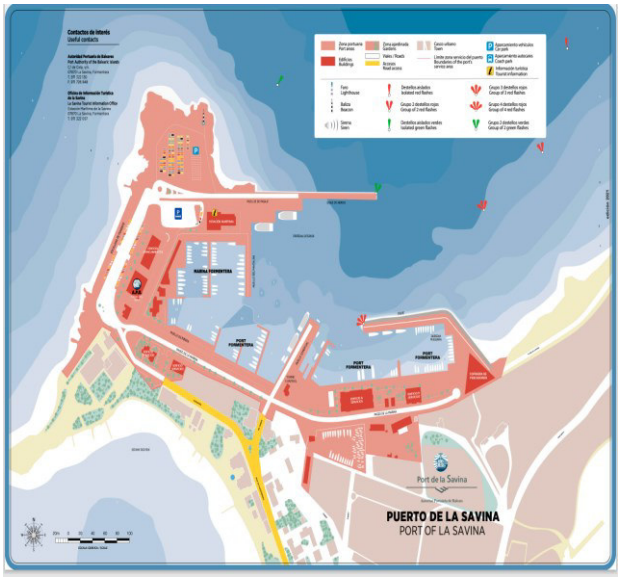

Accesos a la zona de actuación

- Los accesos a los lugares de trabajo deberán de cumplir con lo siguiente:
  - *Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en la zona de actuación.*

- *Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.*
- *Las zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.*
- *Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá ser claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones.*

2.4 Organización de obra. Ubicación de instalaciones de higiene y bienestar y zona de acopio de material de obra

- Zona de acopio de material de obra: Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

  Los residuos generados en la obra se acopiarán temporalmente, con medios apropiados para su acopio sin generar riesgos a los propios actores de la obra o a terceros, en una zona especialmente habilitada para ello y que estará perfectamente señalizada y balizada. Esta zona de vertido temporal tendrá, a su vez, varias zonas de vertido, una para cada fracción a separar. Una vez a la semana, o con mayor periodicidad si así lo exige el ritmo de producción de residuos, se retirarán a vertedero o a gestor autorizado, según la naturaleza de los mismos.

- Zona de instalaciones de higiene y bienestar: En el Plan de Seguridad y Salud el contratista situará la ubicación de estas instalaciones.

2.5 Servicios afectados, condiciones del entorno y ambientales

2.5.1 Climatología

El clima de las zonas de actuación de este proyecto se caracterizan por temperaturas suaves en invierno y extremas en verano con precipitaciones durante los meses de primavera y otoño. Durante los meses de verano se tratará de mitigar las altas temperaturas predominantes durante el desarrollo de los trabajos Se prestará especial atención a los riesgos derivados de las tormentas con fuerte aparato eléctrico en cuyo caso se paralizarán de inmediato los trabajos.

2.5.2 Interferencias y servicios afectados por la situación de la obra

Es de vital importancia el detectar los servicios afectados previamente al comienzo de los trabajos. Se recabará, como norma general, toda la información disponible relativa al trazado de servicios de agua, líneas eléctricas, conducciones de gas, etc. en caso de existir.

<u>Servicios afectados</u>

A la fecha de redacción de este estudio se prevé la afección de servicios, de la red de baja tensión. Se procederá a la desconexión de los servicios existentes previamente al comienzo de los trabajos.

En caso de presentarse otros, deberán indicarse en el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista las medidas preventivas para estas situaciones y trabajos.

Interferencias con la explotación portuaria

Las obras se realizarán de tal manera que se minimicen las interferencias con la explotación portuaria.

3 Unidades de construcción previstas en la obra

En coherencia con la descripción las actuaciones, se muestra el listado de las unidades de obra que serán analizadas para identificar los riesgos y las medidas preventivas y de protección, cuyas fichas aparecerán adjuntas en el Apéndice 1:

- Trabajos previos:
  - Vallado y señalización de la zona de actuación
  - Detección de acometida eléctrica
  - Instalación de casetas.
  - Retirada de residuos no peligrosos
  - Ordenación de tráfico rodado
  - Demolición y desmontaje
- Trabajos de albañilería
- Solerías
- Colocación de pavimento exterior
- Acabados
- Trabajos con hormigón
- Trabajos de Encofrado y desencofrado
- Carpintería de madera y de aluminio
- Carpintería metálica y cerrajería
- Vidrierías
- Colocación de señalización
- Pintado de señalización horizontal
- General- Instalaciones eléctricas
- General - Trabajos soldadura
- General- Manejo manual de cargas
- General- Transporte y acopio de materiales
- Trabajos con riesgo especial - Movimiento de cargas suspendidas
- Trabajos con riesgo especial- Trabajos en altura

4 Medios auxiliares previstos para la realización de la obra

Del análisis de las actividades valoradas en el Pliego de Prescripciones Técnicas se muestra una relación de los medios auxiliares que son susceptibles de ser utilizados, desarrollados en el Apéndice 2. Se consideran propiedad del contratista o de algún subcontratista y bajo el control directo del anterior; y por tanto que cada

empresario es responsable de que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto y que cumple el RD 1215/97, condiciones mínimas de seguridad y salud que deben cumplir los equipos de trabajo para ser usado con los trabajadores.

- Carretilla manual
- Eslingas, cables y ganchos
- Escalera de manos
- Andamios sobre ruedas
- Transpaleta manual

5 Maquinaria prevista para la ejecución de la obra

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra:

En el Capítulo de Equipos Técnicos, apéndice 3, se detallan especificando la identificación de los riesgos laborales que puede ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.

- Máquinas herramientas en general
- Herramientas manuales y eléctricas
- Compresor
- Martillos neumáticos
- Pala cargadora
- Retroexcavadora mediana
- Camión transp.
- Camión grúa
- Camión bomba hormigonar
- Hormigonera
- Máquina p/pintar banda vial autopropulsada
- Pulidora
- Barcaza o pontona

6 Instalaciones higiénicas y de bienestar

Servicios higiénicos.

Se definen así a aquellas instalaciones que dispondrá la empresa constructora para el desarrollo de las funciones propias de servicios higiénicos, vestuario, comedor para los operarios y oficina de obra.

En esta obra se instalará un aseo químico portátil para el caso de que no se puedan utilizar los aseos del de las instalaciones de los puertos mencionados. Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil acceso y en caso de que no puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos.

Locales de descanso y alojamiento

Son las instalaciones que dispondrá la empresa constructora para el descanso y el alojamiento. Para el caso que nos ocupa no existirán locales de descanso.

En cuanto a las instalaciones de comedor para los trabajadores, éstas podrán ser prescindibles siempre que el contratista. presente un convenio con algún local de restauración y/o ocio cercano a la zona de actuación donde el personal de obra pueda comer.

El trabajador se presentará en el puesto de trabajo con la ropa de trabajo adecuada, de manera que no será necesaria la instalación de vestuarios.

Agua potable

En la obra los trabajadores dispondrán de agua potable en cantidad suficiente, tanto en los locales de descanso y aseos.

7 Identificación de riesgos

7.1 Identificación de riesgos evitables

Se consideran como riesgos susceptibles de ser evitados y suprimidos, aquellos que, al iniciarse este Estudio Básico de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido ya, por haber sido modificado el diseño o el proceso constructivo, o por haber introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra.

También se consideran riesgos evitables los siguientes:

- Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.
- Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.
- Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

- Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante.
- Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.
- Los derivados de habilitar puestos de trabajo fijos en áreas afectadas por desplazamiento de cargas. Se definirán en los planos de organización las zonas de acopios y los desplazamientos permitidos a la grúa en cada momento en función de las necesidades de la ejecución de la obra, de forma que ante la dificultad de limitar el radio de giro y el movimiento de traslación de la pluma si estará prohibido el tránsito por esas zonas y así se le trasladará al contratista.

A pesar de lo anteriormente expuesto, entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riesgos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio.

7.2 Identificación de riesgos no evitables de las unidades de obra, equipos técnicos y medios auxiliares

Se consideran La siguiente identificación inicial de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones aplicadas, se realiza sobre el proyecto ejecución de la obra P.O. 74.24 "ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA", como consecuencia del análisis del proceso constructivo. Pueden ser variadas por el Contratista y en ese caso, recogerá los cambios en su Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Del éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, el Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista, respetará la metodología y concreción conseguidas por este Estudio Básico de Seguridad y Salud. El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Se realizará una identificación de la relación de riesgos laborales presentes en unidades de obra, equipos técnicos y medios auxiliares, que no pueden eliminarse. Se considera que la eficacia de las medidas preventivas y de protección es suficiente, en tanto en cuanto una vez aplicadas los riesgos pasan a estar controlados, además

se han propuesto aquellas medidas tendentes a la reducción y/o control de los riesgos siempre anteponiendo la protección colectiva a la individual. Dicha identificación de riesgos y la descripción de las medidas preventivas se recogen en los apéndices 1 y 2 del presente Estudio en forma de fichas.

Para la elaboración de las fichas se han seleccionado riesgos posibles en la obra de un listado de 25 epígrafes procedente de la estadística considerada en el *"Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales"*:

- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caídas de objetos en manipulación.
- Caídas de objetos desprendidos.
- Pisadas sobre objetos.
- Choques contra objetos inmóviles.
- Choques contra objetos móviles.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.
- Sobresfuerzos.
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Contactos térmicos.
- Exposición a contactos eléctricos.
- Exposición a sustancias nocivas.
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición a radiaciones.
- Explosiones.
- Incendios.
- Accidentes causados por seres vivos.
- Atropellos o golpes con vehículos.
- Patologías no traumáticas.
- "In itinere".

7.3 Unidades de obra con tareas críticas

Son aquellas unidades de obra de especial peligrosidad por la presencia de riesgos especiales. En esta obra, las actividades con riesgo especial son todas aquellas en las que se manipulen cargas suspendidas con camión grúa o grúa autopropulsada o trabajos en altura. Deberá estar presente el recurso preventivo durante la ejecución de estos trabajos.

7.3.1 Identificación de riesgos especiales

En función de lo establecido en la Ley 54 de 2003, capitulo IV, artículo 32 bis, donde se establece la presencia de recursos preventivos, la presencia del recurso preventivo será obligatoria en los siguientes casos:

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. Es de aplicación en esta obra.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. A fecha de redacción, no se aplican en esta obra.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. A fecha de redacción, no se aplican en esta obra.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. A fecha de redacción, no se aplican en esta obra.

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. A fecha de redacción, no se aplican en esta obra.

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos. A fecha de redacción, no se aplican en esta obra.

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. A fecha de redacción, no se aplican en esta obra.

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. A fecha de redacción, no se aplican en esta obra.

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. A fecha de redacción, no se aplican en esta obra.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. En la instalación de arquetas y hornacina de hormigón prefabricado por medios mecánicos.

En caso de producirse durante el desarrollo de las obras trabajos no proyectados que impliquen un riesgo especial deberán estar evaluados y se deberán tomar las medidas necesarias para la correcta ejecución de las mismos. En tal caso, deberá estar presente el recurso preventivo para vigilar la aplicación y el cumplimiento de las instrucciones técnicas adecuadas, así como los métodos y procedimientos de trabajo específicos.

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. A fecha de redacción de este estudio no ha sido requerida.

No obstante, el contratista especificará en el Plan de Seguridad y Salud la presencia del recurso preventivo en caso de considerar necesaria su presencia en el resto de las actividades de obra.

7.4 Riesgos durante la implantación de seguridad y salud

La obra se caracteriza por realizarse trabajos con riesgos que se solucionarán mediante la colocación de las protecciones colectivas y señalización.

Además, en esta unidad se incluye la limpieza de la obra para conseguir vías de circulación libres.

La secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar cualquier unidad de obra implica la colocación previa de protecciones colectivas y señalización; ejecutada por el personal de la obra y vigilado su cumplimiento por el Recurso preventivo y organizado por el encargado y el Jefe de obra; para lo cual se utilizarán los medios materiales, medios auxiliares y equipos técnicos descritos.

7.5 Previsión e información para efectuar en condiciones de seguridad y salud los previsibles trabajos posteriores de reparación, conservación y mantenimiento.

Los trabajos posteriores de reparación, conservación y mantenimiento de la totalidad de la obra una vez entregada seguirán las medidas técnicas reflejadas en este estudio, para las unidades de obra, medios auxiliares y maquinaria, dando prioridad a las de protección colectiva frente a la individual.

Como es posible que algún tipo de trabajo no se pueda prever "a priori", en caso de ser precisa la ejecución de alguno de estos al cabo del tiempo, será ese el momento en el que se definirá en un plan previo su procedimiento de ejecución con las condiciones de seguridad necesarias; en cualquier circunstancia de todos estos trabajos se tomara como referente la tecnología existente en el momento. Llegado el caso concreto, si la evolución de la técnica permitiera utilizar otros equipos de trabajo que proporcionen un mayor nivel de seguridad, de acuerdo con el contenido del art. 15.1 de la LPRL, serán estos últimos los que deberán emplearse, independientemente de lo previsto en el Estudio Básico de Seguridad y Salud.

En los trabajos posteriores reparación, conservación o mantenimiento se designará una persona competente que supervise los trabajos.

8 Organización preventiva de la obra

Como mínimo, en la estructura organizativa de seguridad se exige la existencia de personas con las siguientes funciones:

Jefe de obra o responsable por parte de la contratista, puesto que será quien estudia el proyecto: memoria, pliego, condiciones, planos, etc. y planifica las diferentes fases de la construcción, gestiona los recursos materiales y personales, es quien coordina a los equipos de trabajo que intervienen en ella y gestiona la subcontratación de capítulos y unidades, siempre cumpliendo el Estudio de Seguridad y en caso, de detectar

cambios en la ejecución que hacen que existan situaciones no contenidas en el mismo, deberá indicarlo al coordinador de seguridad.

Recurso Preventivo, en conformidad con la Ley 54/03. Habrá una persona designada que realice las funciones conforme al RD 604/2004 y estará siempre presente en las actividades identificadas con riesgo especial.

Según lo establecido en la LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. BOE nº 298 13-12-2003, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Presente en los trabajos en los que interviene el equipo de submarinistas (montaje de instalaciones eléctricas, de fontanería y de telecomunicaciones).

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

Responsable de seguridad por cada una de las empresas para garantizar el cumplimiento del Estudio por los trabajadores de su empresa en la obra, la coordinación de actividades mediante la asistencia a las reuniones, seguimiento de instrucciones a pie de obra, información al resto de trabajadores de las instrucciones de seguridad y participación, conforme a lo establecido en el art. 11 de RD 1627/97.

Coordinación de Actividades Empresariales

Cumpliendo con lo establecido en el real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, antes del inicio de los trabajos, el personal que intervenga en la obra, sea propio o subcontratado, asistirá a la reunión de Seguridad y salud de inicio , en la que se informará sobre los riesgos y medidas preventivas de seguridad colectiva e individual y medidas de emergencia aplicables a los trabajos a realizar.

Al inicio de los trabajos el subcontratista habrá designado a un trabajador como responsable e interlocutor en materia de seguridad y salud en el trabajo.

9 Actuaciones ante una emergencia. Servicios sanitarios y comunes

En función del R.D. 1.627/1.997 anexo IV; primeros auxilios, servicios higiénicos, locales de descanso y disposiciones varias, se dispondrán los servicios sanitarios y comunes.

Primeros auxilios

Será responsabilidad del contratista garantizar que los primeros auxilios (la primera atención que se le da a un accidentado) puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello, es decir, personal con conocimientos en primeros auxilios; así mismo deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación terrestre mediante ambulancia, a fin de recibir los cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados de una indisposición repentina; se debe establecer un sistema de comunicación que permita contactar con los trabajadores designados para actuar ente una emergencia.

El contratista deberá establecer en las medidas de emergencia, los procedimientos relativos a la organización de los primeros auxilios, evacuación y traslado de accidentados. Y todo el personal que participe en el centro, será conocedor de dichas medidas.

En la zona de trabajo existirá un botiquín y extintor; estará señalizado con señales de salvamento y socorro, el material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto como caduque o sea utilizado.

Se dispondrá en un lugar visible información del centro sanitario más próximo, así como el recorrido más recomendable para acceder al mismo, y los teléfonos de emergencias siendo estos:

También se puede acudir al centro asistencial o centros concertados de la MATEP (Mutua Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) de cada empresa cuando el accidente permita al trabajador desplazarse para que sea atendido.

Medicina Preventiva

Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada servicio de prevención de cada empresa participante en esta obra es responsable de realizar la vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislación vigente.

TELÉFONOS A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

PUERTO DE ALCUDIA	
TELEFONOS DE URGENCIA	
URGENCIAS	112
BOMBEROS	085
POLICIA LOCAL	092
GUARDIA CIVIL	062
AMBULANCIA	061

CENTRO HOSPITALARIO	
Nombre del centro asistencial:	Hospital Comarcal de Inca
Dirección	Hospital Comarcal d'Inca Carretera Vella de, Carrer Llubí, S/N, 07300 Inca, Balearic Islands
Teléfono de urgencias:	971 88 85 00

RUTA DESDE EL PUERTO DE ALCUDIA: Tiempo aproximado: 21 minutos

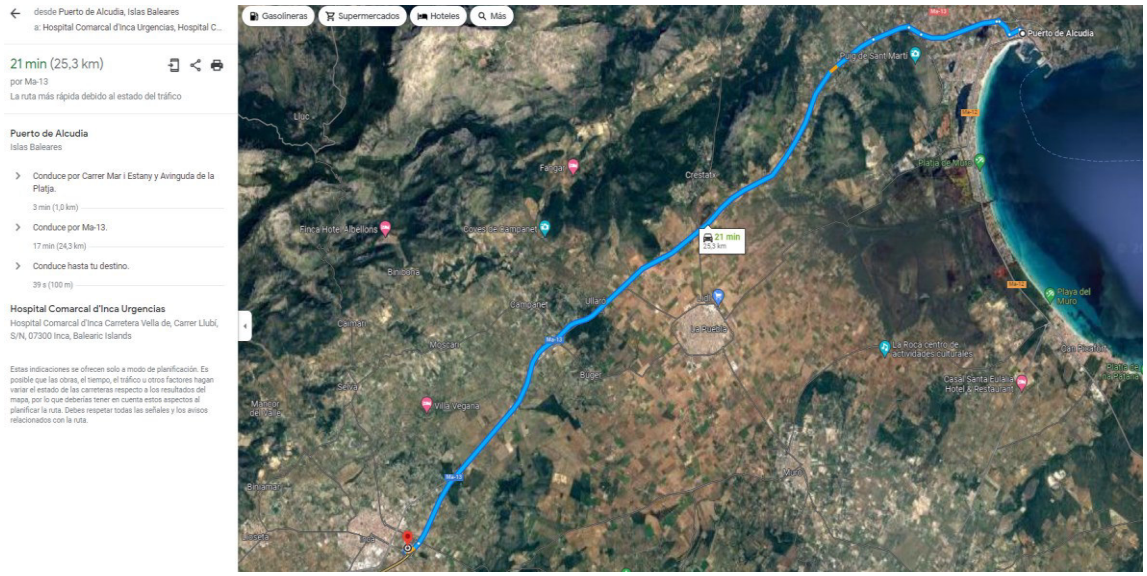

ESTAS HOJAS DEBERÁN ESTAR EXPUESTAS EN LA OBRA COMPLETADAS CON LOS CENTROS ASISTENCIALES QUE TENGAN LOS CONTRATISTAS EN SUS RESPECTIVAS MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

TELÉFONOS A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

PUERTO DE MAÓ	
TELEFONOS DE URGENCIA	
URGENCIAS	112
BOMBEROS	085
POLICIA LOCAL	092
GUARDIA CIVIL	062
AMBULANCIA	061

CENTRO HOSPITALARIO	
Nombre del centro asistencial:	Hospital General Mateu Orfila
Dirección	Rda. de Malbúger, 1, 07703 Mahón, Balearic Islands
Teléfono de urgencias:	971 48 70 00

RUTA DESDE EL PUERTO DE MAÓ: Tiempo de llegada aproximado: 8 minutos.

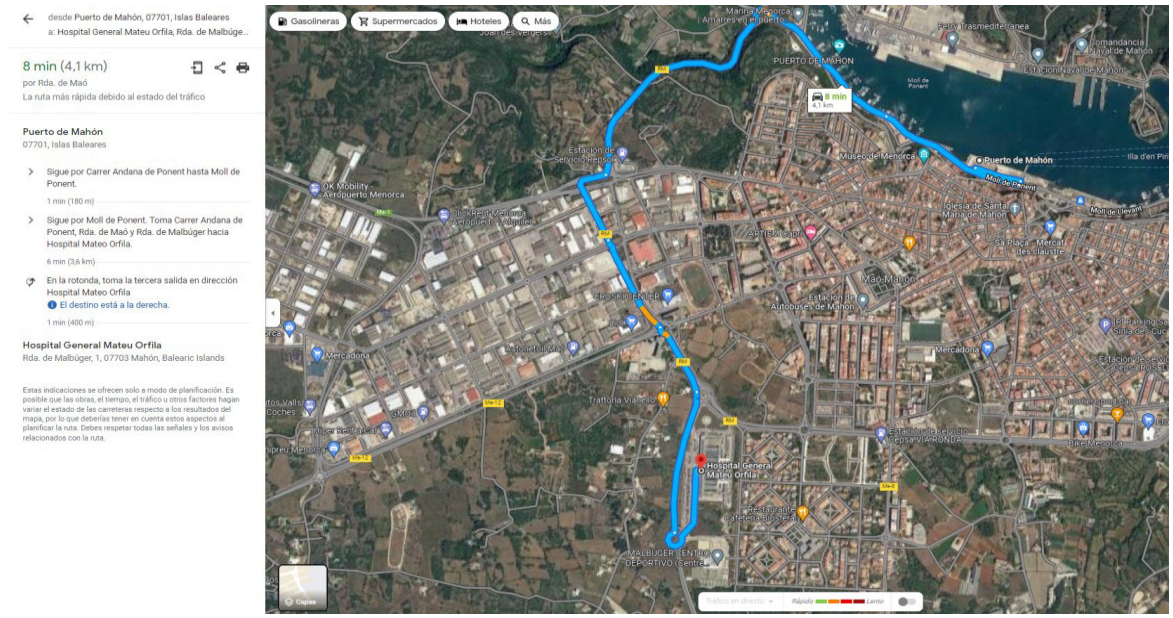

ESTAS HOJAS DEBERÁN ESTAR EXPUESTAS EN LA OBRA COMPLETADAS CON LOS CENTROS ASISTENCIALES QUE TENGAN LOS CONTRATISTAS EN SUS RESPECTIVAS MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

TELÉFONOS A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

PUERTO DE EIVISSA	
TELEFONOS DE URGENCIA	
URGENCIAS	112
BOMBEROS	085
POLICIA LOCAL	092
GUARDIA CIVIL	062
AMBULANCIA	061
HOSPITAL EIVISSA	
Nombre del centro asistencial:	Hospital Can Misses
Dirección	Carrer de Corona, s/n, 07800 Eivissa, Illes Balears
Teléfono de urgencias:	971 39 70 00

RUTA DESDE EL PUERTO DE EIVISSA: Tiempo de llegada aproximado: 9 minutos

ESTAS HOJAS DEBERÁN ESTAR EXPUESTAS EN LA OBRA COMPLETADAS CON LOS CENTROS ASISTENCIALES QUE TENGAN LOS CONTRATISTAS EN SUS RESPECTIVAS MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

TELÉFONOS A UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA

PUERTO DE LA SAVINA	
TELEFONOS DE URGENCIA	
URGENCIAS	112
BOMBEROS	085
POLICIA LOCAL	092
GUARDIA CIVIL	062
AMBULANCIA	061

HOSPITAL FORMENTERA	
Nombre del centro asistencial:	Hospital de Formentera
Dirección	Calle Venda des Brolls, s/n, 07860 San Francisco Javier, Illes Balears
Teléfono de urgencias:	971 32 12 12

RUTA DESDE EL PUERTO DE LA SAVINA: Tiempo de llegada aproximado: 9 minutos

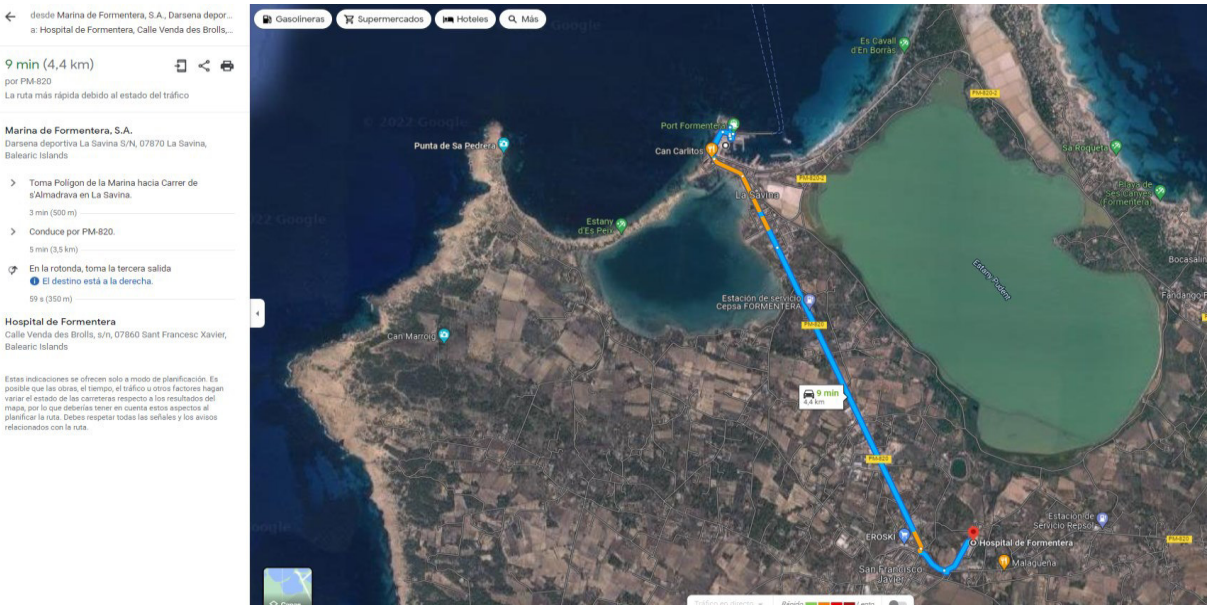

ESTAS HOJAS DEBERÁN ESTAR EXPUESTAS EN LA OBRA COMPLETADAS CON LOS CENTROS ASISTENCIALES QUE TENGAN LOS CONTRATISTAS EN SUS RESPECTIVAS MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

10 Sistema para el control de accesos

Se procederá a un cerramiento provisional de la zona de actuación mediante valla peatonal tipo Ayuntamiento para protegerse eficazmente de cualquier intrusión en obra durante la ejecución de los trabajos.

Se podrá pedir por parte del Coordinador de Seguridad y Salud la presencia, total o parcial, de un Técnico de Seguridad y Salud de cada una de las contratas principales, con el fin de que sea interlocutor válido con el Coordinador de Seguridad.

El control del nivel de seguridad y salud vendrá reflejado en el Plan de Seguridad y Salud. Es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones particulares y la metodología aplicada en el ámbito de su trabajo por cada empresario que participe en esta obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra establecerá al inicio de la obra los requisitos técnicos y documentales que serán de aplicación durante la ejecución de los trabajos. Dichas pautas de trabajo podrán verse modificadas en función del desarrollo de las obras, así como la problemática de los trabajos.

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:

- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en el parte de almacén que se define en el pliego de condiciones particulares.
- Mediante la conservación en acopio de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles para su eliminación.

El Contratista adjudicatario está obligado a presentar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de las obras, la siguiente documentación:

- Plan de Seguridad y Salud o en su defecto Evaluación de Riesgos
- Apertura de Centro de Trabajo (Contratas principales y sus correspondientes subcontratas)
- Listado de Empresas participantes o futuras incorporaciones, si se conocen, a la obra. (Libro de subcontratación y Actualizaciones). Deberán de indicar el nombre y razón social, así como la dirección y actividad de la empresa. A su vez, indicarán la modalidad preventiva de cada una de las empresas (S.P. propio, S.P. ajeno, Trabajador designado).
- Recibo de entrega del Plan de Seguridad y Salud a cada una de las Subcontratas y /o trabajadores autónomos.
- Certificados de Formación e Información en Prevención de Riesgos laborales de todos y cada uno de los trabajadores que intervengan en la obra.

- Reconocimientos Médicos de los trabajadores.
- Recibos de Entrega de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores
- Certificados de Conformidad CE por parte de la maquinaria a emplear por las distintas empresas participantes en el proceso de la obra.
- Documentos de nombramiento de personal específico para trabajos (señalistas, maquinista, etc…)
- Seguros de R.C. de la maquinaria y medios de obra.
- Carnes acreditativos de formación (Gruista (C.A.M.), conductor, etc…)
- Los informes que realice la empresa encargada del montaje, colocación, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas sobre el nivel de seguridad y salud alcanzado por sus trabajadores, así como los partes de trabajo.
- Documento por parte de cada una de las Empresas certificando con periodo mensual el estar dados de alta en la S.S. y estar al corriente de pago de los seguros sociales de todos y cada uno de los trabajadores, recogiendo en dicho documento una lista de nombres y apellidos con D.N.I.

El Coordinador de Seguridad y Salud se reserva el derecho de pedir cualquier otra documentación en función del desarrollo de la obra para una mejor planificación de los medios y medidas preventivas a adoptar. El plazo de entrega de la documentación será definido por el Coordinador de Seguridad en función de las necesidades.

11 Formación e información en seguridad y salud

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los procedimientos de seguridad y salud que deben aplicar, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su protección.

El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud.

12 Valoración preventiva

Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual previstos en este Estudio, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

Málaga, agosto del 2024

Autor: Dña. Cristina Cobalea Medina

Ingeniero Industrial- Nº Col: 980

APÉNDICE 1: FICHAS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS UNIDADES DE OBRA

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD P.O. 74.24 "ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Autor: Dña. Cristina Cobalea Medina

Ingeniero Industrial- Nº Col: 980

1 Trabajos previos. Vallado y señalización

Se llevará a cabo el balizamiento y señalización para aislar la zona de trabajo de las áreas de tránsito de personas. En la zona de exclusión no estará permitida la entrada de personal no autorizada

Valla de delimitación de obra

- Descripción:

Valla de plástico de 2,50 metros de longitud por 1,00 metro de altura, de sustentación independiente, permitiendo su ensamblaje con otras dos vallas para realizar un cerramiento.

- Dónde se utiliza:

Para la delimitación de las zonas en las que se va a cortar el acceso de personal, salvo a personal autorizado de obra, en la zona en la que se van a realizar los trabajos

Cinta de señalización

- Actividades que se utiliza:

Para limitar, prohibir y/o reservar el acceso a zonas afectadas por los trabajos o de acuerdo al avance de los mismos.

Durante la ejecución de los trabajos deberá utilizarse la cinta de señalización para delimitar las zonas en las que exista riesgo hasta el momento en el que se instale definitivamente el sistema de protección colectiva y se coloque la señal de riesgo que corresponda

- Cómo se utiliza:
  - Comprobar que esté en buen estado de mantenimiento: que no esté rota, deteriorada o similar.
  - Es recomendable que sea de color amarillo y negro o blanco y rojo..
  - Comprobar su resistencia y estabilidad una vez colocada y en seguimientos periódicos.

Señalización de obra

- Descripción
  - La señalización de la zona de trabajo se hará con carteles de prohibido el paso, personal trabajando
  - Los trabajadores llevarán puesto en todo momento el chaleco de alta visibilidad.
  - En todo momento se cumplirá con el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Cómo se utiliza:
  - La elección del tipo de señal, su cantidad y el lugar en el que se ha de ubicar se tiene que realizar de acuerdo con: los riesgos, extensión y visibilidad de la zona, trabajadores afectados, hora del día en que sea necesaria la señalización.
  - Hay que colocar las señales en zonas visibles.
  - Comprobar que estén en buen estado de mantenimiento: que no estén rotas ni estropeadas y que estén limpias.
  - Es necesario anclarlas sólidamente en el terreno cuando se trata de señales verticales.

- En el caso de señales verticales, verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar, o bien tras cualquier otras situación que las haya podido tumbar: accidentes, paso de maquinaria pesada, etc.

Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización en la zona terrestre:

- En los accesos a la obra y en las zonas de exclusión: señalización de obligado cumplimiento para el personal con acceso autorizado a dichas zonas.
- Las áreas en las que se posicione la maquinaria serán balizadas y señalizadas convenientemente, respetando la distancia de seguridad. Se cortará el paso a dichas zonas a personal no autorizado.
- En los cuadros eléctricos de obra se instalarán las señales de advertencia de riesgo eléctrico.
- En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes señales para su fácil localización.
- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la correspondiente señal para ser fácilmente localizado.

Cartel de normas de seguridad en el acceso

Señalización en zona de obras

Maquinaria y medios auxiliares empleados:

- Herramientas manuales y eléctricas.

Relación de riesgos identificados en la señalización de la zona terrestre

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de elementos en manipulación
- Choques contra objetos inmóviles.
- Golpes/cortes por objetos o herramientas.
- Atropellos por vehículos o maquinaria
- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas generales

- En primer lugar, se realizará de nuevo un reconocimiento visual de la zona de actuación, comprobando que no existe ningún riesgo que no esté contemplado en el plan.
- Selección correcta y mantenimiento de las herramientas para el trabajo a realizar. No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas. Periódicamente, se debe revisar el estado de las mismas y de sus elementos protección frente a riesgos mecánicos. Las herramientas que se encuentren deterioradas se dejarán de utilizar inmediatamente.
- En el supuesto de realizar in situ el cambio de algún elemento de la herramienta, éste se realizará una vez haya sido desconectada de la red eléctrica.
- No se dejarán las herramientas directamente en el suelo y conectadas a la corriente si no se van a utilizar.
- Se evitarán posturas forzadas; si no fuera evitable, se harán descansos.
- El personal que realice tareas en posturas forzadas, una vez estudiadas las distintas alternativas técnicas sin poder establecer métodos más saludables, deberá tener formación sobre posturas forzadas y manipulación manual de cargas (MMC), no pudiendo superar los 25 kg de peso en el manejo de cargas manuales
- El manejo de la maquinaria (camión pluma, camión de transporte, etc.) está restringido a personal autorizado para ello, previa información y autorización expresa del responsable de la empresa contratista y conforme a las medidas preventivas indicadas para dicha maquinaria.
- Los vallados perimetrales de obra deben contar con señalización que indique que está prohibido el tránsito por la zona o el ingreso de personal no autorizado. Lo ideal es colocar letreros de peligro, los cuales deben ser letras negras sobre fondo blanco.
- Respetar los caminos de circulación provisionales establecidos.

Equipos de protección individual durante las operaciones de señalización y balizamiento de la zona de obra

- Casco protector.
- Guantes de protección.
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.

2 Trabajos previos. Acometida eléctrica provisional

Descripción

Trabajos encaminados a dotar a la obra de suministro eléctrico continuo procedente de la red pública general.

Proceso de trabajo

En la instalación eléctrica provisional de una obra debemos distinguir dos partes:

La instalación desde su conexión a la red hasta el cuadro general provisional de obra, pasando por la unidad de contadores y la de mando y protección.

La instalación necesaria de fuerza y alumbrado de la obra desde su salida del CGP.

Aunque la parte de instalación citada en ítem 1 queda sujeta a las prescripciones particulares de la compañía eléctrica suministradora, previamente se habrá presentado al organismo oficial competente (Industrial) el preceptivo proyecto de suministro provisional a la obra, redactado por un técnico cualificado.

Esto se complementa con la firma de los boletines de instalación por parte de un instalador autorizado. Con todo ello existe la garantía de que la instalación cumple con las indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y, por extensión, con las de la compañía eléctrica suministradora en la zona.

La instalación eléctrica provisional de obra considera en ítem 2, consta en términos generales de lo siguiente:

- Línea repartidora
- Cuadro de distribución
- Interruptor diferencial 30 mA
- Transformadores de seguridad a 24V
- Caja de bornes o base de enchufe estanca (con toma de tierra)
- Base de enchufen estanca
- Barra de conexión línea general de tierra
- Línea de utilización
- Línea de utilización (con conductor de tierra)

La instalación provisional eléctrica de obra solo podrá ser realizada por una empresa instaladora y con personal cualificado para ello.

Relación de riesgos previsibles

- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Contactos eléctricos

Riesgos y medidas preventivas

Caídas a distinto nivel Caídas al mismo nivel	– Siempre que sea posible, los cables del interior de la obra estarán colgados en puntos de sujeción perfectamente aislados de la electricidad. – Si se utilizan escaleras o andamios cumplirán con las especificaciones y procedimientos estipulados en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.
Contactos eléctricos.	– El Encargado contralará que las nuevas instalaciones, reparaciones y conexiones, únicamente las realicen lo electricistas autorizados.

- Antes de realizar una reparación se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida la maniobra, se instalará, en su lugar una paca con el texto: "NO CONECTAR, PERSONAL TRABAJANDO EN LA RED"
- La empresa instaladora dispondrá de sus propias medidas de seguridad para los trabajos que someterá a la aprobación correspondiente, en coordinación con el Encargado General de la obra.
- - Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

Cables y empalmes:

- Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar.
- La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que apareciesen repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas.
- La distribución se hará con cable manguera antihumedad, perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso.
- Los empalmes provisionales y alargaderas se harán con empalmes especiales antihumedad, del tipo estanco.
- Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las cajas de empalmes serán modelos normalizados.

Interruptores:

- Estarán protegidos, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal "Peligro Electricidad".

Cuadros eléctricos:

- Cada cuadro irá provisto de su toma a tierra y su señal de "Peligro Electricidad"
- Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.
- Se acondicionará subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico.
- Se instalará en el interior de un receptáculo con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura.

Tomas de corriente:

- Serán blindadas provistas de una clavija para toma de tierra.
- Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 220V del 380V

Interruptores automáticos:

- Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que "salten" antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.
- Se protegerán con ello a las máquinas

Disyuntores diferenciales:

- Todas las máquinas, así como la instalación irá protegida con un disyuntor diferencial de 30mA ubicados en el cuadro eléctrico.

Tomas a tierra:

- En el caso de que esto fuera necesario, se le dotará de toma a tierra adecuada ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.
- La toma a tierra en las máquinas se hará mediante hilo específico y por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los disyuntores diferenciales o selectivos.
- La conductividad del terreno en que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa) se medirá mediante telurómetros de forma periódica.

- Las picas de toma a tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo eléctrico sobre pie derecho.

Alumbrado:

- El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será "bueno y suficiente" con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos, según las intensidades marcadas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.
- Nunca será inferior a 100 lux medidos a 2 m del plano de trabajo.
- Estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 30mA
- Cuando sea posible, serán fijas. En el caso de usar portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección en bombillas y ganchos de cuelgue.
- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, estas deberán estar construidas por materiales que dispongan de aislamiento de protección o refuerzo entre sus partes activas y sus masas accesibles y deberán cumplir:
- Los materiales deberán satisfacer las prescripciones señaladas para aparatos con aislamiento de la Clase II, según la Instrucción del R.E.B.T.
- Las partes metálicas accesibles de estos materiales no deben ser puestas a tierra
- En caso de que esto no se cumpla, la Toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24V
- Cuando se utilicen los focos, se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2m de altura sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura.
- Todas las zonas de paso de la obra estarán bien iluminadas, evitando los "rincones oscuros"

Mantenimiento y reparaciones:

- Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista instalador de la obra.
- Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN RED"
- Las nuevas instalaciones, reparaciones, etc. Únicamente las realizarán los electricistas autorizados,

Señalización y aislamiento:

- Si en la obra hubiera diferentes voltajes /220V, 380V), en cada toma de corriente se indicará el voltaje que corresponda.
- Todos los cuadros eléctricos generales de la maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica tendrán adherencia una señal de "Peligro Electricidad" normalizada.
- Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos eléctricos.

Equipos de protección individual

- Calzado de seguridad aislante
- Guantes aislantes de seguridad
- Chaleco reflectante
- Arnés de seguridad (siempre que se realicen trabajos a más de 2 m de altura desde el nivel del suelo)

3 Trabajos previos. Instalación de casetas.

Descripción

Consiste en actuaciones relativas al asentamiento y las instalaciones de obra provisionales. Consideramos instalaciones provisionales aquéllas que es necesario disponer para poder llevar a cabo, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los trabajos encargados y, una vez que hayan sido realizados, sea posible retirarlas (casetas auxiliares de obra e instalación eléctrica provisional, en caso de que proceda).

Procedimiento de ejecución

Se comenzará conociendo la ubicación de obra, se registrarán elementos que nos indiquen las posibles conducciones subterráneas por la zona (gas, electricidad, agua, etc.). Se solicitará a las compañías suministradoras o de servicios públicos los informes para verificar o no la existencia de condiciones subterráneas. Del mismo modo, se tendrán en cuenta las posibles conducciones aéreas.

Las actuaciones principales de esta actividad de obra consisten en el acondicionamiento del área sobre la que se asentarán dichas instalaciones y las instalaciones de dichas casetas.

Se desbrozará y acondicionará el terreno, en caso de ser necesario, con el objetivo de conseguir una plataforma de trabajo libre de obstáculos y lo más horizontal posible. En caso de resultar necesario el movimiento de tierras para la adecuación del terreno, se analizará dicha actividad y aplicarán las medidas preventivas indicadas para dichos trabajos.

El montaje de las instalaciones de higiene, así como cualquier tipo de caseta, implicará el uso de un camión grúa para el transporte y posterior descarga de los módulos/elementos prefabricados en la ubicación definitiva de estas instalaciones. Las operaciones de descarga y colocación de las casetas en los lugares destinados a ello serán guiadas mediante el uso de cuerdas guía por 2 operarios, evitando tener que colocarse bajo la vertical del recorrido de éstas durante su manipulación.

El recurso preventivo vigilará que las cargas no pasen sobre personas, trabajadores, etc. En caso de resultar necesario, se podrá hacer uso de una escalera manual, como medio auxiliar para acceder a elementos situados a una altura que así lo requiera.

Una vez colocadas las casetas en posición, se realizarán las conexiones a la red eléctrica y redes de saneamiento y abastecimiento existentes en la zona definida a través de las arquetas más cercanas a dichas casetas. En caso de resultar necesaria la ejecución de zanjas, esta actividad será analizada y se llevarán a cabo las medidas preventivas indicadas en tal caso.

Maquinaria y medios auxiliares.

- Herramientas manuales
- Camión grúa
- Elementos auxiliares de izado

Riesgos más comunes.

- Caídas al mismo nivel
- Caída de objetos en manipulación
- Pisadas sobre objetos
- Sobreesfuerzos
- Proyección de fragmentos o partículas
- Exposición al polvo

Riesgos especiales

Durante las labores relacionadas con el asentamiento y el montaje de las instalaciones de obra, la presencia del recurso preventivo será necesaria durante el posicionamiento de los módulos prefabricados mediante el camión grúa.

Medidas preventivas para la instalación de casetas de higiene y bienestar

- Estos trabajos serán realizados por personal autorizado y cualificado.
- Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de trabajo.
- Los riesgos en esta fase de obra serán los propios de la maquinaria utilizada y de la manipulación e izado de cargas. Por tanto, resultarán de aplicación las medidas preventivas contempladas en el presente documento para las citadas actividades, además de las correspondientes a la maquinaria a emplear.
- Con el fin de evitar sobreesfuerzos, se evitará realizar sobreesfuerzos inútiles, usando medios mecánicos y solicitar ayuda cuando en un momento concreto haya que mover un objeto pesado, se mantendrá la espalda recta, evitando posturas forzadas y giros del tronco. Se procederá a la sujeción de las cargas con firmeza con ambas manos, procurando mantenerlas lo más cerca posible del cuerpo, para levantar cargas se deben flexionar las rodillas, evitando doblar la espalda y elevarlas estirando las rodillas, es preferible empujar que tirar de esas cargas, aprovechando el peso del cuerpo y la inercia de los objetos.
- Se hará uso de mascarillas FFP en caso de se cree un ambiente pulverulento durante la ejecución de los trabajos

Equipos de protección colectiva.

- Vallado de la zona de actuación

Señalización y balizamiento.

- Se señalizará la zona en la que se vayan a instalar las casetas mediante cinta de balizamiento durante la colocación de las mismas mediante la grúa y señales de indicación de cargas suspendidas.

Equipos de protección individual.

- Calzado de seguridad
- Chalecos reflectantes
- Casco de protección
- Guantes de protección
- Mascarilla antipolvo FFP
- Gafas contra impactos y antipolvo.

4 Trabajos previos. Retirada de residuos no peligros e inertes

Descripción

Los trabajos previos siguientes son los encaminados a retirar los residuos no peligrosos e inertes que contienen este tipo de edificaciones, como son falsos techos de placa de escayola y fibras, conductos de plástico y goma, cuadros eléctricos, puertas y elementos de separación de madera y contrachapado, vidrio y elementos metálicos, mobiliario de oficina, aparatos sanitarios de loza en servicios, instalaciones eléctricas, redes de conductos, luminarias, aparatos electrónicos e informáticos, detectores iónicos, etc.

Maquinaria y medios auxiliares empleados:

- Escaleras
- Andamios móviles
- Camión grúa o camión de transporte
- Herramientas manuales y eléctricas
- Líneas de vida

Relación de riesgos identificados

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por manipulación, derrumbamiento y/o desplome.
- Contactos eléctricos.
- Exposición a agentes externos. Inhalación de polvo.
- Proyecciones de partículas y partículas.
- Atropello, golpes y choques con o contra vehículos.
- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas al mismo nivel	– Respetar las zonas de acopio designadas para el apilado de materiales.
Caída de personas a distinto nivel	– El Encargado controlará que las tareas especificadas únicamente las realicen personal autorizado. – Se colocarán líneas de vida certificadas. Éstas se anclarán a puntos fijos, seguros y estables para el uso de arneses de doble gancho.
Caídas de objetos por manipulación, derrumbamiento y/o desplome	– Como norma general, se prohíbe arrojar materiales y escombros al vacío, excepto en aquellos casos que el procedimiento lo establezca, para lo cual se establecerá protección de la vertical de manera que se impida por completo el acceso a estas zonas. En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado.
Exposición a agentes externos. Inhalación de polvo	– Evitar el contacto de la piel con sustancias tóxica mediante la utilización de equipos de protección individual
Contactos eléctricos	– Se anularán todas las instalaciones para evitar electrocuciones debidas a instalaciones eléctricas.
Proyecciones de fragmentos y partículas	– Los equipos sólo pueden ser utilizados por personal con formación y capacitación específica. – Se mantendrá zonas de seguridad cuando se empleen ciertas herramientas en prevención del personal circundante, en caso de ser necesario, se instalarán pantallas ignífugas de separación entre unos puestos y otros. En prevención del operario seguir las normas de seguridad que establece el fabricante en el manejo de las máquinas. – Se permanecerá fuera del alcance de los materiales proyectados por las radiales. Deberán estar provistas de los elementos de protección originales, tratándose de herramientas con marcado CE y conservar en buen estado y no inutilizar las protecciones colectivas de las máquinas y herramientas. En cuanto a la protección personal será conveniente el uso de guantes y pantallas o gafas.
Atropello, golpes y choques con o contra vehículos	– Siempre que existan interferencias entre los trabajos de terraplén y las zonas de circulación de peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. – Queda terminantemente prohibido la circulación y la realización de trabajos del personal en el radio de acción de la maquinaria. – Toda la maquinaria poseerá un perfecto estado del avisador acústico de marcha atrás. – Todo el personal a pie hará uso de peto reflectante para aumentar su visibilidad. – La velocidad en obra no superará nunca los 30 (treinta) km/h. En cualquier caso, se llevará la velocidad que aconseje la prudencia.

	– Se prohibirá la circulación de vehículos en pendientes pronunciadas en la trayectoria perpendicular a las mismas. – En las zonas destinadas al vertido de tierras en taludes, se colocará un tope, a una distancia del talud que dependerá de la consistencia del terreno; este tope tiene la finalidad de impedir el paso de los vehículos en su circulación marcha atrás. – Se efectuarán inspecciones periódicas al terraplenado con el fin de detectar socavones o zonas desniveladas que pueden dar lugar a vuelco de vehículos.
Sobreesfuerzos	– El personal que realice tareas en posturas forzadas, una vez estudiadas las distintas alternativas técnicas sin poder establecer métodos más saludables, deberá tener formación sobre posturas forzadas y manipulación manual de cargas (MMC), no pudiendo superar los 25 kg de peso en el manejo de cargas manuales.

Medios de protección colectiva y señalización

- Línea de vida horizontal y vertical y anclajes resistentes a paramentos y estructuras.
- Cinta de balizamiento (bicolor) o malla de señalización (tipo stopper).
- Redes de seguridad.
- Se colocarán señales de uso obligatorio de:
  - Casco.
  - Botas de seguridad.
  - Guantes.
- Se colocarán señales de advertencia de:
  - Peligro de caída de objetos.
  - Peligro de caída a distinto nivel.
  - Peligro entrada y salida de camiones donde proceda.
- En caso de ser necesario, siguiendo con la Norma de Carreteras 8.3-IC, "Señalización de Obras":
  - Previsión de limitaciones de velocidad.
  - Previsión de cortes de carril y desvíos.

Equipos de protección individual (epis)

- Botas de seguridad.
- Cascos protectores auditivos.
- Casco de seguridad.
- Chaleco reflectante.
- Guantes de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Gafas de protección. Para aquellos trabajadores que no cuenten con cristal en cabina para evitar riesgos derivados de las proyecciones de partículas.
- Dentro de la máquina:
  - Uso de gafas de sol o vidrios ahumados; para evitar deslumbramientos.
  - Uso del cinturón de seguridad.

5 Trabajos previos. Ordenación del tráfico rodado

Descripción

Descripción de medios a emplear en la obra para evitar en la medida de lo posible los impedimentos al tráfico rodado, así como mejorar las circulaciones de vehículos y peatones en los viales próximos a la zona de actuación. Así pues, se distinguen actuaciones tanto para la ordenación del tráfico en los viales adyacentes a la obra como para la ordenación del tráfico en el interior de la propia obra.

Resulta aplicable en todos los trabajos donde se requiera movimiento de vehículos y maquinaria en los que se ven afectados los viales adyacentes a la parcela a edificar.

Ordenación del tráfico inferior de la obra.

En la fase de planificación del cajón de obra se preverá los accesos a la obra tanto de tráfico rodado como de operarios, teniendo en cuenta las zonas de acopio, zonas de casetas de obra, así como las posibles interferencias con el tráfico exterior. El acceso a la obra estará señalizado, con la colocación de pictogramas tales como el uso obligatorio de los EPI, prohibido el paso a personas ajena a la obra o el de peligro por cargas suspendidas. Se colocarán señales de advertencia por obra y vallados peatonales en caso de que las aceras resulten afectadas.

La circulación en el interior de la obra en la medida de lo posible estará separada para vehículos y operarios, estableciendo las zonas por donde deberán transitar de forma ordenada, y colocando las señales necesarias en cruces, cambios de rasantes y demás puntos que se consideren conflictivos.

Maquinaria y medios auxiliares empleados

- Herramientas manuales

Relación de riesgos previsibles

- Caídas al mismo nivel.
- Atropello o golpes con vehículos.

Riesgos y medidas preventivas

- Si es necesaria la colocación de conos, éstos se colocarán, a ser posible, cada 10m en el cierre de carriles y cada 20m en la delimitación de carriles.
- -La iluminación y/o balizas luminosas, así como el balizamiento, se colocará en número suficiente y siguiendo la normativa aplicable, estudiándose para cada caso.
- La colocación de la señalización de obras (interior y exterior) seguirá la normativa vigente; teniéndose en cuenta las características especiales para cada caso, por lo que se realizará un estudio para cada zona. Se seguirán las instrucciones dadas para la correcta colocación de la señalización.
- -El fondo de las señales de obra será amarillo. Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflexivos.
- Todas las superficies planas de señales y elementos de balizamiento reflectantes se intentarán colocar perpendiculares al eje de la vía.

- Las zonas de circulación de operarios y maquinaria estarán separadas y señalizadas con el suficiente espacio para evitar la protección de piedras por la circulación de vehículos y maquinaria.
- Toda máquina dispondrá de gálibo de piedras rotativo lumínico que indique en todo momento que permanece en movimiento, así como el correcto mantenimiento de indicador de marcha atrás.
- Los camiones deben mantener sus espejos retrovisores y el indicador sonoro marcha atrás en correcto mantenimiento.
- Los trabajadores deben mantener una distancia de seguridad prudencial a máquinas en movimiento y camiones en marcha
- Los trabajadores harán uso de peto reflectante con circulación de vehículos y maquinaria.
- Colocar señalización nocturna y comprobar diariamente su correcto funcionamiento.
- Las maniobras de la máquina de gran tonelaje han de estar dirigidas por encargados o señalista.
- La velocidad debe limitarse todo lo posible.
- Hay que exigir la máxima concentración de los conductores de vehículos de la obra, para evitar distracciones como consecuencia de su actividad.

Equipos de protección individual

- Calzado de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Chaleco reflectante.

6 Trabajos previos. Demolición y desmontaje.

Descripción

La demolición y desmontaje manual es el conjunto de operaciones organizadas para retirar de forma parcial o total una construcción o instalaciones de esta, con empleo de medios manuales y eléctricos .

Este tipo de trabajos se efectúa cuando las circunstancias del objeto a demoler lo aconsejen o si se requiere un nivel especial de precisión.

La demolición manual es segura, versátil y tiene otras ventajas tales como, una fácil accesibilidad y ligereza de los equipos.

Además, la afección que genera a las personas y lugares colindantes a la ejecución es menor que su contraparte con maquinaria.

Antes de proceder a una demolición se han de llevar a cabo una serie de actuaciones, que a continuación detallamos:

- Visita previa de reconocimiento.
- Recabar la posible documentación existente, a Organismos, Propiedad, Colegios Profesionales, etc.
- Investigar y situar la ubicación de tuberías de agua, colectores, gas, electricidad, etc.

- Anotar la antigüedad del edificio y calidades de los elementos estructurales y decorativos para posible recuperación.

Tipos de unidades a las que puede aplicar

- Demolición de estructuras de hormigón
- Demolición pavimento existente.
- Desmontaje placas del suelo.
- Demolición tabiquería.
- Picado de enfoscado.
- Apertura de huecos.
- Desmontaje de chapados de madera.
- Demolición de barandilla de escalera y terraza.
- Desmontaje de vidrios y carpinterías existentes.
- Desmontaje de puerta.
- Retirada de mobiliario.
- Entre otros.

Procedimiento de ejecución

Los operarios con la ayuda de herramientas y máquinas portátiles (martillo percutor, maza, etc.) dependiendo del elemento derruir o retirar se procede a demoler o desmontar los elementos descritos; muchas de las operaciones de desmontaje y demolición también se realizarán con las manos. Además, existe maquinaria específica como sierras o máquinas de disco especiales que se usarán como parte del proceso.

Los escombros procedentes de la demolición y el desmontaje serán recogidos con retroexcavadora y cargados al camión para su transporte a vertedero.

Maquinaria y medios auxiliares empleados

- Herramientas manuales (pica, martillo, etc.)
- Compresor
- Martillo neumático
- Cortadora radial
- Plataforma elevadora (si fuese el caso)
- Andamios móviles
- Eslingas, cales y ganchos (para trabajos en altura)
- Líneas de vida (para trabajos en altura)
- Carretilla manual

Relación de riesgos identificados

- Caída al mismo nivel
- Caída de altura
- Caída de objetos por desplome/derrumbe
- Caída de objetos desprendidos
- Pisadas sobre objetos

- Golpes cortes por objetos/herramientas
- Proyección de fragmentos/partículas
- Atrapamientos entre objetos
- Atropellos por vehículos/maquinaria
- Sobreesfuerzos
- Contacto eléctrico indirecto
- Accidente con sustancias irritantes

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a distinto nivel	- Se colocarán paneles informativos en el acceso a las zonas de exclusión (áreas de seguridad alrededor de los elementos a demoler), áreas en las que estará prohibida la entrada a personal que no esté autorizado a realizar tareas en esas zonas específicas. - Se señalizará y/o balizará el borde de las demoliciones, con un retranqueo de 2 m. En caso de no respetar dicha distancia, con riesgo de caída superior a 2 m., será protegido mediante barandilla reglamentaria (o cerrado al tránsito de los trabajadores, en su caso). - En el caso de ser necesario el montaje de los medios auxiliares, y plataformas de trabajo para la demolición, con todos los elementos, conforme indica el fabricante o legislación específica: si supera los 2 m. de altura, disponer de barandilla reglamentaria. Las plataformas tendrán anchura mínima de 60 cm. Utilización de arnés anticaída sobre plataformas de trabajo (andamios, pasarelas, etc.) donde no se evite por completo la caída en altura con las protecciones colectivas
Caída de personas al mismo nivel	- Se mantendrá la zona de trabajo en perfecto orden y limpieza. - Retirar el material procedente de la demolición y desmontaje y no depositarlo en zonas de paso. - Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. - Se deberá tener en cuenta la importancia del orden y limpieza en el desarrollo de los trabajos, haciendo las previsiones necesarias, para la recogida de desechos y basuras, situación de zonas de acopio, condiciones de almacenes y talleres, etc. - Se deberá tener en cuenta para trabajos en días de baja luminosidad o de noche, la colocación de torretas de iluminación.
Caída de objetos desprendidos	- Se delimitarán y balizarán las posibles zonas de caídas de objetos.
Pisadas sobre objetos	- Se retirarán los restos y elementos de la demolición de zonas de tránsito.
Golpes con objetos inmóviles	- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. - Se arrancarán o doblarán los clavos de elementos de madera demolidos.
Atropellos con vehículos	- Mantener el contacto visual entre el maquinista y el ayudante. - Prestar atención a la señalización luminosa y sonora de los vehículos. - No pasar por detrás de las máquinas en movimiento.

	- Utilizar ropa reflectante - Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento - Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y maquinaria de obra
Golpes – Cortes	- Hacer uso de guantes y calzado de protección - En caso de máquina cortadora se verificará diariamente el disco, debiendo sustituirse inmediatamente en el caso de que se aprecien síntomas de deterioro en su resistencia como estructural, tales como fisuras, ausencia de dientes, los cuales pueden provocar proyecciones incontroladas e imprevisibles a gran velocidad. - En caso de radiales, se permanecerá fuera del alcance de los materiales proyectados por las mismas. Deberán estar provistas de los elementos de protección originales, tratándose de herramientas con marcado CE, conservarse en buen estado y no inutilizar las protecciones colectivas de las máquinas y herramientas. En cuanto a la protección personal será conveniente el uso de guantes y pantallas o gafas. - Antes de encender la máquina, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones protectores - El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada con total seguridad. - No golpear el disco al mismo tiempo que se corta. - La máquina ha de ser parada por personal autorizado. - No tocar el disco tras la operación de corte. - No abandonar el equipo mientras se está utilizando. - La maquinaria móvil de demolición tendrá sus dispositivos de acceso a cabinas (pates, barandillas, escalas) en perfecto estado. - Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. Mantenimiento de las herramientas en buen estado. - No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas. - Periódicamente se deben inspeccionar el estado de las herramientas y las que se encuentren deterioradas enviarlas al servicio de mantenimiento para su reparación o su eliminación definitiva.
Ruido	- Se deberá utilizar protección auditiva cuando exista un alto nivel de ruido provocado por las tares desarrolladas, como puede ser el uso de herramientas eléctricas o maquinaria ruidosa o en situaciones de un nivel de ruido muy alto, aunque la exposición sea corta. - Realizar un correcto mantenimiento de las máquinas - Respetar los turnos de trabajo
Proyección de partículas y generación de polvo	- Hacer uso de las protecciones oculares y las mascarillas FFP - En caso de exceso de formación de polvo, se efectuará un regado de la zona demolida

Atropellos por vuelco de maquinaria.	- Definir los accesos a la obra, caminos de evacuación hacia el exterior sin dificultades, áreas de acopio de materiales reciclables y de material puramente de escombros. - No situarse bajo el radio de acción de la maquinaria de transporte de escombros. Respetar los caminos de circulación de vehículos y trabajadores. - El manejo de vehículos de obra (cargadora, etc.) está restringido a personal autorizado.
Contacto eléctrico	- Conocimiento detallado de la ubicación, distancia y tensión de posibles líneas eléctricas enterradas y/o aéreas. - Antes de comenzar los trabajos, obtener planos de las instalaciones subterráneas que interfieran en la zona de trabajo. Solicitar el descargo de los cables en los siguientes casos: ▪ Para trabajos con herramientas manuales, cuando la distancia de trabajo sea inferior a 0,5 m.; ▪ Para trabajos con herramientas mecánicas, cuando la distancia sea inferior a 1 m. ▪ En las zonas a picar próxima a una línea eléctrica se realizará de forma manual.
Contactos con servicios urbanos	- Se solicitarán a las compañías propietarias de los servicios afectados planos de localización y descripción de los mismos. - En el caso en que la Dirección de Obra lo exija, en función del potencial peligro o las necesidades constructivas, se solicitara formalmente la anulación, desvío o desmontaje de los servicios a las compañías propietarias. - En caso de daño al servicio se dará cuenta a la compañía propietaria. - Se prohíbe terminantemente manipular o utilizar cualquier instrumento de la instalación en servicio. Estas operaciones solo podrán ser llevadas a cabo por el personal de la compañía propietaria del servicio.
Vibraciones	- Las máquinas o herramientas que originen vibraciones deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo protección antivibratorio. - Cuando los equipos no cuenten con sistemas de amortiguación de fábrica contra vibración, se implementarán controles en caso de que los límites excedan los requisitos legales vigentes. - Se respetar los turnos de trabajo y descanso
Exposición a agentes físicos: ruido.	- La evaluación de riesgos del centro deberá realizarse previendo la medida de los niveles de ruido a los que están expuestos los trabajadores. Esta medida no será necesaria en las situaciones en que el técnico pueda llegar a una conclusión sin necesidad de medir los niveles de ruido. - En los lugares de trabajo donde el nivel de exposición diario equivalente supere los 80 dB(A) y el nivel de pico supere los 135 dB(C): ▪ Debe evaluarse el nivel de exposición diario equivalente en los lugares de trabajo, tras haber efectuado la evaluación inicial, y repetir las medidas cada tres años, como mínimo. ▪ Los trabajadores tienen derecho a hacerse un control audiométrico mediante un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la

	responsabilidad de un médico. La periodicidad debe ser, como mínimo, cada cinco años. ▪ Se deben poner a disposición de los trabajadores protectores auditivos. - En los lugares de trabajo donde el nivel de exposición diario equivalente supere los 85 dB(A) y el nivel de pico supere los 137 dB(C): - Debe establecerse y ejecutarse un programa de medidas técnicas y de organización, que tendrán que integrarse dentro de la planificación de la actividad preventiva de la empresa, destinado a reducir la exposición al ruido. Se deberá tener en cuenta que los riesgos derivados de la exposición al ruido tienen que eliminarse en el origen o reducir al nivel más bajo posible, y tendrán que considerarse los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en el origen.
Sobreesfuerzos	- Limitar el tiempo de exposición del trabajador. - Rotación en los puestos de trabajo ante las temperaturas excesivas, frío o calor.

Medios de protección colectiva y señalización

- Barandillas reglamentarias
- Valla móvil de protección
- Redes de seguridad

Señalización y balizamiento

- Cinta de balizamiento (bicolor) o malla de señalización (tipo stopper).

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad
- Calzado de seguridad
- Arnés de seguridad (en caso de trabajos en altura)
- Protectores auditivos
- Guantes para riesgos mecánicos
- Guantes para riesgos de calor y/o llama
- Pantallas faciales
- Gafas de protección mecánica
- Mascarilla autofiltrante para partículas FFP1
- Mascarilla autofiltrante para aerosoless FFP2
- Chaleco de alta visibilidad

7 Trabajos de albañileria

Unidades aplicables

Trabajos de albañilería que tengan riesgo de ejecución considerable por realizarse en altura, por manejar sustancias nocivas o tóxicas, por conllevar la manipulación de elementos pesados (riesgos a los que prestar especial atención) en trabajos de tabiquería, apertura de huecos, trabajos para la colocación de premarcos de carpinterías, bases para sanitarios, etc.

Maquinaria y medios auxiliares empleados

- Herramientas manuales y eléctricas (llana, paleta, fratás, reglas, talocha, paletín, rozadora radial, etc.)
- Carretilla manual
- Andamio sobre ruedas
- Escaleras homologadas
- Transpaleta
- Eslingas cables y ganchos (en caso de realizar trabajos en altura).
- Línea de vida (en caso de realizar trabajos en altura).

Relación de riesgos previsibles

- Caída de personas al mismo nivel
- Caída de personas a distinto nivel
- Golpes con objetos y herramientas
- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas
- Sobreesfuerzos
- Riesgo por contacto eléctrico

Riesgos y medidas preventivas

Caídas de personas al mismo nivel	- Se mantendrán el orden y la limpieza de los lugares de trabajo. - Se mantendrán buenas condiciones de iluminación y señalización.
Caída de personas a distinto nivel	- Las plataformas sobre borriquetas, en caso de usarse, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. - No se recomienda el uso de bidones, pilas de material, etc. para trabajos de demolición, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. - Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí) y barandilla de protección de 90 cm. - Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

Golpes/cortes con objetos y herramientas	- Se mantendrán el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. - Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. - La herramienta se almacenará en lugar previsto, con orden y limpieza
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas	- Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección para evitar alérgicas o abrasiones por contacto o salpicaduras de sustancias propias del mortero y hormigón, entre otros. - Se dispondrá de las fichas de los productos contaminantes y protocolo de actuación para cada caso.
Sobreesfuerzos	- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. - Como norma para levantar cargas se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. - No se manipularán nunca pesos superiores a 25 Kg, si es de forma continuada, y nunca más de 40 Kg. - Se evitarán posturas forzadas. Si no fuera evitable, se harán descansos.
Riesgo por contacto eléctrico	- Toda herramienta y maquinaria eléctrica, una vez finalizado su uso, se apagará y guardará en las zonas habilitadas para su almacenamiento.

Protecciones colectivas y señalización

- Balizamiento y señalización de la zona de actuación.
- Señalización de la ruta de evacuación.
- Carcasas o resguardos de las partes móviles de las máquinas
- Redes de protección de huecos

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad contra impactos
- Protecciones auditivas
- Gafas de seguridad contra impactos.
- Ropa de trabajo
- Chaleco reflectante
- Guantes de protección frente agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica contra golpes y perforación.
- Mascarilla
- Gafas de seguridad
- Arnés de seguridad (en caso de realizar trabajos en altura).

8 Solerías

Descripción

La solera son los revestimientos de suelos naturales en los interiores de los edificios, constituidos por una capa de resistente de hormigón en masa, quedando la superficie a la vista o puede colocarse algún revestimiento para su acabado.

Unidades aplicables:

- Solados interiores del edificio y solado exterior

Relación de riesgos previsibles

- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes/cortes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Dermatitis.

Riesgos y medidas preventivas.

- El operario adoptara la postura ergonómica para los trabajos repetitivos.
- Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.
- El corte de piezas se realizará con vía húmeda.
- Las zonas recién soladas resbaladizas se acotarán y señalizarán.
- Se dispondrá de las fichas de los productos contaminantes y protocolo de actuación para cada caso.
- Se evitará el contacto de las manos con mortero de cemento u otras sustancias que puedan generar alergias. - Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador.
- Como norma para levantar cargas se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible.
- No se manipularán nunca pesos superiores a 25 Kg, si es de forma continuada, y nunca más de 40 Kg.
- Se evitarán posturas forzadas. Si no fuera evitable, se harán descansos.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad y/o gorra tipo visera de algodón con orificios de ventilación para todos los operarios.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica contra golpes y perforación
- Guantes de protección frente agresiones mecánicas.
- Gafas de seguridad contra impactos.
- Ropa de trabajo de algodón.

- Rodilleras.
- Chaleco reflectante.
- Mascarillas.

9 Colocación de pavimento exterior

Descripción

Se incluyen en estas actividades la colocación de bordillos y ejecución de pavimentaciones exteriores y demás trabajos de albañilería asociados a estas actividades.

Procedimiento de ejecución

Colocación de bordillo

- Verter el hormigón formando un cordón longitudinal para colocar los bordillos sobre él.
- Depositar y colocar correctamente en alineaciones rectas, curvas o mixtas los bordillos. En esta fase puede resultar necesario el corte de bordillos para un adecuado ajuste.
- Rejuntar los bordillos y posteriormente repasar con la esponja.

Acopio de materiales y herramientas

- Provisión de materiales y herramientas necesarias en la zona de trabajo.

Extendido del material de base (hormigón, grava, etc.)

- Verter el material de relleno.
- Nivelar el material, manualmente mediante regletas o con la ayuda de vibradoras autonivelantes.

Colocación de baldosas o adoquines

- Proveerse de un grupo considerable de adoquines o baldosas desde el palet hasta el tajo.
- Colocar los elementos alineados y nivelarlos a la línea colocada anteriormente y que marca el nivel a seguir.
- Rejuntar con el extendido de arena seca mediante pala y posterior cepillado o con mortero mediante una rasqueta de goma.
- Nivelar las baldosas mediante un pisón manual y a la vez facilitar que la arena rellene adecuadamente las juntas.

Maquinaria empleada

- Herramientas manuales y eléctricas
- Dumper
- Rodillo vibrante
- Camión caja basculante

- Camión de riego asfáltico
- Extendedora
- Barredora
- Apisonadora

Relación de riesgos previsibles

- Caídas al mismo nivel
- Golpes con objetos móviles
- Atropellos, golpes con vehículos y maquinaria
- Atrapamiento por vuelco de máquinas
- Riesgo de corte
- Contacto con sustancias nocivas propias del hormigón
- Salpicaduras
- Polvo
- Ruido
- Vibraciones
- Incendios/explosiones
- Riesgo por contacto eléctrico

Riesgos y medidas preventivas

Caídas al mismo nivel	– Se mantendrá la zona de trabajo y transito ordenada y limpia. – Se mantendrán buenas condiciones de iluminación y señalización. – Está prohibido correr y el uso del teléfono móvil en el interior de la obra. – Se prohibirá el acceso de otros trabajadores a la zona en la que se está pavimentando, indicándose itinerarios alternativos. – Las zonas soladas resbaladizas se acotarán.
Golpes con objetos móviles	– Dispositivos de señalización (óptica y acústica) en la maquinaria.
Atropellos, golpes con vehículos y maquinaria	– Mantener el contacto visual entre el maquinista y el ayudante. – Prestar atención a la señalización luminosa y sonora de las maquinarias. – No pasar por detrás de las máquinas en movimiento. – Utilizar ropa reflectante. – Se deberá vigilar especialmente las maniobras de aproximación de la máquina y trabajadores a zonas con riesgos de accidentes con vehículos en circulación. Estas maniobras estarán dirigidas por una o dos personas que vigilarán la situación de las máquinas, de vehículos y de sus compañeros, indicando convenientemente las maniobras a efectuar. – Mientras se encuentre en marcha la extendedora o la compactadora no se permite la presencia sobre ella salvo al conductor de la misma y al reglista únicamente cuando sea preciso.

Atrapamiento por vuelco de máquinas	– Verificar la zona de ubicación de la maquinaria para evitar la pérdida de estabilidad. – Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de estos con sobrecarga –
Riesgo de corte	– Todas las herramientas de corte, una vez finalizados los trabajos se guardarán en lugar habilitado para las mismas y cubiertos los elementos de corte con la correspondiente tapa de seguridad. – Se comprobará que en las zonas a hormigonar no hay objetos punzantes.
Contacto con sustancias nocivas propias del hormigón y de las mezclas bituminosas	– Se dispondrá de las fichas de los productos contaminantes y protocolo de actuación para cada caso. – Se evitará el contacto de las manos con la lechada. – Todo el personal que trabaje en posible contacto con las mezclas bituminosas debe hacer uso de guantes y ropa adecuada para evitar el daño a la piel producido por este material
Salpicaduras	– Se dispondrán de las fichas de los productos contaminantes y protocolo de – actuación para cada caso.
Polvo	– Se regarán las zonas susceptibles de producir polvo. – Los trabajadores estarán protegidos contra ambientes pulvígenos mediante protecciones previstas en el plan de seguridad y salud. – Se circulará con las luces de la maquinaria encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.
Ruido	– Siempre que se vayan a realizar tareas con ruidos por encima del permitido o con picos de niveles muy altos será obligatorio el uso de los cascos de protección auditiva para todo el personal que se encuentre en el centro. – A partir de los 80 db y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por otros procedimientos, se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal, tales como tapones auditivos, cascos, etc. y a partir de los 110 db se extremará tal protección para evitar totalmente las sensaciones dolorosa o graves.
Vibraciones	– Cuando los equipos no cuenten con sistemas de amortiguación de fábrica contra vibración, se implementarán controles en caso de que los límites excedan los requisitos legales vigentes. – Las máquinas o herramientas que originen trepidaciones deberán estar provistas de horquillas u otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo protección antivibratorio. – Las máquinas operadoras automóviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estarán provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores se proveerán de equipo de protección personal adecuado, como gafa, guantes, etc.
Incendios/explosiones	– Señalizar, en los laterales de la cisterna, en un lugar visible y con cartel reflectante, el número de identificación del producto transportado.

Riesgo por contacto eléctrico	– Toda herramienta y maquinaria eléctrica, una vez finalizado su uso, – se apagará y guardará en las zonas habilitadas para su almacenamiento. – Los procesos de mantenimiento y limpieza de la maquinaria se realizarán con el motor apagado y con personal autorizado. – El cuadro eléctrico deberá estar señalizado y cerrado, indicando cada diferencial la sección a la que abastece.

Protecciones colectivas y señalización

- Vallado de protección
- Balizamiento y señalización de la zona de trabajos

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica contra golpes y perforación.
- Guantes de protección
- Protecciones auditivas
- Gafas de seguridad
- Chaleco reflectante.
- Mascarillas FFp

10 Acabados

Descripción

- Enfoscados y enlucidos.
- Solados y alicatados.
- Carpintería.
- Cristalería.
- Pinturas y barnizados.

Maquinaria y medios auxiliares empleados

- Herramientas manuales y eléctricas (llana, paleta, fratás, reglas, talocha, paletín, etc.).
- Carretilla manual.
- Andamio homologado.
- Borriqueta homologa.
- Escaleras homologadas.
- Transpaleta.
- Eslingas cables y ganchos (en caso de realizar trabajos en altura).
- Línea de vida (en caso de realizar trabajos en altura).

Relación de riesgos previsibles

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes / cortes con objetos y herramientas.
- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.
- Sobreesfuerzos.
- Riesgo por contacto eléctrico.

Riesgos y medidas preventivas

Caídas de personas al mismo nivel	- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de para evitar los accidentes por resbalón. - Los acopios materiales se ubicarán en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias. - Se mantendrán buenas condiciones de iluminación y señalización.
Caída de personas a distinto nivel	- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. - Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para trabajos de enfoscados de interiores, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. - Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre sí) y barandilla de protección de 90 cm. - Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de - materiales, bañeras, etc.
Golpes/cortes con objetos y herramientas	- Se mantendrán el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. - Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se - encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de - seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. - La herramienta se almacenará en lugar previsto, con orden y limpieza. - La colocación de elementos de peso considerables (puertas, ventanas, etc), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas y sobreesfuerzos. - Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio, - delimitando la zona de trabajo, para evitar cortes y golpes. - La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de ventosas de - seguridad. - El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas	- Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección para evitar alérgicas o abrasiones por contacto o salpicaduras de sustancias propias del mortero y hormigón, entre otros.

	- Se dispondrá de las fichas de los productos contaminantes y protocolo de actuación para cada caso. - Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos - tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. - Las pinturas, los barnices, disolventes, etc. se almacenarán en lugares bien ventilados.
Incendios y explosiones	- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso de almacén de pinturas. - Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los - recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. - Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas se instalará una señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". - Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). - Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio
Sobreesfuerzos	- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. - Como norma para levantar cargas se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. - No se manipularán nunca pesos superiores a 25 Kg, si es de forma continuada, y nunca más de 40 Kg. - Se evitarán posturas forzadas. Si no fuera evitable, se harán descansos. - El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. - La colocación de elementos de peso considerables (puertas, ventanas, etc), se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas y sobreesfuerzos.
Riesgo por contacto eléctrico	- Toda herramienta y maquinaria eléctrica, una vez finalizado su uso, se apagará y guardará en las zonas habilitadas para su almacenamiento.

Protecciones colectivas y señalización

- Balizamiento y señalización de la zona de actuación.
- Señalización de la ruta de evacuación.
- Instalación de barandillas homologadas para cubrir huecos en forjados y en cerramientos incompletos.
- Redes de protección de huecos.
- Extintores.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad contra impactos.
- Protecciones auditivas.
- Gafas de seguridad contra impactos.
- Ropa de trabajo
- Chaleco reflectante.
- Guantes de protección frente agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica contra golpes y perforación.
- Mascarilla.
- Gafas de seguridad.
- Arnés de seguridad (en caso de realizar trabajos en altura).

11 Trabajos con hormigon

Descripción

Se incluyen los trabajos de hormigonado (ejecución de rampa).

Consiste en el relleno con hormigón de huecos originados por el picado de pavimento ejecutado en el desmontaje de barreras existentes con el fin de alcanzar la cota de rasante final.

También incluyen otros trabajos de hormigonado que puedan surgir en el transcurso de la obra.

Proceso constructivo

Vertido por bombeo

En este caso, el hormigón es transportado a través de una tubería desde el camión que lo transporta a la obra hasta su lugar de puesta en obra, impulsado por una bomba rotativa o de pistones. Para que un hormigón pueda ser bombeado debe de tener una serie de características concretas que permitan el éxito de la operación. Así, el asiento del cono de Abrams (ensayo de consistencia) debe estar comprendido entre 8 (ocho) y 20 (veinte) centímetros para evitar problemas de segregación del árido grueso y el bloqueo del hormigón dentro de la tubería. En cuanto a los áridos, la arena debe de corresponder al 40-45% (cuarenta a cuarenta y cinco) del total de áridos, mientras que la proporción de finos debe de situarse entre 350 (trescientos cincuenta) y 400 (cuatrocientos) kg/m3, además, la relación agua-cemento debe estar entre 0,5 (cero coma cinco) y 0,6 (cero coma seis).

Cabe destacar que las bombas permiten un hormigonado continuo, obteniendo buenos rendimientos y llegando a puntos de difícil acceso, además es una tecnología que está en continuo avance y permite la elección del tipo de bomba entre una gran variedad de ellas. Sin embargo, también existen una serie de inconvenientes que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar este método, como es que para rentabilizarlo económicamente deberemos hormigonar alrededor de 30-150 (treinta a ciento cincuenta) m3/h, ya que conlleva

un proceso de instalación complejo, que necesita de un personal especializado y de una detallada planificación que terminan por incrementar su coste.

- El equipo encargado del manejo de la bomba estará formado por personal cualificado.
- La tubería de la bomba se apoyará arriostrando las partes susceptibles de movimiento.
- El extremo de la manguera será gobernado por al menos dos operarios para evitar caídas por el movimiento
- incontrolado.
- Antes de iniciar el bombeo se deberá preparar el conducto para evitar taponamientos.
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se desmontará la tubería.
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecerá un camino de tablones seguro para que los operarios que manejen la manguera se apoyen.
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" internas.
- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento.

Maquinaria y medios auxiliares empleados

- Camión bomba hormigonar
- Vibrador de hormigón
- Hormigonera
- Carretilla

Relación de riesgos existentes

- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos
- Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamientos por vuelcos de máquina.
- Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Exposición a agentes físicos (ruido y vibraciones).
- Otro: trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
- Otro: sobreesfuerzo por posturas inadecuadas.

Riesgos y medidas preventivas

Caída de personas al mismo nivel	– Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. – Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria utilizada. – La zona donde se va a verter el hormigón se habrá despejado previamente de personas y cosas.

Pisadas de objetos	– En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las zonas de trabajo.
Golpes y contactos con elementos móviles de las máquinas	– Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. – Se utilizará ropa ceñida, evitando así la ropa demasiado suelta como bufandas u otros atuendos que impidan trabajar con seguridad. – Se mantendrá una limpieza esmerada. Se eliminarán antes del vertido del hormigón puntas, restos de madera, redondos, maderas sin apilar y alambres.
Proyección de partículas	– Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites establecidos y reglamentarios. – Se prohibirá la presencia de operarios sobre el material cargado (especialmente si los equipos de transporte se encuentran en movimiento) y se adoptarán las medidas precisas para garantizar su seguridad – Los operarios que manejen el hormigón, además de la ropa normal de trabajo usarán obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas antipartículas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas	– Respetar la velocidad de circulación en el interior de obras. – Los conductores de los camiones respetarán las normas del tajo, así como la señalización y normas para conductores de vehículos y las normas de seguridad para conductores del camión bomba de hormigón. – Se señalizarán las zonas de cruce de las vías por donde circule la maquinaria. – Se prohibirá terminantemente la presencia de trabajadores en el radio de acción de la maquinaria durante los trabajos, la cual obligatoriamente deberá mantener en todo momento activados sus elementos de señalización (rotativos luminosos, avisador acústico de marcha atrás, etc.).
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas	– Se dispondrá de las fichas de los productos contaminantes y protocolo de actuación para cada caso. – Se evitará el contacto de las manos con la lechada. – Todo el personal que trabaje en posible contacto con hormigón debe hacer uso de guantes y ropa adecuada para evitar el daño a la piel producido por este material.
Exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones	– Realizar un correcto mantenimiento de las máquinas. – Los vibradores estarán provistos de toma de tierra. – Los vibradores sólo pueden ser manejados por trabajadores en buen estado físico y habrá que adoptarse las medidas posibles para reducir las vibraciones transmitidas al operario por el vibrador. – Reducir la exposición a vibraciones alternando tareas o haciendo pausas. – Usos de elementos de protección frente a vibraciones, como guantes, fajas, muñequeras, etc. – Frente a la exposición prolongada será necesario situarse en zonas donde el nivel sonoro del ruido no sea molesto, y en casos de permanencia obligada el uso de equipo de protección individual.

Otro: Trabajos sobre suelos húmedos o mojados	– Uso de calzado aislante por parte de los trabajadores, tal y como indica la norma UNE-EN 50321:2000.
Otro: Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas	– Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. – Como norma para levantar cargas, se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. – No se manipularán nunca pesos superiores a 25 (veinticinco) Kg si es de forma continuada, y nunca más de 40 (cuarenta) Kg. Se evitarán posturas forzadas, si no fuera evitable se harán descansos.

Protecciones colectivas

- Vallado de la zona de actuación

Señalización y balizamiento

- Señalización y balizamiento de la zona de actuación mediante cintas /mallas de señalización o conos.

Equipo de protección individual

- Casco de seguridad.
- Guantes impermeabilizados y de cuero.
- Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.
- Calzado de seguridad.
- Calzado de goma o P.V.C. de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Ropa o chaleco reflectante de alta visibilidad.

12 Trabajos de encofrado y desencofrado

Descripción

Comprende los trabajos de soporte para el hormigonado; el encofrado es un molde para contener el hormigón, generalmente armado, de una estructura ejecutada in situ. Debe ser:

- Resistente a las cargas.
- Indeformable a las presiones del hormigón.
- Estanco, evitando pérdidas apreciables de lechada o mortero.

Proceso constructivo

Los trabajos de montaje del encofrado comprenden la colocación de paneles de encofrado colocados a modo de molde de la estructura a ejecutar. Estos tablones se unirán entre sí mediante puntas y clavos.

Procedimiento

1 – Diseño del encofrado

Se planifica y diseña el encofrado teniendo en cuenta la estructura de hormigón, la carga que soportará, el tiempo de fraguado y las condiciones climáticas.

2 – Preparación del terreno

Antes de comenzar con el encofrado, se prepara el terreno, lo que puede incluir nivelación, compactación y, en algunos casos, la colocación de una base de grava o una membrana impermeable para proteger el hormigón de la humedad del suelo.

3 – Montaje del encofrado

Se instalan los paneles de encofrado siguiendo el diseño y asegurándose de que estén bien alineados y nivelados. Los paneles se unen mediante soportes, grapas, clavos o tornillos y se refuerzan con puntales y tirantes para mantener la estabilidad durante el proceso de vertido del hormigón.

4 – Colocación del hormigón

Una vez que el encofrado está montado y asegurado, se vierte el hormigón en el espacio creado por los paneles. Es importante asegurarse de que el hormigón se distribuya de manera uniforme y se compacte adecuadamente para evitar la formación de burbujas de aire y garantizar una superficie lisa y resistente.

5 – Curado del hormigón

Después de verter el hormigón, es necesario permitir que se cure durante un tiempo determinado, lo que variará según la mezcla de hormigón y las condiciones ambientales. El curado puede incluir la aplicación de agua, membranas de curado o mantas térmicas para controlar la humedad y la temperatura durante el proceso de endurecimiento. Es esencial para garantizar que el hormigón alcance su resistencia máxima y durabilidad.

6 – Desencofrado

Una vez que el hormigón ha alcanzado suficiente resistencia, se retiran los paneles de encofrado. El tiempo necesario para llegar a este punto dependerá de la mezcla de hormigón utilizada y las condiciones ambientales. Al desencofrar, se debe tener cuidado para no dañar la superficie del hormigón ni debilitar la estructura.

7 – Acabado y reparaciones

Después de quitar el encofrado, se realiza cualquier trabajo de acabado necesario, como alisar la superficie, aplicar revestimientos o pintura y realizar reparaciones menores. Esto puede incluir la eliminación de imperfecciones, la reparación de pequeños defectos o la colocación de juntas de dilatación para controlar la expansión y contracción del hormigón debido a cambios de temperatura.

Los trabajos de encofrado, hormigonado y desencofrado son realizados simultáneamente y de forma continua.

Es de aplicación, de manera complementaria a lo indicado en este apartado, el apartado "Vertido y vibrado de hormigón".

Maquinaria y medios auxiliares empleados

- Paneles de encofrado.
- Sierra circular.

- Herramientas manuales.
- Puntales

Relación de riesgos existentes

- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpe contra objetos inmóviles.
- Aplastamiento
- Contactos con sustancias tóxicas o corrosivas.
- Sobreesfuerzos.

Riesgos especiales

Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso preventivo siempre que se hagan trabajos de manipulación de cargas, trabajos en altura o cuando exista tal concurrencia de actividades que requiera que el recurso preventivo controle la ejecución de los métodos de trabajo.

Riesgos y medidas preventivas

Caída de personas al mismo nivel	- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. - Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará para su posterior retirada.
Pisadas sobre objetos	- Una vez desencofrado, los materiales se apilarán correctamente y en orden. - Respecto a la madera con puntas, debe ser desprovista de las mismas o en su defecto apilada en zonas que no sean de paso obligatorio del personal.
Golpe contra objetos inmóviles	- Uso de equipos de protección personal adecuados, como cascos, guantes y botas de seguridad - Señalización de zonas de peligro - Implementación de procedimientos de trabajo seguras para la manipulación de materiales y herramientas. - Supervisión constante del trabajo - Una vez desmontado el material de encofrados, deberá colocarse de manera que no obstruyan los lugares de trabajo o de paso, ni las vías de tráfico. - Se establecerán condiciones óptimas de iluminación, para proporcionar condiciones admisibles de visión. - Se deberán retirar cuanto antes a vertedero, o eliminar los elementos cortantes y punzantes.
Cortes	- Uso de equipos de protección individual adecuados, como guantes de corte - Manejo cuidadoso de las herramientas - Mantenimiento de las herramientas en buen estado

Aplastamiento	- Almacenamiento seguro de los tablones y otros elementos del encofrado. - Utilización de puntales y arriostramientos para asegurar la estabilidad del encofrado. - No sobrecargar el encofrado
Contacto con sustancias tóxicas o corrosivas	- Se deberá usar guantes destinados a proteger frente a este riesgo. No se tocarán nunca las partes sometidas a corte debido a su local calentamiento. En caso necesario se deberá cerciorar que no se encuentra a temperaturas excesivas. - Se utilizarán los guantes de protección en caso de contacto con sustancias desencofrantes y con el propio hormigón
Sobreesfuerzos	- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. - Como norma para levantar cargas, se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. - No se manipularán nunca pesos superiores a 25 (veinticinco) Kg si es de forma continuada, y nunca más de 40 (cuarenta) Kg. Se evitarán posturas forzadas, si no fuera evitable se harán descansos.

Protecciones colectivas

- Vallado de seguridad

Señalización y balizamiento

- Balizamiento de la zona de actuación. En el momento del desencofrado, se balizará la zona para restringir el acceso a personal externo a estos trabajos.
- Carteles de indicación de los riesgos existentes.

Equipo de protección individual

- Casco de seguridad
- Guantes de protección contra agresiones químicas
- Ropa o chaleco reflectante de alta visibilidad.
- Calzado de seguridad

13 Carpintería de madera y de aluminio

Descripción

Carpintería de madera: son todos los elementos de madera que son, por lo general, elaborados en taller, recibiendo un proceso completo de industrialización y que sólo requieren ser colocados en obra tal como han

sido fabricados, como, por ejemplo, las puertas, ventanas, muebles, etc. O pueden tratarse de materiales que deben recibir un proceso de transformación en obra, como, por ejemplo, tabiques, divisores, etc.

Carpintería de aluminio: se diferencia a la metálica por las propias características del material y es que el aluminio es un material no ferroso muy abundante, de baja densidad, pero a su vez de gran resistencia y dureza cuando está aleado, de fácil, de pulido, tenaz, dúctil y maleable, por eso es uno de los materiales más utilizados en la construcción, solo superado por el acero.

Relación de riesgos previsibles

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caída de objetos en manipulación. - Caída de objetos desprendidos.
- Contactos eléctricos.
- Pisadas sobre objetos.
- Choque contra objetos inmóviles.
- Golpes y/o cortes por objetos o herramientas.
- Sobreesfuerzos. - Manipulación de cargas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Manipulación de productos químicos.
- Exposición a ruidos y vibraciones.
- Incendios y explosiones.

Riesgos y medidas preventivas

Caídas de personas a distinto y mismo nivel	– Mantener despejado el entorno del puesto de trabajo, las zonas de paso, los pasillos, las escaleras y las salidas. – Evitar la acumulación de piezas u objetos en el suelo, sobre las mesas de trabajo o sobre máquinas. – En caso de utilización de escaleras, tenemos como requisitos: que cumplan con las medidas de seguridad de las mismas. Deberán estar en estado óptimo de uso, usando aquellas de longitud afín al trabajo de altura a ejecutar. Deberán estar previstas de apoyos antideslizantes y mantener la relación de inclinación óptima, siendo esta L/4 la separación de la base respecto a la vertical de apoyo, siendo L la longitud de escalera apoyada. En casos de escaleras de tijera deben poseer limitador de apertura. Deben cumplir el anexo I apartado A.9 del R.D. 486/1997.
Caídas de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento	– En cuanto a almacenamiento de materiales, se apilarán en posición horizontal y estable, impidiendo posibles vuelcos. – Respetar los objetos que más pesen en zonas más bajas. – Al terminar los trabajos, ordena tu área de trabajo, guarda los útiles, equipos y herramientas y revisa que todas las maquinarias estén apagadas y detenidas.

Contactos eléctricos	– No se efectuarán manipulaciones de equipos e instalaciones eléctricas. La instalación, mantenimiento y reparación sólo la puede hacer personal autorizado y cualificado para ello. – No conectes cables sin su clavija de conexión homologada, ni sobrecargues los enchufes utilizando ladrones o regletas de forma abusiva. – Desconecta siempre los equipos eléctricos tirando de la clavija, nunca del cable. – Evita su sobrecalentamiento. En caso de observar alguna anomalía en forma de descarga eléctrica, olor, humo o ruido no habituales, desconecta el equipo y avisa para su reparación. – No anules la puesta a tierra. Si observas que están deterioradas, avíselo. - Se procurará que los cables no discurran por pasillos o cualquier zona donde puedan estropearse y puedan además producir situaciones de caída de personal. – No se manipularán interruptores de luz, bases o los equipos con las manos mojadas o los pies húmedos. Asimismo. Se evitarán pasar por trapos mojados o fregonas sobre clavijas conectadas y aparatos eléctricos en funcionamiento. – En caso de encontrarnos con una persona electrocutada, se actuará: – Se cortará la tensión y se avisará a los equipos de emergencias. En caso de no poder cortar la tensión, se intentará apartar al electrocutado de la fuente de tensión sin tocarlo directamente. Se utilizará para ello elementos aislantes como listones de madera. – Si se está capacitado para ello, se le proporcionará de inmediato los primeros auxilios.
Pisadas sobre objetos	– En trabajos con materiales cortantes, se desecharán aquellos que presenten deficiencias, defectos o fisuras.
Choque contra objetos	– Se establecerán condiciones óptimas de iluminación, para proporcionar condiciones admisibles de visión. – Los puntales u otras formas de sujeción de las plataformas de desembarque de material estarán bien anclados. – Se prohíbe pasar bajo zonas de trabajo que puedan repercutir en la caída de material u herramientas. En caso inevitable de paso obligado, se avisará al personal de tal intención. Utilización de calzado de seguridad con puntera metálica y suela antideslizante
Sobreesfuerzos	– Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. – Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. – Como norma para levantar cargas se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. – No se manipularán nunca pesos superiores a 25 Kg. Si es de forma continuada, y nunca más de 40 Kg. Se evitarán posturas forzadas. Si no fuera evitable se harán descansos.

Manipulación de cargas	– Compruebe que se dispone de espacio suficiente para el manejo de la carga. Además, si se tiene que desplazar la carga, observa que el recorrido esté libre de obstáculos. - Cuando los materiales a manipular sean pesados, voluminosos o la frecuencia de manipulación sea elevada, se pedirá ayuda a los compañeros o se empleará medios auxiliares como carretillas, grúas o transpaletas. – Antes de manipular una carga, comprueba el estado de su superficie, en especial la existencia de bordes cortantes, clavos, astillas, humedad o temperatura. – Durante la manipulación de cargas habrá que tener en cuenta: aproximarse la carga al cuerpo, asegurarse un buen apoyo de los pies, manteniéndose ligeramente separados y uno de ellos un poco más adelantado que el otro, agacharse flexionando las rodillas, mantener la espalda recta, levantar la carga utilizando los músculos de las piernas y no dé la espalda, tomar firmemente la carga con las dos manos y mantenerla próxima al cuerpo durante todo el trayecto, evitar los movimientos bruscos de la espalda, en especial los giros. – Siempre que sea posible, adecua la posición del punto de recogida de cajas o materiales, de manera que: no sea necesario elevar los brazos por encima de los hombros, los codos permanezcan cerca del cuerpo y en la posición más baja posible y en caso de que el objeto a manejar se encuentre sobre un apoyo elevado, se acercará previamente al tronco, consiguiendo así una base y agarre firmes y estables. – Se usarán guantes de protección mecánica y calzado de seguridad con puntera reforzada para evitar cortes o golpes.
Golpes/ cortes por objetos o herramientas	– Seleccione la herramienta adecuada para el trabajo a realizar y úsela únicamente en las operaciones para las que ha sido diseñada. Se tendrá en cuenta que una mala elección puede ser causa directa de un accidente y lesiones musco-esqueléticas. – Se procurará que las herramientas y sus accesorios estén en buen estado, desechando aquellas defectuosas. Después de su utilización, guárdelas en su sitio. – Se asegurarán de que las herramientas de corte estén afiladas antes de su uso y se emplearán siempre en dirección contraria al cuerpo, evitando dar tirones o sacudidas. - Seleccione siempre herramientas con ángulos que permitan trabajar con la mano y el brazo alineados. Si la dirección de la fuerza es horizontal: – Elige herramientas con empuñadura "tipo pistola" para trabajar a la altura del codo. – Opta por herramientas con la empuñadura recta en trabajos por debajo de la cintura. Si la dirección de la fuerza es vertical, será al contrario. Usa las de "tipo pistola" para trabajar por debajo de la cintura y aquéllas con la empuñadura recta para trabajar a la altura del codo.
Incendios y explosiones	– En zonas con riesgo de incendio o explosión, y en proximidad de productos inflamables, consulta las medidas de protección a seguir durante el uso de equipos eléctricos y herramientas metálicas. – Impide la formación de atmósferas explosivas: – Establece un programa de mantenimiento y limpieza adecuado (limpieza por aspiración o barrido húmedo), impidiendo la acumulación de polvo sobre equipos e instalaciones y derrames de líquidos inflamables.

	– Mantén en tu puesto de trabajo únicamente la cantidad necesaria de sustancias inflamables o materiales combustibles. – Cierra rápidamente los recipientes de disolventes, pintura, etc., una vez utilizados, para evitar la concentración de gases por evaporación, y almacénalos en un lugar adecuado donde dispongan de buena ventilación. Manipula estos productos en zonas ventiladas o con sistemas de extracción. – Evita cualquier posible fuente de ignición efectiva: – Usa herramientas que dispongan de garantías de fabricación anti chispa y control de electricidad estática, así como equipos de trabajo adecuados a la presencia en atmósferas explosivas. – Deposita los desechos inflamables en contenedores destinados a tal fin. Limpia los derrames de líquidos, especialmente los inflamables, cubriéndolos con un compuesto absorbente apropiado. Nunca utilices serrín. Impide la acumulación de electricidad electrostática revisando periódicamente que se mantiene la puesta a tierra de los equipos e instalaciones metálicas, como los conductos de extracción. Evita el uso de ropas con tejidos sintéticos o lana, ya que acumulan electricidad estática. – No emplees el aire comprimido para eliminar restos de polvo o suciedad. Ten en cuenta que el aire comprimido aumenta la dispersión de éstos en el ambiente. – Utiliza y mantén los medios de extracción y ventilación de los que dispones conforme a las instrucciones del fabricante. – Recuerda que un mantenimiento deficiente de los mismos reduce su efectividad de manera importante.
Proyección de fragmentos o partículas.	– Lleva las protecciones establecidas en función de la tarea a desarrollar: gafas o pantallas de seguridad en trabajos con riesgo de proyección de partículas, guantes para evitar golpes y cortes, y calzado de seguridad ante el riesgo de caída de herramientas o piezas durante su utilización, botas y guantes de goma en ambientes húmedos, etc
Manipulación de productos químicos	– Antes de proceder a la manipulación de productos químico, da a conocer los riesgos del uso de estos a través de sus fichas de datos de seguridad. – Estos productos deben estar identificados, por lo que se debe etiquetar todo recipiente no original, indicando su contenido. – Almacena los productos en un lugar alejado de fuentes de calor, bien ventilado y protegido frente a condiciones ambientales extremas. Separe productos inflamables y botellas de gases. - Mantenga en tu lugar de trabajo la cantidad para un uso diario. – Evite realizar trasvases de productos químicos. En caso de realizarlos, hazlo en lugares ventilados, lentamente y extremando las precauciones para prevenir salpicaduras. Siempre que sea posible, emplea medios auxiliares como los dosificadores. – Recuerda no dejar los envases abiertos, ya que su contenido pasaría al ambiente. – No manipules ni almacenes productos químicos en zonas donde se trabaje con equipos que produzcan chispas o generen calor; tampoco utilices llamas abiertas en estas zonas.

Exposición a ruidos y vibraciones	– Mantén en buen estado tus equipos de trabajo; Las máquinas o herramientas con un deficiente mantenimiento producen un mayor nivel de ruido y vibraciones. Solicita su reparación o cambio en caso de avería. – Siempre que sea posible, evita la propagación del ruido o vibraciones a otras zonas durante la realización de las tareas habituales. – No elimines o alteres los elementos amortiguadores y silenciadores de las máquinas. – Detén los equipos de trabajo y sistemas de extracción cuando no los estés utilizando. – Alternas actividades que te expongan a ruido o a vibraciones con otras que no lo hagan, siempre que sea posible. – Evita en lo posible la humedad y el frío, ya que agudizan el efecto de las vibraciones. – En el caso de que tomes algún medicamento ototóxico (medicamentos que incrementan los efectos nocivos del ruido), ponlo en conocimiento de tu empresa. – Utiliza la protección auditiva frente a todo tipo de ruido: máquinas automáticas, motores, herramientas, golpeo de superficies, etc. Recuerda usar la protección durante todo el tiempo de exposición al mismo, ya que no utilizarla durante algún periodo, por muy corto que éste sea, disminuye considerablemente la eficacia del equipo de protección, pudiendo suponer una agresión para tu oído

Medidas preventivas genéricas

- Cuando las operaciones a realizar requieran el empleo de la fuerza, utiliza herramientas de mango largo. Si bien, si éstas no permiten una correcta alineación entre la mano y el brazo, será adecuado usar las de mango corto.
- En tareas que demanden aprietes repetitivos, usa herramientas de agarre doble con muelle recuperador para facilitar la apertura del mango.
- Si las tareas suponen una presión permanente, usa también herramientas de agarre doble, pero que dispongan, en este caso, de sujetador o bloqueador de pinzas.
- Usa cinturón porta herramientas que te proteja contra pinchazos y cortes; Nunca las transportes en el bolsillo.
- En caso de utilizar herramientas de potencia, adopta las siguientes pautas: - Comprueba que sus elementos de trabajo (brocas, discos, etc.) están perfectamente apretados y son los apropiados a la tarea a realizar.
- Verifica que la cubierta aislante de los cables de alimentación y las clavijas de conexión se encuentran sin cortes, presencia de cables pelados, etc.
- Cuando tengas que realizar algún ajuste en el útil, desenchúfalo y mantén la clavija a la vista y en tus proximidades. - No bloquees el gatillo para el funcionamiento permanente de las mismas. - Evita transportarlas o almacenarlas sujetándolas por el cable de red.
- En zonas con riesgo de incendio o explosión, y en proximidad de productos inflamables, consulta las medidas de protección a seguir durante el uso de equipos eléctricos y herramientas metálicas.
- No uses las herramientas cuando estén húmedas o mojadas. Tampoco cuando tengas las manos o pies mojados. Si trabajas en zonas mojadas o muy conductoras, utiliza herramientas especiales con alimentación a tensión igual o inferior a 24 V (receptor de clase III) o herramientas de doble aislamiento

(receptor de clase II) alimentadas mediante un transformador separador de circuitos y circuito protegido por DDR de alta sensibilidad (30mA).

- Cuando acabes de utilizarlas, desenchúfalas para evitar su puesta en marcha involuntaria, tirando de la clavija y no del cable.
- Lleva las protecciones establecidas en función de la tarea a desarrollar: gafas o pantallas de seguridad en trabajos con riesgo de proyección de partículas, guantes para evitar golpes y cortes, y calzado de seguridad ante el riesgo de caída de herramientas o piezas durante su utilización, botas y guantes de goma en ambientes húmedos, etc.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad contra impactos.
- Guantes de protección frente agresiones mecánicas.
- Guantes de protección frente agresiones corrosivas.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica contra golpes y perforación.
- Ropa de trabajo de algodón.
- Faja lumbar contra esfuerzos dorso-lumbares

14 Carpintería metálica y cerrajería

Descripción

La carpintería metálica consiste en la fabricación y comercialización de productos de acero, hierro, aluminio, cobre, latón, bronce para ser empleados en la construcción, industria, sector agrario, decoración y hogar.

También son considerados trabajos de carpintería metálica, trabajos de puertas y rejas de hierro, mamparas, cerramientos, escaleras, barandillas, celosía, ventanas, toldos, persianas y trabajos como construcción de estructuras metálicas y naves industriales.

La cerrajería es un oficio dedicado a la reparación y mantenimiento de cerraduras, candados, cerrojos y cilindros, tanto de puertas comunes como así también de vehículos. Una cerradura es un mecanismo de metal instalada para impedir que puertas y tapas se puedan abrir sin una llave.

Esta unidad de obra incluye el suministro y colocación de pasamanos, barandillas, puertas cortafuegos, y trabajos complementarios de carpintería metálica y cerrajería que pudiesen surgir durante la obra.

Relación de riesgos previsibles

- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Caídas de objetos.
- Golpes y cortes con objetos y herramientas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Mala iluminación.
- Ambiente pulvígeno.
- Explosiones e incendios.
- Intoxicaciones con disolventes, barnices, colas u otros productos similares.

Riesgos y medidas preventivas

Caídas de personas a distinto y mismo nivel	– Cualquier plataforma de trabajo dispondrá de una anchura mínima de sesenta centímetros, debiendo quedar iluminada la zona de trabajo. – Escaleras de mano. Han de ir preparadas con zapatas antideslizantes. En caso contrario se amarrarán. En caso de superficies blandas se dispondrá de bases de apoyo y reparto para evitar la hinca de largueros y el vuelco de la escalera. – Escaleras de tijera. Las escaleras de tijera han de llevar una cadenilla o elemento limitador de la apertura.
Caídas de objetos	– Colocación. La colocación se llevará a cabo al menos por dos personas para evitar vuelcos, golpes y caídas. – Apuntalamiento de ventanas. Se deberán apuntalar los cercos de ventana sobre precerco para evitar el vuelco de estas, tanto hacia el interior como al exterior. – Izado de materiales. El izado de materiales a las plantas se realizará en bateas dispuestas a tal efecto o por bloques atados —nunca sueltos—bien eslingados y descargados para ser recepcionados en plataformas de carga y/o descarga o lugar expresamente preparado para ello
Pisadas sobre objetos Choque contra objetos Golpes/ cortes por objetos o herramientas	– Transporte manual de materiales. El transporte a mano de elementos de longitud superior a dos metros se realizará teniendo en cuenta que la punta quede siempre a una altura superior a la de una persona para evitar el golpe a otros operarios. – Pueden consultarse las normas establecidas para los trabajos de soldadura y oxicorte en la parte de maquinaria en lo referente a soldadura. – Se han de mantener en orden y limpieza las superficies de trabajo. No se permitirá que se dejen materiales en los bordes de los edificios. – Los acopios de materiales deberán realizarse en lugares determinados y ordenadamente.
Ambiente pulvígeno	– Deberá realizarse previendo el riesgo higiénico debido al polvo de madera. Deberá trabajarse siempre en zona ventilada, utilizando en cada caso el equipo de protección adecuado.
Mala Iluminación	– Se utilizarán en caso necesario lámparas portátiles acordes a la normativa: portalámparas estancos con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. – La iluminación mínima exigida será de 100 lux.
Contactos eléctricos	– Cuadros eléctricos. – No se permitirá la conexión de cuadros eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las correspondientes clavijas macho-hembra. – Lijado con herramienta eléctrica manual. – En carpintería metálica. Se dispondrá de los medios necesarios para elevar cargas pesadas. Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estará protegida por disyuntor diferencial y poseerá toma de tierra.

Explosiones Incendios	– Almacenamiento de materiales inflamables. Las colas, barnices, decapantes, disolventes y pinturas han de quedar almacenados en espacios ventilados, disponiendo en las proximidades de un extintor de polvo seco y señalización expresa de "prohibido fumar", en evitación de incendios y explosiones. – Desecho de materiales inflamables. Los restos de trapos, algodón, papel, etc. impregnados de disolvente o pintura han de ser depositados en recipientes adecuados y destinados a tal uso. – Se deben instalar extintores junto a los tajos, dada la naturaleza (productos combustibles) de los materiales utilizados en estas labores
Contacto con sustancias causticas y/o corrosiva	– Antes de iniciar cualquier actividad se deberá comprobar el buen estado de los equipos de trabajo. – Si para realizar alguna operación se ha de retirar alguna protección colectiva, inmediatamente después de acabarse dicha operación será colocada de nuevo, en el caso de que el trabajo realizado no sustituya a dicha protección colectiva.

Equipos de protección individual

- En carpintería metálica. Para la manipulación de elementos de carpintería metálica se utilizarán guantes para su manipulación y evitar cortes, arañazos, pinchazos, etc. debido a las rebabas en empalmes, soldaduras y juntas.
- En soldadura. En caso de tener que efectuar trabajos menores de soldadura o corte mediante soplete se deberá emplear el equipo de protección individual tanto por el trabajador que realice la operación como por el ayudante.
- Se utilizará obligatoriamente el casco y botas con puntera reforzada

15 Vidrierías

Descripción

Se consideran actividades de vidriería a aquéllas relacionadas con la realización de trabajos tales como, por ejemplo, la colocación de láminas industrializadas de vidrio, de cristal o de material plástico, transparente o traslúcido, en huecos o vanos de ventanas, puertas, cancelas, techos, etc.

Entre dichas actividades se incluyen los acristalamientos de los cerramientos de edificios, cristales en ventanas, puertas, lucernarios y claraboyas, así como los elementos decorativos de cristal (espejos, vitrales, etc.).

En algunos países, se denomina vidriera a la estructura que dispone de vidrios y que permite cerrar una ventana o una puerta. Vidrieros y vidrieras, por otra parte, son aquellos que se encargan de instalar estas estructuras o que comercializan vidrios.

Una vidriera, por otra parte, es el sector de un comercio en el que se exhiben los productos en venta. En este sentido, vidriera es sinónimo de escaparate. Por lo general, los productos se presentan detrás de un

vidrio en la parte delantera de la tienda (es decir, en un lugar donde se pueden ver sin que la persona entre al negocio).

Esta unidad de obra incluyen los trabajos de instalación de puertas corredera automática de vidrio

Relación de riesgos previsibles

- Caída de personas al mismo nivel.
- Golpes o aplastamientos por caída de cargas u otros objetos.
- Atrapamientos, golpes, cortes o pinchazos.
- Caída de objetos por vuelvo o desplome de máquinas o equipos de trabajo.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Sobreesfuerzos.

Riesgos y factores de riesgos

- Caída al mismo nivel:
  - Limpieza irregular de zonas de trabajos.
  - Acopio de materiales en zonas de tránsito.
  - Superficies de tránsito o trabajo irregulares o con desniveles.
  - Iluminación insuficiente.
- Golpes o aplastamientos por caída de cargas u otros objetos:
  - Recepción de material en planta con grúas, montacargas, maquinillo, etc.
  - Operaciones de recepción y fijación de paneles de vidrio o cristal en ventanas, lucernarios, claraboyas o en su localización definitiva.
- Caída de objetos y materiales durante la realización de trabajos o instalación de acopios próximos a:
  - Perímetros de fachada.
  - Bordes de escaleras.
  - Huecos horizontales interiores sobre zonas o superficies de paso en niveles inferiores.
  - Manipulación y transporte manual de materiales y herramientas.
- Atrapamientos, golpes, cortes o pinchazos:
  - Con objetos o materiales inmóviles.
  - Manejo de máquinas y herramientas manuales.
  - Rotura de vidrio en operaciones de recepción, transporte o manipulación.
  - Rotura de vidrio en operaciones de montaje y fijación en ventanas, puertas, cancelas y techos acristalados, en su localización definitiva.
  - Caída de objetos por vuelvo o desplome de máquinas o equipos de trabajo:
  - Instalación inadecuada de torres de trabajo, andamios de borriqueta, plataformas de carga y descarga de materiales, y montacargas.
  - Inspección periódica insuficiente o mantenimiento deficiente de los elementos componentes de torres de trabajo, plataformas de carga y descarga de materiales, y montacargas.
- Contactos eléctrico directos e indirectos:
  - Acometidas a cuadros eléctricos (primarios o secundarios) inadecuados o deficientes.
  - Cableado que discurre por zonas de trabajo.
  - Trabajos con equipos eléctricos mal aislados o defectuosos.

  - Montacargas de obra con aislamiento (puesta a tierra) deficiente.
  - Inspección periódica insuficiente de la instalación eléctrica provisional de la obra.
- Sobreesfuerzos:
  - Trabajos sin descansos.
  - Manipulación de pesos superiores a 25 Kg y a 40 Kg en trabajos de manera continuada.

Medidas preventivas genéricas

- Previamente a la realización de las operaciones de vidriería se deben planificar las tareas que se van a realizar con el objeto de evitar incidencias posteriores. Para ello, se han de analizar una serie de factores previos a la ejecución de los trabajos que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores, tales como, por ejemplo:
  - Las características constructivas de la obra y su tipología.
  - Los equipos que se van a emplear.
  - Las alturas de trabajo que se tienen que alcanzar.
  - El emplazamiento de las zonas de trabajo y su proximidad a huecos o perímetros abiertos de fachada, huecos interiores horizontales o verticales, huecos de escaleras interiores.
  - Las zonas de paso y los accesos a planta.
  - La instalación de sistemas de protección (barandillas, redes, etc.) y su eficacia.
  - La señalización y delimitación de espacios de trabajo y acopio.
  - La simultaneidad con otros trabajos interiores.
  - Las interferencias con zonas de paso de terceros (aceras, viales públicos) o zonas de concurrencia pública (patios de colegio, patios vecinales, etc.).
- En función de la tipología de los trabajos de vidriería a realizar y del proceso de instalación de los mismos, se deben determinar los distintos medios auxiliares más adecuados a utilizar (andamios de borriquetas, andamios plegables, escaleras de mano, torres de trabajo móviles, plataformas elevadoras, etc.) para posibilitar los trabajos en altura. En esta determinación se deben tener en cuenta, entre otros factores:
  - La altura de trabajo que se tiene que alcanzar.
  - La adaptabilidad de dichos medios auxiliares tanto al proceso productivo, como al entorno de trabajo.
  - El conocimiento (características, resistencia y nivelación) de las superficies sobre las que se van a apoyar o utilizar estos equipos.
  - La disponibilidad de sistemas de protección colectiva.
- El cumplimiento de los requisitos normativos tanto reglamentarios, como técnicos, que les son de aplicación para su instalación y utilización.
- En la misma línea, se ha de realizar un estudio de los medios auxiliares para la recepción de materiales (montacargas, plataformas de carga y descarga, maquinillos, etc.), así como de los útiles y aparejos especiales de izado más apropiados para la elevación de los materiales a instalar (paneles de vidrio o cristal). Para ello, se ha de atender a lo indicado en el anexo A "Equipos de trabajo. Máquinas y medios auxiliares" de este CTPE.
- Asimismo, se tiene que realizar un análisis de los distintos sistemas de protección colectiva que se pueden utilizar con el objeto de seleccionar los más adecuados a la tipología de obra y al proceso constructivo particular. En este estudio se debe considerar, entre otros factores:
- La selección de sistemas de protección colectiva que cumplan con los requisitos normativos de carácter tanto reglamentario, como técnico, que les sean de aplicación.

- La idoneidad de dichos sistemas de protección frente a las alturas de trabajo que se deben alcanzar.
- La idoneidad de los elementos de fijación y anclaje de los citados sistemas de protección, de forma que:
- Sean adecuados y compatibles para la instalación posterior de los sistemas de protección.
- Sean compatibles con el proceso productivo y garanticen su estabilidad en el tiempo con el fin de evitar su retirada por una mala ubicación e interferencia con dicho proceso de trabajo.
- En su caso, la validez e idoneidad de los sistemas de protección ya instalados, en base a los parámetros y requisitos anteriores.
- En cualquier caso, en lo referente a los sistemas de protección contra caídas desde altura, se ha de atender a lo indicado tanto en el Documento Básico DB-PRL-ES "Prevención de riesgos laborales en Estructuras" y sus Secciones, como en el anexo C "Sistemas de protección contra caídas desde altura", de este CTPE.
- Además, se tiene que efectuar un estudio de las características de las zonas de trabajo con el objeto de prever las zonas de paso y acceso, la señalización y delimitación de los espacios de trabajo y acopio, etc.

Riesgos y medidas preventivas

Caídas de personas a mismo nivel	- Se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada, se evitará dejar herramientas y materiales desperdigados en zonas de paso.
Atrapamientos, golpes, cortes o pinchazos.	- Durante las tareas de colocación de los cristales sobre los marcos de aluminio, se extremarán las precauciones con la ayuda de dos personas durante su montaje. - En caso de trabajar en niveles superiores se informará de la actividad en niveles inferiores, para no transitar en la mismo vertical, por si cayera accidentalmente cualquier elemento de trabajo.
Caída de objetos por vuelvo o desplome de máquinas o equipos de trabajo.	- Los materiales deberán estar acopiados en lugares concretos si no son de uso continuo y de forma recogida en el lugar de trabajo, evitando la dispersión de los mismos por la obra. - Se prohíbe permanecer o pasar por zonas de cargas estáticas suspendidas, haciendo revisar el estado del utensilio portante, en comprobación del buen estado de uso. Suspender cargas fuera de todo tajo o zona de tránsito.
Sobreesfuerzos	- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. - Como norma para levantar cargas se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. - No se manipularán nunca pesos superiores a 25 Kg. Si es de forma continuada, y nunca más de 40 Kg. Se evitarán posturas forzadas. Si no fuera evitable se harán descansos.

Golpes o aplastamientos por caída de cargas u otros objetos.	- Durante el manejo de los cristales se usarán guantes especiales para el manejo de tales materiales, al igual del empleo de ropas de manga larga. En el empleo de las siliconas igualmente se emplearán guantes especiales para dicha sustancia. - Se mantendrán el orden y la limpieza en los lugares de trabajo. - Se utilizarán las herramientas adecuadas para cada trabajo. - Utilización de los equipos de protección tanto colectiva como individual. - Se establecerán condiciones óptimas de iluminación, para proporcionar condiciones admisibles de visión. - Se prohíbe pasar bajo zonas de trabajo que puedan repercutir en la caída de material, cargas o herramientas. En caso inevitable de paso obligado, se avisará al personal de tal intención.
Contactos eléctricos directos o indirectos	- Utilice medios que cumplan con la normativa. - Operaciones con equipos autorizados. - Utilice equipos con conexión a tierra. - No utilice equipos en mal estado de mantenimiento.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad contra impactos.
- Guantes de PVC largos.
- Mascarilla con filtro mecánico.
- Mascarilla con filtro específico (para atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos).
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
- Calzado de seguridad.

16 Colocación de señalización

Descripción y procedimiento constructivo.

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.

Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.

Colocación de tubo de acero galvanizado de señal vertical, colocado en tierra hormigonado. Incluye placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 55x70 cm, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente.

Maquinaria y medios auxiliares

- Herramientas manuales y eléctricas
- Pulidora
- Medios auxiliares

Relación de riesgos previsibles

- Caídas al mismo nivel.
- Caída de objetos en manipulación
- Golpes/choques contra partes móviles de la maquinaria
- Pisar objetos o herramientas situadas en zonas de paso.

Medidas preventivas

Caída de objetos por manipulación	- Antes del comienzo de los trabajos de un determinado tajo, se señalizará adecuadamente la zona, y se mantendrá dicha señalización hasta la completa finalización de los mismos. - Se prohíbe permanecer o pasar por zonas de cargas estáticas suspendidas, habiendo de revisar el estado del utensilio portante, en comprobación del buen estado de uso. Suspender cargas fuera de todo tajo o zona de tránsito.
Golpes contra objetos inmóviles	- No se llevarán ropas holgadas, susceptibles a quedar enganchadas en elementos que forman parte de la señalización vertical
Golpes y contactos con objetos móviles de las máquinas	- Los trabajadores pondrán máxima atención a los movimientos de las máquinas que se encuentren cercanas a los trabajos, así como a los movimientos de las cargas suspendidas. - Se mantendrá zonas de seguridad cuando se empleen ciertas herramientas en prevención del personal circundante. - En prevención del operario, seguir las normas de seguridad que establece el fabricante en el manejo de las máquinas.
Atrapamiento por vuelco de máquinas	- Se buscará buen asiento a las patas estabilizadoras del camión grúa u otras máquinas que intervengan.
Sobreesfuerzos	- Los trabajadores, siempre que sea posible, en la manipulación manual de cargas elevadas serán auxiliados con ayuda mecánica o realizarán las operaciones con ayuda de compañeros. - Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. - Como norma para levantar cargas, se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. - No se manipularán nunca pesos superiores a 25 (veinticinco) Kg si es de forma continuada, y nunca más de 40 (cuarenta) Kg. Se evitarán posturas forzadas, si no fuera evitable se harán descansos. -

Equipos de protección individual (EPIs)

- Casco de seguridad
- Guantes de protección
- Chaleco reflectante.
- Calzado de seguridad.

17 Pintado de señalización horizontal

Descripción

Comprende la colocación de la señalización horizontal principalmente en referencia al pintado de señalización vial.

Procedimiento constructivo

Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada

Ejecución de la señalización de zonas de aparcamiento, zonas de protección peatonal, espacios de circulación mediante líneas, con el pintado de pavimento con pintura pétrea acrílica, especial para señalizaciones, según las prescripciones del reglamento general de tráfico. El pintado de las líneas se realizará con máquina, y el de elementos especiales con plantilla y de forma manual con pistola.

Maquinaria y medios auxiliares empleados

- Máquina de pintado autopropulsada
- Herramientas y útiles para el pintado (brochas, pistolas para pintura, etc.)

Relación de riesgos previsibles

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Atropellos.
- Ruidos.
- Proyecciones.
- Sobreesfuerzos.

Riesgos y medidas preventivas

Atropello o golpes con vehículos	- Se señalizará (incluyendo desvíos, elementos de defensa, limitadores de velocidad, elementos luminosos y anulación de señalización permanente mientras este la provisional de obra) con la suficiente antelación, la zona de trabajo sobre la calzada, atendiendo a la norma 8.3.IC., en los casos de calzada con circulación. - Previamente a los trabajos se colocará la señalización de forma que se trabaje bajo la protección de la señalización precedente. Se utilizará para estos trabajos ropa de alta visibilidad. Se ordenará el transito mediante señalistas, si es necesario, dotados con aparatos para comunicarse entre ellos. La retirada de la señalización se realizará en orden inverso a su colocación. - En calzadas sin circulación, pero con tránsito de obra, se señalizarán los trabajos y se usará chaleco reflectante. - Las new-jersey de plástico utilizadas siempre dispondrán de banda reflectante. - Se prohíbe trabajar con la máquina en situación de avería o funcionamiento irregular. - Tan sólo podrán manejar las máquinas el personal adiestrado para este fin.

	- En la zona de trabajo sólo permanecerán los trabajadores implicados en las tareas a realizar.
Caídas al mismo nivel	- Se señalizarán las zonas recién pintadas para evitar resbalones de los trabajadores. - La zona de acopio de pinturas, herramientas y medios auxiliares se mantendrá limpia y ordenada
Carga física: posición	- Cuando la aplicación de la pintura sea directa se adoptarán posturas que eviten la sobrecarga de la columna vertebral, siendo especialmente indicado la flexión y extensión de las piernas.
Contaminantes químicos: gases	- En la utilización de pinturas y disolvente, atendiendo a su naturaleza de tipo químico, se tendrá en cuenta lo especificado por el fabricante en cuanto a su uso y almacenaje, utilizando, en todo caso los equipos de protección individual pertinentes.
Proyección de partículas Exposición a sustancias nocivas	- Todo el personal que trabaje en contacto con pinturas debe hacer uso de guantes y ropa adecuada para evitar el daño a la piel producido por este material. - Si se pulveriza pintura el trabajador debe ponerse de espaldas al viento y cuidar de no manchar a sus compañeros. Especialmente se debe tener cuidado con los ojos.
Temperatura (calor-frío)	- Con relación al riesgo de insolación, deshidratación y golpes de calor se recomienda: utilizar alguna protección para la cabeza, beber abundante líquido, no beber alcohol, utilizar cremas protectoras contra el sol, llevar ropa adecuada y no realizar comidas pesadas. - Limitar el tiempo de exposición del trabajador.

Equipos de protección individual (EPIs)

- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarillas.
- Guantes de protección frente a riesgos químicos.
- Sombrero con visera.
- Chaleco reflectante.

18 Montaje de elementos prefabricados en zonas comunes

Descripción

Esta unidad incluye todos los trabajos de montaje e instalación de los siguientes elementos prefabricados en su disposición definitiva:

- Mostradores
- Asientos
- Señalización
- Etc.

Complementariamente se tendrán en cuenta las medidas preventivas incluidas en los apartados de "Trabajos de albañilería", "Trabajos con hormigón", "Movimiento manual de cargas" y "Movimiento de cargas suspendidas"

Maquinaria empleada

- Herramientas manuales y eléctricas
- Camión con caja basculante
- Camión con grúa
- Dumper

Relación de riesgos previsibles

- Caída de personas al mismo nivel
- Golpes / cortes con herramientas
- Atropello y golpes con maquinaria
- Caídas de objetos en manipulación
- Sobreesfuerzos y manipulación de elementos pesados

Riesgos y medidas preventivas

Caída de personas a mismo nivel	– Los cables de las máquinas se encontrarán correctamente ordenados. – Las zonas de trabajo se mantendrán siempre limpias y ordenadas (acopios, escombros, herramientas).
Golpes / cortes con herramientas	– Las herramientas no podrán lanzarse de un trabajador a otro. – Las herramientas se almacenarán en lugar previsto, con orden y limpieza. – Uso de equipos de protección individual.
Atropello y golpes con maquinaria	– Antes del comienzo de los trabajos de un determinado tajo, se señalizará adecuadamente la zona, y se mantendrá dicha señalización hasta la completa finalización de los mismos. – Dispositivos de señalización (óptica y acústica) en la maquinaria – Inspección previa del terreno y de las óptimas condiciones de la maquinaria
Caídas de objetos en manipulación	– Deberán definirse y aplicarse procedimientos de trabajo adecuados para esta actividad. – Verificar el estado de los dispositivos de seguridad para evitar la salida de la carga. – Colocar señales de advertencia de cargas suspendidas en los accesos a las zonas de maniobra de los equipos de elevación. – Antes de iniciar los trabajos, se asegurará que el responsable de la maniobra disponga de una perfecta visibilidad del proceso y pueda comunicarse de manera permanente con los operarios – Los elementos voluminosos montar se transportarán de manera que el traqueteo, las sacudidas, los golpes o el peso de las cargas no pongan

	en peligro la estabilidad del vehículo, debiendo estar firmemente sujetas las bridas o eslingas a las piezas – Se utilizarán cuerdas o cabos para guiar las cargas suspendidas. – Recibir la formación adecuada para el manejo manual de cargas. – No se circulará bajo el radio de acción de las cargas suspendidas
Sobreesfuerzos y manipulación de elementos pesados	– Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. – Se evitarán posturas forzadas. Si no fuera evitable, se harán descansos. – El personal que realice tareas en posturas forzadas, una vez estudiadas las distintas alternativas técnicas sin poder establecer métodos más saludables, deberá tener formación sobre posturas forzadas y manipulación manual de cargas (MMC), no pudiendo superar los 25 kg de peso en el manejo de cargas manuales.

Equipos de protección individual

- Casco protector
- Protecciones auditivas
- Gafas de seguridad contra impactos.
- Ropa de trabajo (traje de lluvia cuando las condiciones atmosféricas lo hagan necesario)
- Chaleco reflectante
- Guantes de protección frente agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad con puntera y plantilla metálica contra golpes y perforación.
- Mascarilla
- Cinturón antivibraciones

19 General. Instalaciones eléctricas

Descripción

Una instalación eléctrica es el conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica; se incluyen las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica.

El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y sus componentes deberán adaptarse a las condiciones del lugar, de la actividad y de los equipos eléctricos (receptores) a utilizar. Deberán tenerse en cuenta las características conductoras del lugar del trabajo (presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad), la presencia de atmósferas explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos y cualquier otro factor que pueda incrementar el riesgo eléctrico.

Sólo podrán utilizarse equipos eléctricos compatibles con el tipo de instalación eléctrica existente y los factores antes mencionados.

Las instalaciones eléctricas se utilizarán y mantendrán en la forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de protección se controlará periódicamente.

En cualquier caso, las instalaciones eléctricas y su uso y mantenimiento deberán cumplir lo establecido en la reglamentación electrotécnica y en la normativa general de seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo y señalización.

Elemento que intervienen

- Elementos de conducción: alambres o cables de instalación.
- Elementos de consumo: Cualquier equipo, aparato o dispositivo que consuma electricidad. Lámparas, motobombas, ventiladores, etc.
- Elementos de control: Apagadores sencillos, cualquier aparato que permita "prender" o "apagar" cualquier aparato.
- Elementos de protección: Interruptor de seguridad, fusibles, centro de carga.
- Elementos complementarios: cajas de conexión, "chalupas", tornillos.
- Elementos mixtos varios o mixtos: Contactos (se consideran como cargas fijas independientes de que tengan o no conectado a ellos un aparato), barra de contactos con supresor de picos, interruptores termomagnéticos.
- Elementos externos: acometida, medidor.

Factores que influyen en los efectos de la corriente eléctrica

Las dos condiciones necesarias para que se pueda producir circulación de la corriente eléctrica son:

- La existencia de un CIRCUITO CONDUCTOR CERRADO.
- Que en ese circuito exista una DIFERENCIA DE POTENCIAL (tensión o voltaje).
- Por tanto, para que exista circulación de la corriente eléctrica por el cuerpo humano es necesario:
- Que el cuerpo humano sea conductor.
- Que el cuerpo humano forme parte del circuito.
- Que entre los puntos de entrada y salida de la corriente eléctrica exista una
- diferencia de potencial.

Al entrar en contacto con la electricidad se establece una diferencia de potencial entre la parte del cuerpo en contacto y la parte del cuerpo puesta en tierra (normalmente mano-pie). Es lo que llamamos tensión de contacto (U). Esta diferencia de potencial hace que circule una corriente por el cuerpo (I), que se comportará como una resistencia (R). De acuerdo con la Ley de Ohm la intensidad de corriente de paso vendrá dada por la fórmula:

$$I=V/R$$

La intensidad de la corriente que circula por el cuerpo será mayor cuando aumenta la tensión a la que está sometido el accidentado y menor cuando aumenta la resistencia que ofrece el cuerpo al paso de dicha corriente.

Son varios los factores que influyen en la gravedad de los efectos del paso de la corriente por el organismo:

Frecuencia (hertzios): En la industria se trabaja normalmente con corriente alterna de una frecuencia de 50 o 60 Hz (hertzios). La superposición de la frecuencia al ritmo nervioso y circulatorio puede producir espasmos y fibrilación ventricular. Las bajas frecuencias son más peligrosas que las altas frecuencias: valores superiores a 100.000 Hz son prácticamente inofensivos. También existen instalaciones de corriente continua. Esta actúa por calentamiento y, puede producir, a intensidades altas y tiempo de exposición prolongado, embolia o muerte por electrólisis de la sangre.

Intensidad (miliamperios): es la medida de la cantidad de corriente que pasa a través de un conductor. Suele ser el factor determinante de la gravedad de las lesiones: a mayor intensidad las consecuencias son más graves.

Resistencia corporal (ohmios): es muy variable y dependerá mucho de la tensión a la que está sometido y de la humedad del emplazamiento. La piel es la primera resistencia al paso de la corriente y gran parte de la energía eléctrica es usada por ella produciendo quemaduras pero evitando lesiones profundas más graves.

Tensión (voltios): es la diferencia de energía existente entre dos puntos de un circuito eléctrico y que hace que la corriente circule. Las lesiones por alto voltaje tienen mayor poder de destrucción de los tejidos y son las responsables de las lesiones severas; aunque con tensiones bajas también pueden producirse electrocuciones.

Alta Tensión: instalaciones cuya tensión nominal es superior a 1000 voltios en corriente alterna.

Baja Tensión: instalaciones cuya tensión nominal es igual o inferior a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 en corriente continua.

Tensiones de seguridad: son aquellas que pueden ser aplicadas indefinidamente al cuerpo humano sin peligro. Son usadas como medidas de protección contra contactos indirectos en aquellos emplazamientos muy conductores o en herramientas o máquinas con aislamientos funcionales; con lo que les dispensaría de tomar otras medidas preventivas. Estas tensiones de seguridad no exceden los 50 V en corriente alterna o los 75 V en continua.

Tiempo de contacto: es, junto con la intensidad, el factor más importante que condiciona la gravedad de las lesiones.

Recorrido de la corriente: el punto de entrada y de salida de la corriente eléctrica en el cuerpo humano es muy importante a la hora de establecer la gravedad de las lesiones por contacto eléctrico. La gravedad de las lesiones aumenta cuando la corriente pasa a través de los centros nerviosos y órganos vitales, como el corazón o el cerebro.

Factores personales: el sexo, la edad y las condiciones en que se encuentre la persona (estrés, fatiga, hambre, sed, enfermedades, alcohol ingerido, etc.) pueden modificar la susceptibilidad del organismo a los efectos de la corriente eléctrica.

Protección de las instalaciones

Debemos tener en cuenta tanto la protección contra contactos eléctricos directos como indirectos:

- Protección contra contactos eléctricos directos: aquellos en los que la persona entra en contacto con una parte activa de la instalación, que en condiciones normales puede tener tensión (conductores, bobinados, etc.).

  Este contacto implica el paso de cantidades de corriente elevadas, lo que agrava los efectos del choque eléctrico. La protección se consigue mediante alguno de los métodos recogidos en la Instrucción Técnica Complementaria 24 (ITC-BT-24) del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el RD 842/2002, de 2 de agosto (en adelante REBT):
  - Protección por aislamiento de las partes activas.
  - Protección por medio de barreras o envolventes.
  - Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
  - Protección complementaria mediante interruptores diferenciales.
- Protección contra contactos eléctricos indirectos: aquellos en los que la persona entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que, en condiciones normales no debería tener tensión, pero que la ha adquirido accidentalmente (envolvente, órganos de mando, etc.).

En los contactos indirectos sólo una parte de la corriente de defecto circula por el cuerpo humano. El resto de la corriente circula por los contactos con tierra de las masas. Así, cuanto menor sea el contacto de las masas con tierra, mayor será el paso de la corriente por la persona que sufre el contacto.

La protección se consigue con la aplicación de algunas de las medidas recogidas en la ya citada ITC-BT-24:

- Protección por corte automático de la alimentación.
- Protección en los locales o emplazamientos no conductores.
- Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.
- Protección por separación eléctrica.

Relación de riesgos previsibles

- Contactos directos e indirectos.

El Real Decreto 614/2001 establece los requisitos de cada tipo de trabajo partiendo de la evaluación de los riesgos que dicho trabajo pueda suponer y teniendo en cuenta las características de las instalaciones, del propio trabajo y del entorno en el que va a realizarse.

En principio, todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los siguientes casos:

- Las operaciones elementales (por ejemplo, conectar y desconectar) en instalaciones de baja tensión diseñadas para su uso por el público en general. Estas operaciones deberán realizarse por el procedimiento previsto por el fabricante y previa verificación del buen estado del material.
- Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que su identificación sea clara y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura.
- Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, etc.
- Los trabajos en instalaciones, o en su proximidad, cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran.

Riesgos y medidas preventivas

Contactos eléctricos directos e indirectos	– Durante la ejecución de los trabajos en esta fase se emplean máquinas eléctricas, por lo que será obligatorio que estén con marcado CE y en perfecto estado de funcionamiento. – En la labor de probar las instalaciones eléctricas ya montadas se extremarán las precauciones en cuanto a la existencia por desconocimiento de algún circuito cerrado, como también se avisará previamente a todo el personal que pueda estar afectado por el corte o suministro de herramientas eléctricas de la intención de manipular la red. – Estará prohibida la manipulación de cuadros eléctricos por personal no cualificado y no autorizado.

Las cinco reglas de oro

1. **Desconectar.**

- La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de alimentación.
- El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un aislante.
- Los condensadores u otros elementos que mantengan tensión después de la desconexión deberán descargarse.

2. Prevenir cualquier posible realimentación.

- Los dispositivos utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, una señalización para prohibir la maniobra.
- En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando.
- Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse.

3. Verificar la ausencia de tensión.

- La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de dicha verificación.
- Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores (pincha-cables o similares) de forma segura.

4. Poner a tierra y en cortocircuito.

- Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito:
  - En las instalaciones de alta tensión.
  - En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión.
- Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo.
- Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos conductores.
- Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito.
- Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo.

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

- Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el trabajo.

Equipos de protección individual

- Casco dieléctrico
- Guantes de protección frente agresiones eléctricas.

- Calzado de seguridad dieléctricas de puntera y suela reforzada.
- Ropa de trabajo de algodón sin elementos metálicos.

20 General-Trabajos de soldadura

Descripción y procedimiento

Estos trabajos se van a llevar a cabo en las uniones de elementos metálicos. Consiste en unir los dos bornes de una fuente de corriente eléctrica, mediante conductores a la pieza por una parte y por otra al electrodo.

Si no entran en contacto el electrodo y la pieza, el circuito permanece abierto y no hay paso de corriente. Si el electrodo y la pieza entran en contacto, se produce el paso de la corriente eléctrica generándose calor en la zona de peor contacto.

Si se separa unos milímetros el electrodo de la pieza, la corriente se transmite a través del aire, produciéndose un arco eléctrico, fundiéndose el extremo del electrodo, que se transporta a la pieza por medio del arco.

Procedimiento

El procedimiento de soldadura constará de los siguientes pasos:

- Preparación de los equipos de soldadura y del área de trabajo. La superficie donde se ejecutará la soldadura debe estar libre de material inflamable y en orden y limpieza.
- Preparación de los elementos a soldar. Se preparan las superficies que se van a proceder a unir, de tal manera que se limpiarán los elementos a unir, así como se limará uno de los bordes en forma de bisel en los lados que se unirán.
- Unión de piezas de metal para que una correcta sujeción asegure la correcta soldadura.
- Colocación de pinzas de masa a pieza de mayor tamaño a soldar. Eliminando óxido o pintura para que no interfiera el flujo eléctrico y se produzca el arco eléctrico con más facilidad.
- Colocación de la varilla electrodo.
- Se acerca el electrodo a la superficie del metal que se requiere unir.
- Una vez finalizada la soldadura se procede a limpiar la soldadura ya acabada.
- Se aplica la pintura que evite la oxidación y protegerla de la correspondiente corrosión.

Maquinaria y medios auxiliares

- Equipo de soldadura.
- Herramientas auxiliares.

Riesgos más comunes.

- Contactos directos e indirectos
- Arcos voltaicos

- Radiaciones
- Inhalación de gases y vapores nocivos
- Quemaduras
- Incendio/Explosión

Medidas preventivas

- El trabajo de soldadura será realizado por soldadores que cuenten con las acreditaciones formativas de soldador cualificado.
- El área de trabajo deberá estar limpia y despejada de elementos que puedan aumentar la probabilidad de explosión o incendio.
- Es imprescindible que el grupo de soldadura se conecte a un cuadro eléctrico con protección diferencial y magnetotérmica. Además, deberá ponerse a tierra la masa metálica del grupo y deberá existir tapa cubrebornes de las mangueras de entrada y salida. Siempre debe comprobarse el aislamiento perfecto de las bornes de conexión, los cables y las pinzas portaelectrodos.
- No se deberá mover el grupo de soldadura ni cambiar de intensidad sin haber desconectado previamente la conexión eléctrica.
- Debe prohibirse la realización de trabajos de soldadura a una distancia inferior a 1,50 m. de materiales combustibles ni a 6,00 m. de productos inflamables o cuando exista riesgo evidente de incendio o explosión.
- Los electrodos no deben entrar en contacto con la piel del trabajador o con ropa húmeda que cubra el cuerpo, no debiéndose permitir el cambio de electrodos a mano desnuda, o con guantes húmedos y suelo mojado. Nunca se introducirá el portaelectrodo en agua para enfriarlo.

Equipos de protección colectiva

- Mantas ignífugas y mamparas opacas para resguardar de rebotes al personal próximo.
- Porta electrodos completamente aislados.
- Equipos de soldar equipados con dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna)
- Extintor portátil de polvo polivalente ABC.

Señalización y balizamiento:

- Señalización y balizamiento de la zona de actuación mediante (cinta de balizamiento).

Equipos de protección individual

- Ropa de trabajo adecuada (pura lana o algodón ignífugo)
- Guantes, polainas, manguitos y mandiles de cuero
- Calzado de seguridad
- Caretas o pantallas faciales equipadas con filtros ópticos
- Gafas o pantallas faciales contra impactos
- Protección respiratoria (FFP2 o FFP3)

21 General-Manejo manual de cargas

Descripción

Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, particulares dorsolumbares, para los trabajadores.

Riesgos asociados a esta actividad

- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Caída de objetos por manipulación
- Pisadas sobre objetos
- Golpes por objetos o herramientas
- Sobreesfuerzos

Medidas preventivas

Caídas a distinto nivel	- Siempre que durante la actividad se presente este riesgo, el operario deberá contar con la protección colectiva (líneas de vida) o individual (arnés fijado a un elemento de anclaje fuerte) correspondiente.
Caídas al mismo nivel	- Se mantendrá el orden y limpieza en la zona de trabajo.
Caída de objetos por manipulación	- No realizar movimientos bruscos durante la manipulación o transporte de cargas. - No manipular ni transportar materiales de pesos excesivos para la persona. - Antes de levantar la carga, hay que examinarla para detectar esquinas puntiagudas, suciedad, etc., y decidir, según su forma, peso y volumen, el mejor lugar para sujetarla. - Cuando el traslado de estos materiales se tiene que hacer utilizando elementos auxiliares como escaleras, andamios o similares, estos elementos tienen que ser utilizados de forma adecuada. - En el momento de iniciar el levantamiento de la carga, los pies han de estar separados a una distancia equivalente a la anchura de los hombros.
Pisadas sobre objetos	- Se limpiará la zona de trabajo lo antes posible. - Los restos, materiales o herramientas no se dejarán en la zona de trabajo donde puedan interrumpir el paso.

Golpes por objetos o herramientas	- Utilizar las herramientas únicamente para su uso específico. - Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y las medidas de seguridad asociadas. - Antes de utilizar una herramienta, hay que verificar su correcto estado. - Para llevar las herramientas hay que utilizar cajas o maletas portaherramientas, cartucheras fijadas a la cintura o sistemas similares. - El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado para su utilización. Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y afiladas, y con las articulaciones engrasadas. - Se mantendrá una distancia de seguridad alrededor de la herramienta que está siendo utilizada. - Uso de guantes de protección.
Sobreesfuerzos	- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material. Se adecuarán los esfuerzos al estado físico y a la condición del trabajador. - Como norma para levantar cargas, se debe realizar mediante el esfuerzo de los músculos de las piernas, estando la carga durante el transporte lo más cerca del cuerpo posible. - No se manipularán nunca pesos superiores a 25 (veinticinco) Kg si es de forma continuada, y nunca más de 40 (cuarenta) Kg. Se evitarán posturas forzadas, si no fuera evitable se harán descansos.

Proceso para un correcto levantamiento de cargas

Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad de la persona debe estar lo más próximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga.

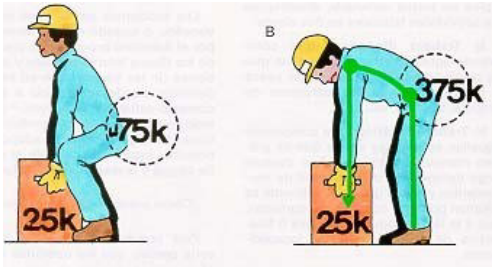

El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si los pies están bien situados:

- Enmarcando la carga
- Ligeramente separados
- Ligeramente adelantado uno respecto del otro.

Para levantar una carga, el centro de gravedad del operario debe situarse siempre dentro del polígono de sustentación.



Técnica segura del levantamiento:

- Sitúe el peso cerca del cuerpo.
- Mantenga la espalda plana.
- No doble la espalda mientras levanta la carga.
- Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma de cargas.
- Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles.
- Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o desequilibrada. - Conviene preparar la carga antes de cogerla.
- La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que estorbe lo menos posible al andar natural.
- En el caso de levantamiento de un bidón o una caja, se conservará un pie separado hacia atrás, con el fin de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule.

- Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos extendidos, no flexionados.



- Use los músculos más fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos.

- Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los músculos de todo el cuerpo. Para sentir un objeto al cogerlo lo correcto es hacerlo con la palma de la mano y la base de los dedos. Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de asirlos, prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas correctamente. Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada.

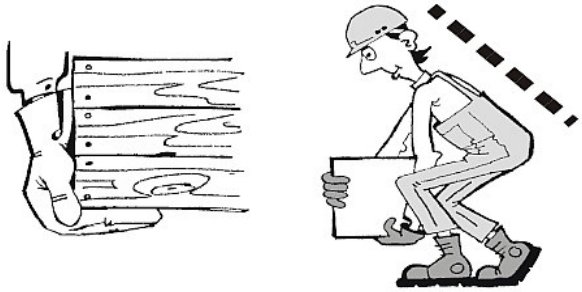

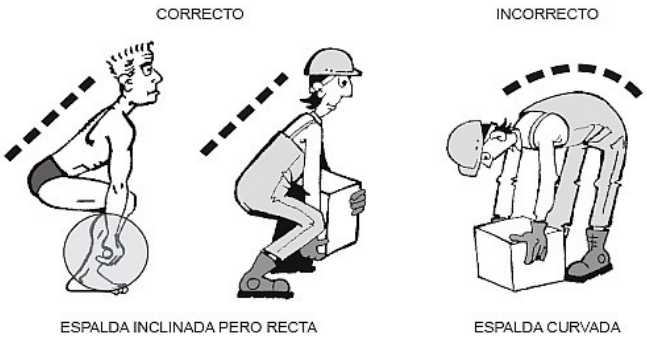

En caso de tener que rotar el tronco, se descompondrá el movimiento en dos:

- Primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños movimientos.
- O bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha que luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo.
- Utilizaremos los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los talones, pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un ángulo de más de 90º)

El peso del cuerpo puede ser utilizado:

- Empujando para desplazar un móvil (carretilla, por ejemplo), con los brazos extendidos y bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil.
- Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo.

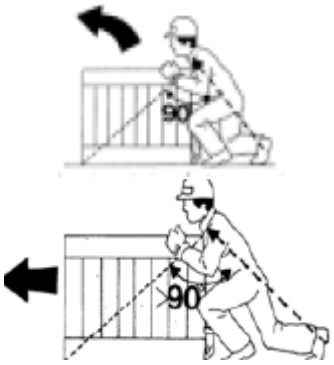

- Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla.

- Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída.
- Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben encadenarse las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para despegarla del suelo.

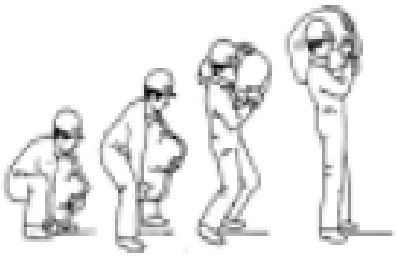

- Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deben excluir la improvisación, y a que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios. Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá a tender a:
    - La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de porteadores precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir.
    - La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra.

- La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a realizar, posición de los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.)
- La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga entre las personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha).
- El transporte se debe efectuar:
- Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado del de delante, para facilitar la visibilidad de aquél.
- A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga.
- Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la operación), quién dé las órdenes preparatorias, de elevación y transporte.



Equipos de protección individual

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de protección
- Chaleco reflectante.
- Arnés de seguridad (en caso de trabajos en altura).

22 General. Transporte y acopio de materiales

Descripción y procedimiento

Transporte de materiales hacia y desde zona de actuación mediante camión de transporte

La zona de acopio estará ubicada de forma que sea accesible para la carga y descarga de camiones.

Maquinaria y medios auxiliares

- Camión de transporte.
- Carretilla manual
- Pala cargadora

Identificación de riesgos

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de cargas en suspensión*
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Atrapamiento por y entre objetos.
- Sobreesfuerzos.

Normas preventivas

Caída de personas a distinto nivel	- Delimitación de las zonas a diferente altura con vallas o barandillas.
Caída de personas al mismo nivel	- Mantener la atención en los desplazamientos, evitando distracciones y prisas que puedan provocar un accidente. - Se mantendrá el orden y limpieza en el tajo.
Pisadas sobre objetos	- Durante el desembalaje de los equipos/elementos de la obra, los desechos deben liberarse según se producen, apilándolos y separándolos de la zona de desembalaje para evitar caídas del personal al tropezar con ellos accidentalmente. - Se mantendrá el orden y limpieza en los recorridos internos de la obra.
Golpes por objetos o herramientas	- Las herramientas serán utilizadas por trabajadores especializados. - Contarán con CE correspondiente. - Se mantendrá una distancia de seguridad con los tajos en los que se esté empleando una herramienta.
Atrapamiento por y entre objetos	- Las operaciones de movimiento de tierras en general se tienen que realizar de acuerdo con los criterios definidos por el estudio geotécnico del proyecto, el proceso constructivo propuesto por el proyecto y el estado del terreno en función de las condiciones climatológicas. - La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos a las personas . Se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas: - Los objetos deben estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas. - La forma y dimensiones de los objetos deben facilitar su manipulación. La base de apoyo de los objetos debe ser estable. - El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de los objetos. - El nivel de iluminación debe ser el adecuado para cada puesto de trabajo. - Utilizar siempre que sea posible medios auxiliares en la manipulación manual de objetos.
Pisadas sobre objetos	- Mantener las zonas de circulación y las salidas convenientemente señalizadas y libres de obstáculos (cajas, herramientas...) respetando la anchura de los mismos para prevenir los golpes contra objetos y las caídas. - Mantener en todo momento el orden y la limpieza en los locales donde se realice cualquier tipo de tarea. Recoger toda la herramienta y el material al

	finalizar la jornada. Depositar las basuras y desperdicios en recipientes adecuados. - Eliminar con rapidez las basuras y los desperdicios generados colocándolos en recipientes adecuados. Cuando sea necesario, señalizar la zona afectada para evitar el tránsito de personas hasta la definitiva limpieza del espacio afectado y/o retirada de los objetos existentes. Las operaciones de limpieza no deberán constituir una fuente de riesgo, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. - Si la iluminación es insuficiente, hacer uso de medios auxiliares y comunicar dicha situación para proceder a su corrección.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas	- Si los elementos a transportar pesan más de 15 Kg. se deberá hacer uso de un medio auxiliar mecánico para el transporte de cargas. - Especial cuidado en el uso de la carretilla manual. Se deberá cumplir con las medidas preventivas que se incluyen en el capítulo "Medios Auxiliares" carretilla manual.

- Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas:
  - No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado.
- En los acopios de tubos, elementos prefabricados y ferralla se observarán las siguientes normas de seguridad:
  - El acopio de tuberías o marcos se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, empleando para ello calzos preparados al efecto para los tubos. El transporte se realizará empleando útiles y medios auxiliares adecuados que impidan el deslizamiento y caída de los elementos transportados. Estos útiles se revisarán periódicamente, con el fin de garantizar su perfecto estado de empleo.
  - La ferralla se acopiará junto al tajo correspondiente solamente aquella que se va a utilizar en el día, evitando que haga contacto con suelo húmedo para paliar su posible oxidación y consiguiente disminución de resistencia.
- Los acopios de pintura y combustible se observarán las siguientes normas de seguridad:
  - Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos deberán disponer de filtros respiratorios.
  - Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional.

- Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en estos temas.

El acopio de estos elementos deberá hacerse de forma racional, minimizando los desplazamientos y evitando provocar obstáculos y peligros innecesarios a la circulación. Se ha incluido en el plano "Organización de obra" de este Estudio la localización de esta zona de acopio de material.

Protecciones colectivas

- Vallado y delimitación de la zona de acopio.
- Extintor en la zona de acopio.

Señalización y balizamiento

- Cartel de normas de seguridad en el acceso a la zona de acopio y prohibición de entrada a personal ajeno a la obra

23 Trabajos con riesgo especial- Movimiento de cargas suspendidas

Descripción

Las operaciones de manipulación de cargas pesadas se realizarán siempre bajo la vigilancia, control y supervisión de una persona competente.

Se decide realizar un análisis particular de las medidas preventivas a tener en cuenta para todos los izados de cargas con medios mecánicos que se realicen en la obra. Asimismo, se establecerán diferentes condiciones en relación a la viabilidad de los medios mecánicos a emplear.

Como punto de partida, los camiones autocargantes sólo se emplearán para carga y descarga, en cumplimiento del R.D. 837/03. Únicamente se podrán emplear para colocar cargas en el espacio equipos de elevación de cargas si existe un manual del fabricante que autorice ese uso y cumplen el R.D. 837/03.

Se llevarán este tipo de actuaciones en los trabajos de instalación de arquetas y hornacina prefabricada de hormigón.

Maquinaria y medios auxiliares:

- Camión grúa.
- Grúa móvil autopropulsada
- Accesorios y aparejos de elevación.

Identificación de riesgos especiales

Durante las tareas de izado de cargas con medios mecánicos estará siempre presente un recurso preventivo que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas y compruebe su eficacia, además del jefe de maniobras que supervise y dirija las operaciones de izado de cargas.

Medidas preventivas

Ante estos trabajos, el Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra desarrollará de los trabajos descritos anteriormente, al menos, los siguientes aspectos:

- Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y accesorios de izado que se empleen deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de modo que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado.
- Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar accidentes por interferencias.
- Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán debidamente y el paso a través de ellas quedará prohibido.
- Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de seguridad…) serán objeto de revisión diaria mediante la que se garanticen adecuadas condiciones de conservación y mantenimiento. Estas revisiones se justificarán de forma documental y se registrarán debidamente.
- En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre.
- En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo mediante el que se desarrollen los trabajos de izado de cargas.
- Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras previamente designado. Tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las labores de estrobaje y de señalización dispondrán de una formación adecuada y suficiente para los trabajos a desempeñar.
- Las diferentes piezas contarán con los elementos auxiliares apropiados de transporte y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje.
- Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la carga, ni en su radio de acción (zona de influencia).
- No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Para ello, se acotarán debidamente las zonas de batido de cargas de manera que no haya presencia en la misma de trabajadores no autorizados.
- Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad.
- Se verificará la correcta colocación y fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el proceso, se descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder continuar con la operación en condiciones seguras.
- Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún gancho de seguridad no funciona correctamente, se le comunicará de inmediato al responsable, parando éste los trabajos hasta que no se sustituyan los útiles afectados por otros que funcionen correctamente.

- En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma de cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser izada y no sean los pestillos los que soporten dicha tensión.
- El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que no formen parte del elemento a elevar.
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
- Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente certificados y se emplearán conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado y autorizado.
- El responsable del izado de cargas deberá ver en todo momento la carga, y si no fuera posible, las maniobras serán realizadas con un guía destinado a ese trabajo.
- No se transportarán cargas por encima de los trabajadores.
- No se guiarán las cargas con la mano cuando estas estén izadas. Para su dirección se emplearán cabos de gobierno.
- En las zonas de acopios, se instalarán señales de riesgo de cargas en suspensión, y en todas las zonas de izado de cargas, ya sea en acopios o en tajos, se dispondrá de una señalización e iluminación necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. Ante nieblas densas se paralizarán los trabajos de izado de cargas.
- Ante la existencia de trabajos de izado de cargas en presencia de líneas eléctricas deberá atenderse a lo analizado en el Tratamiento de los servicios afectados del Estudio, teniendo presente que todo parte del estudio de gálibos que debe desarrollar la empresa contratista en su Plan de Seguridad y Salud.
- En zonas de acopios de materiales, se instalarán barandillas de protección en los pasillos habilitados para los trabajadores, con el fin de separarlos de los equipos de izado de cargas.

Protecciones colectivas

- Las propias protecciones de la maquinaria

Señalización y balizamiento

- Señalización informativa de aviso de cargas suspendidas.
- Señalización y balizamiento de las zonas de exclusión.

Equipos de protección individual

- Guantes de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Casco protector de la cabeza
- Chaleco reflectante.

24 Trabajos con riesgo especial. Trabajos en altura

Descripción

Se consideran trabajos en altura todos aquellos, sea cual sea la naturaleza, en los que el punto de operación está situado a una altura mínima sobre el suelo de 3,5 m y requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador.

Las medidas preventivas expuestas en esta ficha son de aplicación en todas las actividades evaluadas en fichas anteriores que impliquen trabajos en altura.

Posibles áreas afectadas

Antes del inicio de los trabajos, el trabajador designado como Recurso Preventivo deberá realizar una inspección visual del entorno de la zona en la que se realizarán dichos trabajos, con objeto de detectar posibles interferencias de las tareas a ejecutar.

En caso necesario, el Recurso Preventivo decidirá las medidas adicionales que deberán tomarse para evitar posibles riesgos generados por dichas tareas que puedan afectar a personas ajenas a las mismas (señalización, delimitación de la zona de trabajo, etc.).

En esta obra los trabajos en altura tendrá lugar durante el montaje y desmontaje de los equipos y conductos, en trabajos de albañilería en falsos techos y en la renovación del pavimento en la cubierta transitable. En esta última actividad se indica la instalación de una línea de vida en caso de no resultar posible la colocación de barandillas de protección ancladas al peto de la fachada.

Riesgos asociados

- Caída de personas y materiales.
- Vuelco / deslizamiento de los medios auxiliares empleados
- En el caso de uso de vehículos (camión con canastilla), además:
- Golpes y atropellos a terceras personas.
- Contacto eléctrico.

Medias de prevención y protección

Recomendaciones generales:

Siempre que se esté desarrollando un trabajo en altura (es decir, aquellos trabajos en los que el punto de operación esté situado a una altura mínima sobre el suelo de 3,5 m) se debe utilizar casco de protección para uso industrial. Además, se deberá acordonar y señalizar la zona situada bajo el emplazamiento del trabajo así como sus inmediaciones (zona limítrofe) para evitar riesgo de golpe por caída de objetos sobre las personas.

Se deberá contar con emisoras, para garantizar la comunicación entre el personal que realiza el trabajo en altura y el que permanece en el suelo.

Siempre que sea posible, se deberá:

- Contar con protección perimetral. En esta obra
- Utilizar, por parte del trabajador, arnés de seguridad anclado a un punto fijo cuando no exista otra protección o cuando persista el riesgo de caída por falta de estabilidad de la plataforma de trabajo, escalera o andamio. (La longitud del elemento de unión entre el punto fijo de anclaje y el arnés debe ser inferior a la altura de caída existente).

Escaleras de mano:

Colocación:

- Las escaleras de mano se apoyarán en superficies planas y resistentes.
- En la base se dispondrán elementos antideslizantes (zapatas).
- Las escaleras de mano simples se colocarán:
    - Formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.
    - Con los largueros sobrepasando 1 metro el lugar de acceso.

Número de personas: Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.

Condiciones de utilización:

- Podrán utilizarse siempre que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que no se puedan modificar.
- Para trabajos en los que el punto de operación se encuentre a más de 3,5 metros de altura:
    - Es recomendable usar abrazaderas adecuadas en la parte superior de la escalera, siempre que sea posible.
    - Si se van a realizar movimientos peligrosos para la estabilidad del trabajador, hay que usar arnés de seguridad anclado a algún punto estable que no sea la propia escalera.

Utilización/Subida/Bajada:

- Limpiarse la suela de los zapatos de grasa, aceite o cualquier sustancia deslizante antes de subir, utilizando papel secante o similar.
- El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano se hará con las manos libres, de frente a la escalera y agarrándose a los peldaños y no a los largueros.
- No se debe subir nunca por encima del quinto peldaño o 1 metro contado desde arriba (dejar cuatro peldaños libres por encima del apoyo de los pies).
- Mantener el cuerpo siempre dentro de los largueros de la escalera.
- No mover una escalera manual estando el trabajador sobre ella.
- No se debe trabajar desde una escalera simple de mano más que con herramientas que puedan ser fácilmente manipuladas con una sola mano.
- Las escaleras metálicas son conductoras de electricidad y no deben usarse cuando se trabaje con equipos eléctricos.

Conservación:

- Para evitar cualquier tipo de accidente que pueda causar una escalera de mano, es fundamental conservar su buen estado, para lo cual se revisarán periódicamente retirando las que están en mal estado.
- Evitar por todos los medios pintarlas o someterlas a tratamientos que impidan descubrir fácilmente sus defectos.

Andamios sobre ruedas

- Antes de su primera utilización se realizará un reconocimiento de cada uno de los elementos que lo componen.
- Se prohíbe subir a/ o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
- Se prohíbe usar ladrillos, bidones, cajas, etc., para nivelar las borriquetas. Usar maderas como apoyo.
- La plataforma tendrá un ancho mínimo de 60 cm. (3 tablones de madera o 2 plataformas metálicas) si sólo se utiliza para sostener personas y no materiales, siendo de 80 cm. si se usa para ambos.
- No sobrecargar el andamio y distribuir las cargas uniformemente en la plataforma.
- Se prohíbe el uso de andamio de ruedas para trabajos a alturas superiores a 1,5 metros desde el suelo a la plataforma.

Antes del inicio de los trabajos, comprobar:

- La distancia entre la plataforma y la pared de trabajo es igual o menor de 25 cm. para evitar caídas de personas por el interior del andamio.
- Repartir los materiales sobre las plataformas, sin sobrecargarlas ni flexionarlas.
- Mantener siempre el estado de orden y limpieza en el andamio, así como en la zona inferior del mismo.
- No se permite saltar del andamio a las plataformas cercanas (o al revés)
- En trabajos con posible caída de materiales (como la elevación de materiales a la plataforma del andamio), no permitir que otras personas trabajen o circulen por debajo. Colocar protecciones, indicaciones, cintas, etc.

Arneses y sistemas anticaídas:

Existen tres elementos esenciales a considerar en la composición de un sistema anticaídas:

- Arnés de seguridad.
- Dispositivos de unión.
- Anclajes.

Arnés de seguridad

- Los arneses de seguridad (EN 361) y sistemas anticaídas asociados han de ser usados en varias ocasiones (por ejemplo en la reparación del pavimento exterior de la cubierta .), bien como protección complementaria, o bien como equipo de protección único.
- El arnés siempre se debe ajustar a las características físicas de la persona que lo use, con independencia del tiempo de utilización.
- El arnés debe ajustarse al trabajador de tal manera que permita la libertad de movimientos.
- La línea de vida deberá anclarse al arnés SIEMPRE en alguno de los mosquetones dorsales o pectorales, NUNCA en los laterales.
- La línea de vida se debe fijar en un punto de anclaje superior y debe estar equipada, con un tope final de forma que el dispositivo anticaídas NO se salga involuntariamente de la línea de anclaje.

- Si el dispositivo anticaídas deslizante posee un bloqueo manual, el extremo inferior de la línea debe asegurarse mediante un terminal inferior manufacturado fijo o mediante un lastre, para facilitar el funcionamiento.

Dispositivos de unión

- No exponer las cuerdas cintas y arneses a los efectos nocivos de los procesos de soldadura, del sol, del polvo ni de otros agentes agresivos innecesariamente.

Recomendaciones generales

- Se debe usar permanentemente el equipo de protección durante todo el tiempo que dure el trabajo a realizar.
- Se han de evitar desgastes del equipo y en particular:
    - Contactos y frotamientos con aristas o superficies rugosas.
    - Contactos con superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar los mecanismos.
- Señalizar en el equipo cualquier anomalía, no volviendo a utilizar ningún equipo que haya soportado una caída. Los arneses que hayan soportado una caída deberán ser destruidos. El anticaídas, en este caso, será sometido a una revisión exhaustiva.
- Todos los elementos de cada equipo deberán utilizarse, en cada ocasión, por una única persona, en ningún caso se deberán compartir elementos durante la realización de los trabajos.
- Después de su uso, secar el equipo si es necesario y guardarlo protegido de la humedad, luz y posibles agresivos.

Situaciones en que se recomienda su uso:

- Siempre que no se elimine en su totalidad el riesgo de caída a distinto nivel mediante la colocación de protecciones colectivas.
- Durante el montaje e instalación de protecciones colectivas.

<u>Equipo de anclaje:</u>

Cables y eslingas

- Deben llevar indicado el valor de su carga máxima en lugar bien visible. En caso contrario, no se utilizarán.
- Se recomienda usar eslingas planas de banda textil, en lugar de cables de acero, siempre que esta sustitución sea posible.
- Estas eslingas deben llevar una etiqueta en la que conste:
    - Material del que está fabricado.
    - Carga máxima de utilización.
    - Nombre del fabricante.
    - Fecha de fabricación.
- Toda eslinga que se ensucie o impregne de cualquier producto durante su uso, deberá lavarse inmediatamente con agua fría.

- Las gazas en los cables de acero que se ejecuten con perrillos, deben disponerse de forma que la cogida se realice con 3 perrillos al menos y dirigidos todos hacia el mismo lado.



- Desechar y destruir los cables que estén en mal estado, alargamiento anormal, hilos rotos, cocas, óxido, etc., en un 10% del mismo.
- Desechar y destruir las eslingas de Nylon que no tengan marcada la carga de trabajo o estén muy desgastadas, cortadas, etc.

Sistema retráctil:

- Antes de la utilización del sistema retráctil, verificar que se ha sometido a revisión.
- Se recuerda en la utilización del sistema retráctil que el peso máximo que soporta es de 100 kilos.

Puntos de Anclaje

Los puntos de anclaje en los que se asegura la línea de vida deben:

- Ser capaces de mantener el peso del trabajador y la fuerza adicional generada en el supuesto de caída.
- Reducir la caída libre a la distancia más corta posible.
- Estar situados por encima o en frente del trabajador y separados del soporte principal.
- Sostener la línea de vida de forma segura hasta que se tenga que quitar.
- Debe comprobarse siempre la solidez de los anclajes, debiendo ser su resistencia en carga superior a 5000 kg.
- Colocar protectores en todos los bordes afilados, de tal manera que no deterioren la cuerda.
- No utilizar como anclaje tuberías, antenas y conductos o cables eléctricos.
- Los peldaños de la escalera, barandillas o pasamanos, no son aceptables como anclaje. Usar un punto de anclaje que no tenga obstáculos debajo, sobre los cuales podría golpearse en caso de sufrir una caída.

Líneas de vida

La adopción de sistemas de línea de vida y arnés de seguridad frente a los riesgos de caída de altura únicamente se adoptarán cuando se haya justificado debidamente la improcedencia o incapacidad de adopción de protecciones colectivas. El contratista deberá presentar esta justificación al Coordinador de seguridad y salud. El sistema auxiliar de línea de vida o puntos de anclaje para la utilización de arnés de seguridad frente al riesgo de caída de altura deberá estar definido y calculado en un proyecto técnico. Este proyecto técnico concretará:

- La descripción y los cálculos justificativos del sistema.
- El procedimiento de montaje y desmontaje.
- Las normas de utilización.

- El montaje será realizado bajo la supervisión de un técnico competente que emitirá un certificado de montaje del mismo. El certificado de montaje deberá ser presentado al Coordinador de seguridad y salud de forma previa a la utilización del sistema.
- La línea de vida deberá instalarse, siempre que resulte posible, por encima del centro de gravedad del trabajador.
- Las líneas de vida se instalarán preferentemente en horizontal. En caso de ser necesaria la instalación con pendiente, el elemento que deslice sobre la línea de vida deberá estar provisto de un dispositivo de bloqueo automático.

Todos los elementos que componen las líneas de vida instaladas en obra, así como el sistema de línea de vida en su conjunto contarán con un cálculo llevado a cabo por un técnico capacitado para ello.

Previo a la utilización de la línea de vida un técnico responsable certificará su correcto montaje. Cuando los equipos utilizados para la instalación no estén cubiertos por los requisitos establecidos en las Normas EN 354, EN 355 y EN 360, se realizarán ensayos sobre los mismos. A la hora de planificar el montaje de una línea de vida se consideraran para su dimensionamiento y montaje las siguientes exigencias:

- Para el cálculo de las cargas que actuarán sobre la línea de vida se tendrá en cuenta el número de trabajadores que utilizarán dicha protección simultáneamente, debiendo de considerarse que la línea de vida no será utilizada por más de dos personas simultáneamente.
- Para el cálculo se tendrá en cuenta la energía que la línea de vida soportará en función del desplazamiento o altura de caída que experimente el trabajador hasta su completa sujeción, considerando en este desplazamiento la deformación que experimente la línea de vida.
- Para evitar daños a los trabajadores, la energía que soportará el cuerpo de cada trabajador no será nunca superior a los 600 Julios, por lo que se tendrá en cuenta la instalación de elementos absorbedores de energía.
- La instalación de las líneas de vida será horizontal o formando un ángulo máximo de 15 grados, dicha situación ha de ser tenida en cuenta para el cálculo de los anclajes de la línea de vida.
- Para la ubicación de la línea de vida se dispondrá siempre que resulte posible por encima del trabajador.

En el caso de utilizar elementos auxiliares tales como enrolladores o cuerdas auxiliares se ha de tener en cuenta la longitud total del elemento para el cálculo de la energía de caída. En todo caso la energía de caída será inferior a la que el trabajador pueda admitir. Por otra parte se comprobará que la longitud de los elementos de amarre no permita que el trabajador golpee con otros elementos o supere la altura con respecto del suelo durante la caída.

Cuidado e inspección de los equipos

Los equipos defectuosos deben ser reemplazados inmediatamente. Antes de su utilización se debe:

- Inspeccionar todo el equipo de protección contra caídas.
- Verificar el estado de las cintas y costuras así como el buen funcionamiento de las hebillas de cierre.
- Cualquier equipo que haya sufrido el impacto de una caída debe ser destruido.
- Revisar si las cuerdas tienen algún desgaste, fibras rotas, costuras sueltas o si están descoloridas. En este caso, deberán ser eliminadas.
- Los mosquetones y ganchos deben poder abrirse y cerrarse sin ningún problema.

- Revisar que no haya daños causados por fuego, ácidos u otros corrosivos.

Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.

La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá las siguientes condiciones:

- El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).
- Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.
- La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.
- Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.
- El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.
- Los trabajadores afectados deberán disponer de una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, destinada, en particular, a:
  - Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.
  - Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
  - Los sistemas de sujeción.
  - Los sistemas anticaídas.
  - Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
  - Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
  - Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

APÉNDICE 2: FICHAS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD P.O. 74.24 "ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Autor: Dña. Cristina Cobalea Medina

Ingeniero Industrial- Nº Col: 980

1 Carretilla de mano

Descripción

Equipo de trabajo consistente en un recipiente de forma prismática al que se le ha colocado una rueda en su parte anterior y mangos en la posterior. Se emplea para el transporte de materiales.

Relación de riesgos

- Golpes contra objetos inmóviles.
- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

- Utilizar ruedas de goma.
- Es necesario que el usuario de la carretilla de mano la conduzca a una velocidad adecuada.
- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.
- Prohibir el transporte de personas.
- No sobrecargar la carretilla
- Distribuir homogéneamente la carga y, si fuese necesario, atarla correctamente.
- Dejar un margen de seguridad en la carga de materiales líquidos en la carretilla para evitar vertidos.
- Velar por que la rueda neumática disponga en todos los casos de la presión de aire adecuada.

Equipos de protección individual

- Botas de seguridad.
- Chaleco/ropa alta visibilidad.
- Casco de protección frente a riesgos mecánicos.
- Guantes de protección.

2 Eslingas, cables y ganchos

Descripción

Medios auxiliares necesarios para la elevación y sustentación de cargas por medios mecánicos.

Relación de riesgos

- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.

Riesgos y medidas preventivas

- No se debe superar nunca la carga máxima de los elementos. Si se desconoce, comenzar siempre el izado de manera lenta, manteniendo la carga cercana al suelo durante unos instantes antes de continuar el izado. Informarse lo antes posible de la carga máxima, o sustituir los elementos por otros que ofrezcan esa garantía.
- Para estar del lado de la seguridad, debemos emplear un coeficiente de seguridad de 6 para el empleo de cables. (Ejemplo: para una carga máxima del cable de 6000 Kg., el peso máximo a elevar es de 1000 Kg.).
- No emplear elementos que se vean viejos o deteriorados como ganchos torcidos o rectificados, braga de tela deshilachada, cables pelados, etc.
- Los ganchos empleados en esta obra deben contar con pestillo de seguridad.
- Debe revisarse estos elementos frecuentemente y siempre antes de su uso.
- Se deben desechar cables o ganchos oxidados.
- En la ejecución de la gaza de la eslinga con perrillos debe hacerse teniendo en cuenta lo siguiente:
- Todos los perrillos deben amarrarse por el mismo lado del cable, estando colocadas las roscas por el lado del cable largo.
- Nunca debe hacerse trabajar una eslinga con un ángulo mayor de 90º.
- Para confeccionar eslingas deben emplearse cables muy flexibles, por ello no deben emplearse cables con alma metálica, sino aquellos que tienen alma de fibra. Los que tienen alma metálica pueden romperse por la flexión a la que se les sometería.
- Nunca deben emplearse redondos de ferralla para sustituir a las eslingas.
- Debe tenerse cuidado de que la eslinga quede bien asentada en la parte baja del gancho.
- No deben cruzarse eslingas unas sobre otras, porque podría producirse la rotura de la queda aprisionada.
- Se debe prestar especial atención a los puntos de agarre de la carga.
- Si la carga no tiene puntos de agarre habrá que embragarla. En este caso se debe tener especial cuidado de que las aristas vivas no dañen la eslinga. Para ello, una medida útil puede ser cubrir la arista con paños, plásticos, etc.

Equipos de protección individual (EPI)

- Botas de seguridad.
- Casco de protección frente a riesgos mecánicos.
- Chaleco reflectante y ropa de alta visibilidad.
- Guantes de protección

3 Escalera manual

Descripción

Escaleras rectas transportables, constituidas por dos travesaños paralelos y peldaños equidistantes, empleadas para trabajos en altura en los que no sea posible utilizar plataformas de trabajo.

Se restringirá el uso de escaleras de mano en los casos en los que no sea técnicamente posible el establecimiento de otros medios auxiliares, cuando el montaje de los medios auxiliares suponga un mayor riesgo que el uso de las escaleras o cuando el trabajo sea de corta duración o una emergencia.

Dicho uso deberá estar justificado técnicamente por la imposibilidad de emplear otras plataformas de trabajo seguro como:

- Andamios.
- Escaleras de mano tipo "faraone".
- Borriquetas.

Antes de la utilización de las escaleras se deberá solicitar la autorización de uso de las mismas. Todas las escaleras deberán cumplir con la UNE-EN-131 y deberán venir marcadas.

Relación de riesgos

- Caídas a distinto nivel.
- Golpes por objetos y herramientas.
- Sobreesfuerzos.

Riesgos y medidas preventivas

- Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo necesarios para que su utilización no suponga riesgo de caída. Su estabilidad quedará garantizada en la base y, en su caso, en la parte superior (sujeta al paramento). Se deben utilizar escaleras de mano con calzos antideslizantes y antivuelco.
- Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas (pallets, maderas, etc.).
- Las escaleras se deben colocar formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal.
- Los largueros deben sobrepasar, en al menos un metro, el borde superior de la superficie a la que se acceda.
- No se debe superar el peso máximo previsto por el fabricante. Al ser el peso máximo un dato normalmente desconocido en obra se tomará como precaución el que no se utilice la misma escalera dos personas a la vez.
- El trabajo a más de 3,5 metros de altura, que requieran movimientos o esfuerzos que pongan en peligro la estabilidad del trabajador sólo se realizará si se utiliza arnés de seguridad.
- No se emplearán escaleras de madera pintadas, por la dificultad que supone la detección de sus posibles defectos.

Equipos de protección individual (EPI)

- Arnés de seguridad en trabajos a más de 2 metros.
- Botas de seguridad.
- Casco de protección frente a riesgos mecánicos.
- Chaleco reflectante y ropa de alta visibilidad.
- Guantes de protección.

4 Andamios sobre ruedas

Descripción

Equipo de trabajo formado por una estructura provisional móvil, que sirve para el sostén de una plataforma de trabajo, por lo que se facilita así la ejecución de trabajos en lugares de difícil acceso. La movilidad la proporcionan las ruedas, que permiten desplazar el andamio por la zona de trabajo.

Riesgos y medidas preventivas

Caída de personas a distinto y mismo nivel	- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura, cuando el uso del andamio no exija el almacenamiento de materiales (Para este caso el mínimo de plataforma son 90 cm), siempre que no existan aberturas con riesgo de caída y la superficie será de material antideslizante. - Cuando el acceso o el descenso se realicen con caída de 3,5m de altura hasta el suelo, se realizarán con un elemento de protección anticaídas fijado o se instalarán escaleras incorporadas al propio andamio, mediante la utilización de plataformas con trampilla.
Caída de objetos por manipulación.	- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.
Golpes contra/por objetos o herramientas	- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
Atrapamientos	- Las plataformas de trabajo cuando la caída sea mayor de 2m, se limitarán en su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de alto, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Deslizamientos	- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición. - Los módulos de base de los andamios tubulares se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas (tacos de madera o durmientes) en cualquier caso (tanto si es apoyo directo sobre el terreno como si es sobre soleras o aceras). - Se prohíbe subir a/ o realizar trabajos apoyados sobre las plataformas de andamios sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.
Vuelcos	- En la base y a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal, para seguridad y hacer el conjunto indeformable y más estable. - Los módulos de fundamento de los andamios tubulares estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
Roturas	- Todos los andamios permanecerán en buen estado llevando un mantenimiento constante de ellos.

Equipos de protección individual (EPI)

- Casco de seguridad de polietileno (opcional con barbuquejo).
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Arnés de Seguridad.

5 Transpaleta manual

Descripción del equipo:

El transpaleta manual es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo, equipada con una horquilla formada por dos brazos paralelos horizontales unidos sólidamente a un cabezal vertical provisto de ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo, y que puede levantar y transportar paletas o recipientes especialmente concebidos para este uso.

El peso propio oscila entre los 60 y los 90 kg, con una capacidad nominal de carga que va desde los 1.000 a los 3.000 kg

Identificación y evaluación de riesgos

- Caída al mismo nivel
- Caída de objetos desprendidos o en manipulación
- Golpes y cortes por objetos/herramientas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Accidentes con máquinas/vehículos
- Sobreesfuerzos

Procedimientos preventivos:

Normas de funcionamiento:

- El chasis de la transpaleta en posición de trabajo, que deja las horquillas a 85 mm de altura sobre el suelo, se introduce bajo la paleta o carga unitaria a elevar
- A continuación, situando el mando de válvulas en la posición elevación y mediante el movimiento alternativo de la barra de tracción, se acciona la bomba de elevación de una forma variable.
- En esta posición la paleta y su carga son transportadas y guiadas mediante la barra de tracción sobre la que el operario realiza la tracción.
- Una vez efectuado el recorrido, la operación de descenso se realiza normalmente por control manual mediante una palanca situada en el extremo superior de la barra de tracción.
- Comprobaciones previas al levantar la carga:
- Que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta; para evitar sobrecargas es conveniente que el sistema hidráulico de elevación lleve una válvula limitadora de carga que actúe cuando el peso de la paleta cargada supere la capacidad de carga de la máquina.
- Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar y que está en buen estado.
- Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.
- Comprobar que la longitud de la paleta es mayor que la longitud de las horquillas, ya que los extremos de las mismas no deben sobresalir porque podrían dañar otra carga o paleta; no sería posible dejar dos paletas juntas por la testa y posiblemente los rodillos no quedarían libres por la parte inferior de la paleta, con lo que al elevarla se produciría el desclavado del travesaño inferior co rrespondiente.
- Introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el fondo por debajo de las cargas, asegurándose que las dos horquillas están bien centradas bajo la paleta.

- Evitar siempre intentar elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla.
- Normas de circulación:
- El operario habilitado para el manejo de la transpaleta deberá seguir una serie de normas de conducci ón y circulación que se exponen a continuación:
- Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la p osición neutra o punto muerto; el operario avanza estirando del equipo con una mano estando situado a la derecha o izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del operario y la barra de tracción constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado durante el transporte.
- Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.
- Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente.
- Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa controlando su estabilidad.
- No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.
- No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con grasa.
- Se deben observar las
  señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los itinerarios fijados.
- En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5 %.
- Medidas preventivas y de protección
- Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de las transpaletas para evitar el deslizamiento de las mismas o del propio operario que las maneja. Las superficies de los locales de trabajo deberán ser de resistencia suficiente, llanos y libres de irregularidades.
- Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y diseñados de forma racional y de una anchura suficiente.
- La empuñadura de la barra de tracción debe estar recubierta de material plástico antideslizante, para facilitar su sujeción y evitar que se escape de las manos del operario en la fase de t raslado.
- El diseño de la empuñadura de la barra de tracción ha de ser cerrado para impedir que se escape de las manos del operario y a su vez proteger de posibles golpes el mando de las válvulas y el freno.
- Las ruedas directrices deberían protegerse mediante algún tipo de carenado que impida el atrapamien to accidental de los pies del propio operario u otro que se encuentre en las proximidades.
- La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser respetada. Se c onsidera recomendable limitarla a 1500 kg y sólo realizarlas operarios con buenas condiciones físicas. Para pesos superiores se deberían utilizar transpaletas dotadas de un motor eléctrico u otros dispositivos de manutención mecánica.
- Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta en la operación de descenso de la misma.
- Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto.

APÉNDICE 3: FICHAS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD P.O. 74.24 "ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Autor: Dña. Cristina Cobalea Medina

Ingeniero Industrial- Nº Col: 980

1 Máquinas herramientas

Relación de riesgos previsibles

- Cortes y/o erosiones en la piel.
- Exposiciones a contactos eléctricos.
- Exposición al ruido.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Pisadas sobre objetos.

Medidas preventivas

Normas generales

- Utilizar herramientas eléctricas con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997.
- Es necesaria formación específica para la utilización de cada uno de los equipos.
- Seguir en todo momento las recomendaciones e instrucciones del fabricante.
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Normas de uso y mantenimiento

- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
- Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.
- Se tiene que disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina de manera automática.
- Tienen que ser reparados por personal autorizado.
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica o de la batería.
- Realizar estas operaciones con equilibrio estable, colocando de forma correcta los pies.
- Se ha de escoger el accesorio de corte o penetración adecuada para el material que se tenga que agujerear.
- Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
- Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se utilice.
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.
- El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.
- Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su colocación.

Equipos de protección individual (EPI)

- Botas de seguridad.
- Chaleco/ropa alta visibilidad.
- Casco de protección frente a riesgos mecánicos.

- Guantes de protección.
- Gafas de protección anti impacto.
- Protección auricular frente al ruido.

2 Herramientas manuales

Descripción

Equipos de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana: martillos, mazas, hachas, punzones, tenazas, alicates, palas, cepillos, palancas, gatos, rodillos, pies de cabra, destornilladores, etc.

Relación de riesgos previsibles

- Caída de objetos por manipulación.
- Caída de objetos desprendidos.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos.
- Posturas forzadas.

Medidas preventivas

Recomendaciones generales

- Se tiene que formar previamente al usuario acerca de cómo funciona la herramienta y la forma de utilizarla de la manera más segura, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda verse afectada por la herramienta.
- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Recomendaciones particulares

- Utilizarlas adecuadamente y para su uso específico.
- Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y las medidas de seguridad asociadas.
- Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante):
    - Los trabajadores no las tienen que transportar ni en las manos ni en los bolsillos.
    - Llevarlas en cajas o maletas portaherramientas, con las partes punzantes protegidas.
    - Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, hay que utilizar una cartera o cartuchera fijada a la cintura, o un bolso bandolera, de forma que queden las manos libres.

- El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado para su utilización. Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y afiladas y con las articulaciones engrasadas.

Equipos de protección individual (EPI)

- Botas de seguridad.
- Chaleco/ropa alta visibilidad.
- Casco de protección frente a riesgos mecánicos.
- Guantes de protección.
- Gafas de protección anti impacto.
- Protección auricular frente.

3 Herramientas manuales eléctricas

Descripción

Las herramientas eléctricas son aquellas que para su funcionamiento necesitan de electricidad. Realmente se les debería llamar máquinas-herramientas, ya que son herramientas a las que al aplicarles un motor se convierten en máquinas.

Entre las herramientas eléctricas más usadas están las sierras eléctricas, taladros y martillos eléctricos, destornilladores-atornilladores eléctricos, lijadoras, las decapadoras (para calentar y quitar la pintura), las fresadoras, las grapadoras

Relación de riesgos previsibles

- Exposiciones a contactos eléctricos.
- Golpes, cortes por objetos o herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Quemaduras
- Incendios
- Ruidos

Medidas preventivas

- La primera norma es no usar ninguna herramienta que no conozcamos como se maneja.
- Al ser la mayoría máquinas giratorias cuidado con la ropa y el pelo suelto, peligro de enganche.
- Conectar las herramientas siempre a la tensión de uso.
- Inspeccionar el cable antes de cada uso por si estuviera desgastado o con daños en alguna parte. En tal caso no usar la herramienta hasta que no se repare. Mantenga los cables de alimentación alejado del calor, agua, aceite, bordes afilados y piezas móviles.
- Usar gafas de protección cuando hay riesgo de saltar virutas de madera, metal o cualquier otro material.
- Usar cada herramienta solo para el uso que está diseñada.
- En los trabajos de mantenimiento, cambio de accesorios y limpieza tener la herramienta siempre desconectada de la red eléctrica.
- No quitar nunca las protecciones que traen las herramientas.

- Si la herramienta se calienta desconectarla para dejarla enfriar.
- Si una herramienta está defectuosa, quitarla de servicio y etiquetarlo claramente "fuera de servicio para su reparación".
- Asegúrese de que las herramientas estén conectadas a tierra utilizando un enchufe de tres clavijas de conexión.
- Si es una herramienta inalámbrica, recargar su batería solamente con un cargador que está pensado específicamente para la batería de la herramienta.
- Retirar cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta, por ejemplo la llave de buzas en el taladro.
- Utilice abrazaderas, un tornillo de banco u otros dispositivos para sujetar y apoyar la pieza que se está trabajando, cuando sea práctico hacerlo. Esto le permitirá utilizar las dos manos para un mejor control de la herramienta y ayudará a prevenir lesiones por malas posturas.
- Tirar del enchufe, no del cable al desconectar la herramienta.
- Asegúrese de que los accesorios como las brocas, cuchillas, etc., se mantiene afilados y limpios.
- No deje una herramienta en funcionamiento sin vigilancia. No la deje hasta que haya sido desactivado, ha dejado de funcionar por completo, y se ha desenchufado.
- No utilice la herramienta en un área que contiene vapores o gases explosivos.
- No limpie las herramientas con disolventes inflamables o tóxicos.
- No sorprenda, moleste o toque cualquier persona que esté trabajando con una herramienta eléctrica, podría llegar a causar un accidente o una lesión.
- Hacer caso siempre de las Señales de Seguridad

Equipos de protección individual (EPI)

- Casco de seguridad
- Gafas de protección
- Guantes de protección
- Ropa de trabajo

4 Bomba de hormigón sobre camión

Descripción

Equipo de trabajo que impulsa, a través de una bomba, hormigón a zonas de trabajo separadas del camión e inaccesible.

Riesgos previsibles

- Caída de personas a distinto y mismo nivel.
- Caída de objetos en manipulación por desplome o derrumbamiento.
- Choque, golpes y cortes contra objetos.
- Explosiones y/o incendios.
- Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos.

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Atropellos o golpes con vehículos.
- Contactos térmicos, eléctricos y exposición a sustancias nocivas.
- Ruido, vibraciones y estrés térmico.

Riesgos y medidas preventivas

Caída de personas a distinto y mismo nivel	– La máquina debe operarse desde el puesto del conductor. Si se opera desde el telemando, la cabina debe permanecer cerrada para evitar la puesta en marcha del motor por terceros. – Nunca se aleje de la máquina si el motor está en marcha o exista la posibilidad de que alguien pueda arrancarlo sin autorización.
Caída de objetos en manipulación por desplome o derrumbamiento.	– No permanezca debajo de la zona donde está actuando la pluma.
Choque, golpes y cortes contra objetos.	– No meta nunca la mano en las partes móviles de la máquina (agitador, émbolos, etc.). – Al hormigonar existen riesgos para el personal del tajo por sacudidas incontroladas del manguerón. – No desmontar nunca la rejilla que cubre la tolva de la bomba. – No está permitido prolongar el manguerón terminal de la pluma.
Explosiones y/o incendios	– Cuando desconecte una manguera del circuito hidráulico piense que puede estar bajo presión o con el aceite caliente, tome las precauciones adecuadas (despresurizar el circuito y esperar a que se enfríe).
Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos	– En las zonas de despliegue y extensión de las patas de apoyo existe peligro de aplastamiento. Hay que asegurarse que durante esa maniobra no se acerquen personas a la zona de riesgo. – Cuando se posicione para bombear, sitúe el camión perfectamente nivelado, utilizando para ello los gatos estabilizadores. La inclinación máxima permitida en cualquier dirección es de 3 grados. – Las patas de apoyo deben extenderse completamente y apoyarse sobre calzos de madera o metálicos para repartir la presión al terreno uniformemente. La base de apoyo de los calzos sobre el terreno debe ser plana y compacta. – No se debe circular nunca con la pluma desplegada, afecta mucho a la estabilidad del camión. – No apoye nunca una pata en el borde de un terraplén, la distancia mínima debe ser a 2 m del borde del mismo.
Proyección de fragmentos o partículas.	– Utilice siempre gafas protectoras cuando se encuentre en la zona de la manguera de salida del hormigón o esté manipulando en circuitos hidráulicos bajo presión, existen riesgos de proyecciones o escapes.

Sobreesfuerzos	– En caso de vendaval o tormenta, retome la pluma a la posición de transporte. – No utilice nunca la pluma como una grúa para elevación de cargas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas	– Tome precauciones al cargar el carburante, pare el motor y no fume durante la operación.
Atropellos o golpes con vehículos	– Por los caminos de obra circule siempre a baja velocidad. Respete todas las señales. – Antes de mover el camión asegúrese de que la zona está despegada en evicción de un posible atropello.
Contactos térmicos, eléctricos y exposición a sustancias nocivas.	– Los dispositivos ajustables (válvula limitadora de presión, potenciómetro, limitadores de los cilindros, etc.) solamente pueden ser manipulados por el personal expresamente autorizado.
Ruido, vibraciones y estrés térmico	– Utilice siempre su equipo de protección personal. – El vehículo estará dotado de señal acústica cuando realice maniobras marcha atrás. – El vehículo estará dotado de todas las protecciones colectivas propias del mismo.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Botas de goma.
- Guantes de cuero.
- Cinturón antivibratorio.
- Ropa de trabajo.
- Ropa de lluvia.
- Chaleco reflectante.
- Gafas de seguridad.

5 Compresor

Descripción

Máquina que toma el aire de la atmósfera para comprimirlo a la presión necesaria de trabajo, almacenándolo en un depósito desde donde es conducido por medio de una canalización hasta otra máquina o herramienta, que utilizará el aire comprimido como energía para su funcionamiento. El compresor funciona por un motor de combustión y es conducido a la obra remolcado o montado sobre camión.

Relación de riesgos previsibles

- Vuelco.
- Atrapamiento de personas.
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión
- En servicio:
- Exposición a sustancias tóxicas
- Explosiones y/o incendios.
- Exposición al ruido.

Medidas preventivas

- El compresor se ubicará en los lugares señalados para ello en los planos, en prevención de los riesgos por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas.
- El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios se realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar estarán instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
- Hay que prestar atención a que los datos (placa de características) que aparecen en la máquina de accionamiento, en el compresor y en el depósito almacenador. Las instrucciones deberán encontrarse situadas siempre en el mismo lugar donde funciona el compresor.
- Hay que prestar atención a que los compresores destinados a producir aire a presión que aspiren solamente aire puro, es decir, libre de impurezas de todo tipo. El aire mezclado con gases y vapores combustibles (explosivos) o también con polvo puede conducir a la explosión del compresor recalentado por su funcionamiento. Esta podría conducir a la destrucción de la máquina y a otros daños colaterales. Los manómetros de los propios compresores deberán ser fácilmente visibles para que el operario pueda supervisar el grado de presión. Además, deberán ser controlados a intervalos regulares por los especialistas del caso, que comprobarán su buen funcionamiento.
- Todos los compresores y depósitos almacenadores de aire a presión deberán poseer válvulas de seguridad que reaccionan automáticamente al sobrepasar el límite de presión admitida. También se deberá controlar con frecuencia el funcionamiento de tales válvulas, sobre todo bajo condiciones atmosféricas desfavorables.
- Se deberán controlar las temperaturas que se alcanzan, tanto en el compresor como en los depósitos almacenadores. Para ello, se deberán emplear termómetros con dispositivos indicadores lo más visibles posible.
- El chorro de aire comprimido no deberá estar dirigido en ningún caso hacia partes del cuerpo de algún operario. Las presiones elevadas pueden provocar graves lesiones.
- El compresor debe estar parado cuando se quieran realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en el mismo. También será necesario llevar a cabo un control a intervalos regulares de los depósitos que almacenan el aire a presión por especialistas apropiados, a efectos de poder diagnosticar la posibilidad de seguirlos empleando. Esta comprobación se realizará mediante tu control interior y una prueba hidráulica con una presión de 1,5 veces mayor que la presión máxima de servicio normal.

- El servicio y mantenimiento de compresores no será realizado por personal competente en la materia que haya recibido las instrucciones pertinentes acerca del funcionamiento y características de la máquina.
- Jamás se realizará la búsqueda de escapes en las tuberías y depósitos en donde se almacena el aire comprimido, sometidos a una presión elevada con una mano, pues un chorro finísimo de aire comprimido actúa como un cuchillo afilado.
- Un exceso de presión puede causar el estallido de los compresores depósitos y tuberías, por ello, para paliar tal condición insegura, será obligatorio disponer de una válvula de seguridad calibrada por la presión máxima de trabajo y un dispositivo que para automáticamente la compresión precisamente al llegar a la presión máxima indicada (a veces se prevé otra válvula que impide la entrada del aire a las cámaras de compresión a partir de un determinado valor de la presión predeterminada en el depósito y admitiéndola posteriormente de nuevo en el depósito. Consecuencia del consumo alcanzado por haber descendido otro determinado valor). En los indicados depósitos será preceptivo disponer también de un manómetro y de un purgador de fondo.
- El aire que sale del compresor puede contener agua y aceite, que son nocivos al buen funcionamiento del aparato (el aceite puede también dar lugar a explosiones) y como consecuencia de ello se debe instalar un depósito separador o filtro de retención. Ahora bien, como el aire puede contener fácilmente óxido de carbono (procedente del motor de combustión interna o de la destilación de lubrificantes o de depósitos carbonosos) que es tóxico también en pequeñas cantidades, por lo cual al difundirse el aire comprimido en ambientes cerrados y poco ventilados, será necesario aplicar otro filtro que retenga el mentado óxido de carbono; este filtro no tiene una duración ilimitada, sino que requiere un cambio después de un determinado período de tiempo.
- Como norma general, previo a la puesta en marcha del compresor, se deberán verificar todos los órganos, los dispositivos de lubricación, los filtros y, antes de poner en funcionamiento el motor, será necesario abrir la descarga en la atmósfera y poner en marcha el sistema de enfriamiento. Sólo después de haber alcanzado el estado de régimen se podrá abrir lentamente la comunicación con el depósito, cerrando la descarga en la atmósfera.
- Durante el funcionamiento será conveniente: observar frecuentemente los manómetros, las válvulas, los purgadores de la condensación; controlar la temperatura del aire que sale del depósito del agua de enfriamiento de los soportes y buscar y eliminar las eventuales pérdidas.
- El mantenimiento y limpieza de las distintas partes del compresor (filtros, válvulas, tuberías, depósitos, etc.) se debe realizar con muchísimo esmero y cuidado, según el plan general preconcebido y los plazos semanales, mensuales o semestrales, fijados por el constructor.
- La presión del aire a la salida depende de la presión y temperatura del aire que entra, y por eso varía según que el lugar en donde queda situado el compresor (nivel del mar o a cotas más altas) y según que aspire aire caliente o frío. Cuando se pueda, conviene aspirar de subterráneos y otros lugares fríos pero no húmedos, a menos que no tengan un óptimo sistema de eliminación de la humedad del aire.
- Es una equivocación y hasta peligroso querer forzar el rendimiento elevando la presión del compresor y actuando sobre su velocidad más allá de los límites dados por el regulador del que está provisto o, de todas formas, de su construcción. En cambio, es necesario saber elegir el tipo justo en el momento de su adquisición, teniendo presentes las previsibles y distintas posibilidades de empleo.
- Para el trabajo de los compresores, será necesario seguir las instrucciones de los fabricantes, que hay que exponer e ilustrar al personal que trabaja con ellos.
- El compresor siempre se situará de forma nivelada, procediéndose al calzado del mismo antes de su puesta en funcionamiento.

Equipos de protección individual

- Calzado de seguridad
- Chaleco/ropa alta visibilidad.
- Casco de seguridad homologado
- Protección auricular frente al ruido.

6 Martillo neumatico.

Descripción

Herramienta de percusión, mecánica, accionado por aire a presión, empleado en la demolición manual de pavimentos, realizar agujeros de grandes dimensiones, picar tierra o demoler construcciones de diversa índole.

Riesgos y medidas preventivas

- Caídas al mismo nivel
  - Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la realización de trabajos con este tipo de máquina.
  - Nunca trabajar encaramado sobre muros, pilares, paneles de encofrar, salientes, etc.
  - Cuando la manguera descanse sobre el suelo, evitar que pueda originar caídas o ser pisada por máquinas en movimiento. No depositar nunca materiales sobre la manguera neumática.
  - Mantener la manguera desenrollada y alejada del calor, aristas vivas o partes móviles.
- Caídas a distinto nivel
  - Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.), de la realización simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, suciedad, hielo, etc.).
  - Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro
  - Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.) cuando se deban realizar trabajos en altura (más de 2 m) o próximos al borde de zanjas, huecos, etc.
- Contactos con servicios
  - Se solicitarán a las empresas propietarias de los servicios los planos correspondientes a la zona afectada.
  - Conocer el tipo y contenido del material sobre el que se vaya a utilizar el martillo. Conocer de forma precisa la situación y profundidad de las conducciones subterráneas (tuberías de agua, gas, redes de alcantarillado y cables eléctricos).
  - Como norma general, sólo se podrá emplear el martillo hasta llegar a una distancia de 50 cm de la conducción enterrada.
- Caída de objetos sobre el operador
  - Verificar que no pueda existir un riesgo de caída de objetos desde altura originados por el trabajo con el propio martillo o por la realización de trabajos en niveles superiores.
- Desplome del terreno
  - Inspeccionar el terreno circundante para detectar la posibilidad de que se puedan producir desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno.
- Proyección de objetos
  - En caso necesario, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de peatones, trabajadores o vehículos (vallas, señales, etc.).

- Inhalación de polvo
  - Se recomienda utilizar sistemas de extracción localizada de aire cuando se trabaje en lugares cerrados (interior de naves, túneles, etc.).
- Golpes por falta de visibilidad
  - Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si no existe una iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo.
- Golpes por movimientos incontrolados de la manguera
  - Emplear mangueras y conexiones del tamaño correcto, adecuadas a la presión y caudal de trabajo y con un grado de resistencia física acorde a la zona de uso.
  - No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras neumáticas.
- Incendios / Explosión
  - No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.)
- Exposiciones al ruido
  - Situar el compresor a una distancia mínima de 10 m de la zona de trabajo.
  - Hay que asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo
  - El trabajador que haga uso del martillo empleará cascos protectores auditivos
- Exposiciones a vibraciones
  - Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida.

Equipos de protección individual

- Calzado de seguridad. Su uso es obligatorio en una obra. Deberá poseer suela antiperforante/antideslizante y puntera reforzada.
- Gafas de protección y casco de protección. Su uso es obligatorio ya que existe riesgo de proyección de fragmentos con aristas cortantes.
- Protectores auditivos. Será obligatorio cuando el valor de exposición a ruido (LAeq,d) supere los 87 dB(A).
- Guantes. Para evitar cortes por la proyección de objetos cortantes y reducir la transmisión de vibraciones.
- Mascarilla con filtro mecánico. Se usará cuando se trabaje en lugares con escasa ventilación.
- Ropa o chaleco reflectante. Será obligatorio cuando existan otros vehículos trabajando en las proximidades.

7 Pala cargadora

Descripción

Una pala cargadora o pala mecánica es una máquina de uso frecuente en obras y otras actividades que implican el movimiento de tierra o roca en grandes volúmenes y superficies.

Riesgos

- Caída de personas a diferente nivel.
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.

- Atrapamientos por o entre objetos.
- Atrapamientos por vuelco de máquinas.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.
- Explosiones.
- Incendios.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas Preventivas

Normas generales

- Deben utilizarse palas cargadoras de ruedas que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.
- Se recomienda que la pala cargadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
- Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la máquina circula por una vía pública, el conductor tiene que tener, además, el carné de conducir B.
- Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la pala responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
- Asegurar la máxima visibilidad de la pala limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
- Subir y bajar de la pala únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la pala.
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.
- Verificar la existencia de un extintor en la pala.
- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.

Normas de uso y mantenimiento

- Antes de empezar los trabajos hay que localizar y reducir al mínimo los riesgos derivados de cables subterráneos, aéreos u otros sistemas de distribución.
- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.

- La pala cargadora de ruedas no se utilizará como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
- Prohibir el transporte de personas en la cuchara.
- No subir ni bajar con la cuchara en movimiento.
- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, Arnés de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el Arnés de seguridad obligatoriamente.
- En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.
- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.
- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
- Realizar las entradas o salidas del solar con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista.
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Evitar desplazamientos de la pala en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar la cuchara rápidamente para volverla a equilibrar.
- En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor se encuentra fuera de la zona de trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse de que el material queda uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el camión con precaución.
- No utilizar cucharas y accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.
- Extraer siempre el material de cara a la pendiente.
- Mover la máquina siempre con la cuchara recogida.
- No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la pala.
- Circular con la cuchara a unos 40 cm del suelo.
- La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.
- No utilizar la cuchara como andamio o plataforma de trabajo.
- Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la visibilidad del operario.
- Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo.
- Trabajar a una velocidad adecuada y sin realizar giros pronunciados cuando se trabaje en pendientes.
- Hay que evitar que la cuchara de la pala se sitúe por encima de las personas.
- Dejar la cuchara en el suelo una vez hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presión hacia abajo.
- No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.

- Efectuar las tareas de reparación de la pala con el motor parado y la máquina estacionada.
- En operaciones de cambio de cuchara o brazo, no controlar la alineación de los cojinetes y juntas con la mano, sino que aseguraremos su posición con cinta adhesiva.
- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores.
- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la pala y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.
- Estacionar la pala en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería, cerrar la cabina y el compartimento del motor y apoyar la pala en el suelo.
- Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que la pala cargadora de ruedas caiga en las excavaciones o en el agua.
- Regar para evitar la emisión de polvo.
- Está prohibido abandonar la pala cargadora de ruedas con el motor en marcha.

Protecciones colectivas

- Cabina o escudo de seguridad en puesto de maquinista
- Vallas de limitación de zonas de trabajo
- Extintor de incendios

Señalización y balizamiento

- Señalización de seguridad y vial

Equipos de protección individual

- Casco (sólo fuera de la máquina).
- Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
- Mascarilla (cuando sea necesaria).
- Calzado de seguridad.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).

8 Retroexcavadora

Descripción

La retroexcavadora, es una máquina que se utiliza para realizar excavaciones en terrenos, consistente en un balde de excavación en el extremo de un brazo articulado de dos partes.

La retroexcavadora se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de tierras, para realizar rampas en solares o para abrir surcos destinados al pasaje de tuberías, cables, drenajes, etc., así como también

para preparar los sitios donde se asientan los cimientos de los edificios. La máquina hunde sobre el terreno una cuchara con la que arranca los materiales que arrastra y deposita en su interior.

El chasis puede estar montado sobre cadenas o bien sobre neumáticos. En este último caso están provistas de gatos hidráulicos para fijar la máquina al suelo.

Riesgos y medidas preventivas

Atropello	- Conocer las posibilidades y los límites de la máquina y particularmente el espacio necesario para llevar a cabo las maniobras. - Balizar la zona de evaluación de la misma cuando el espacio es reducido. - Vigilar la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno de los mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos de seguridad. - Regular el asiento y la comodidad, estatura y peso del conductor. - No abandonar la retroexcavadora sin apoyar el equipo en el suelo, parar el motor y colocar el freno. Conservar la llave de contacto encima.
Choque con otros vehículos	- Conocimiento del plan de circulación de la obra y de los trabajos que se realizan a diario en la obra que pueden constituir riesgo: zanjas abiertas, tendido de cables, etc. - Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitada o estrechas. - Con el tren de rodadura de ruedas, circular con precaución a velocidad lenta en zonas de polvo, barro o suelo helado.
Golpes	- Se realizará la carga en los camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra horizontal. - Colocar el equipo de la cuchara apoyado en el suelo, aunque sea para paradas de corta duración.
Vuelco	- Cuando se vaya a circular en carretera se bloquearán los estabilizadores de la pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos para tal efecto - Cuando se circula hacia atrás estar muy atentos o mejor hacerse guiar. - Guardar distancias a las zanjas, taludes y toda alteración de terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina. - No comenzar nunca ningún trabajo sin los estabilizadores si la máquina es de neumáticos.

	- Para la extracción de material en pendiente, hacerlo siempre de cara a la pendiente. - En pendientes, orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo.
Contactos eléctricos	- A la circular junto a una línea eléctrica aérea es necesario tener en cuenta las sinuosidades del camino, los baches y demás irregularidades para conservar la distancia de seguridad frente a las mismas.
Caída de objetos	- - No derribar elementos que sean más altos que la máquina con la cuchara extendida.

Equipos de protección individual (EPI)

- Casco de seguridad para circular hasta el interior de la cabina
- Calzado de seguridad
- Botas de goma
- Guantes de cuero
- Cinturón antivibratorio
- Protectores auditivos en caso de no disponer de cabina insonorizada
- Ropa de trabajo
- Ropa de lluvia
- Mascarilla filtrante
- Chaleco reflectante

9 Camión grúa

Descripción

Camión dotado de una pequeña grúa o pluma, para el movimiento de cargas. Esta grúa o pluma se encuentra incorporada en el chasis en la parte delantera de la ca ja del camión que sirve como habitáculo para el transporte de materiales a la obra. Con la incorporación de una grúa en el camión se consigue una mayor independencia a la hora de la carga y descarga del material transportado, no dependiendo de maquinaria auxiliar como carretillas elevadoras.

Riesgos

- Atropello de personas en maniobras.
- Colisión contra otras máquinas, vehículos y/o elementos fijos de la obra.
- Vuelco del camión.
- Proyección de objetos sobre el personal cercano a la máquina.
- Lesiones, caídas y golpes.

- Atrapamientos.
- Desplome de la carga.
- Contactos eléctricos y/o incendios.

Medidas preventivas

- Los camiones grúa tendrán marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.
- Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
- Ha de estar dotado de acústico marcha atrás. Incluyéndose en las maniobras, si es necesario, la labor de señalista.
- Es necesario comprobar que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de las informaciones específicas de PRL que fija el R. D. 1215/97, de 18 de julio, articulo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. Si la maquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet C de conducir.
- Deben utilizarse equipos que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el R.D. 1215/1997.
- El personal de obra debe alejarse cuando el equipo este izando o descargando material.
- Se prohíbe transportar cargas por encima de los operarios y la permanencia bajo las cargas en suspensión.
- Deben evitarse o minimizarse les posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
- Se recomienda que el camión esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.
- Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y encargado.
  - Diariamente, el gruista debe de observar:
  - La vía.
  - El estado de la grúa.
  - Los lastres y contrapesos.
  - Niveles de aceite.
  - Los mandos en vacío.
  - Dispositivos de seguridad.
  - Cables y accesorios de elevación.
- Hacer uso de chaleco o ropa de trabajo con características de alta visibilidad cuando esté fuera de la cabina.
- Asegurar la máxima visibilidad limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos.
- Verificar que la cabina este limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.
- Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión.
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.
- Comprobar que existe un extintor en carga y con las revisiones pertinentes.
- Comprobar que existe en la cabina un botiquín con lo reglamentariamente requerido.
- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. Las cargas se guiarán con cabos de gobierno, en caso necesario, por la dificultad del manejo de las cargas o la existencia de fuerte viento

- El operador siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona de carga y descarga de material y si no debe tener la ayuda de un señalista.

Equipos de protección individual

- Botas de seguridad.
- Chaleco/ropa alta visibilidad.
- Casco de protección frente a riesgos mecánicos.
- Guantes de protección.
- Gafas de protección antiimpacto.

10 Camión de transporte

Descripción del equipo:

Se incluyen en este apartado todo tipo de camiones que intervienen en la obra: camiones de transporte de materiales, camión caja contenedor, camión de escombros, góndola, camión cisterna, etc.

Riesgos

- Golpes y cortes por objetos/herramientas
- Atrapamiento por o entre objetos
- Accidentes con máquinas o vehículos
- Accidente por sustancias nocivas/tóxicas
- Incendios

Procedimientos preventivos

Medidas preventivas de circulación:

- Se establecerá una disposición interna de seguridad para la regulación del tráfico y la señalización en la obra, con velocidades máximas permitidas, condiciones de estacionamiento y aparcamiento, normas de prioridad de los vehículos, sistemas de aviso y la señalización vial.
- Se establecerán zonas de paso independiente para vehículos y peatones. Se establecerán zonas de trabajo delimitadas y controladas. Se respetarán los caminos de circulación habilitados en el interior de la obra, y la señalización vial de obra. Mantener una distancia máxima en el interior de la obra de 20 km/h. Auxiliarse de una persona que le indique durante las maniobras complicadas.
- Se utilizarán todos los equipos de protección individual indicados cuando el conductor baje de la cabina del camión (chaleco reflectante, casco de seguridad, calzado de seguridad).
- Antes de la circulación, inspeccionar el terreno y asegurarse de que exista espacio suficiente para el paso, tanto en altura como en anchura. Asegurarse de que no existan obstáculos en la zona de maniobra, especialmente si ha de ser marcha atrás.
- Se comprobará la resistencia y solidez del suelo o terreno por donde circula. Se realizará un acondicionamiento periódico de pistas, accesos y zonas de trabajo. Extender una capa de material repartido de forma uniforme, que evite que se formen barros y encharcamientos (grava, restos de

material cerámico, hormigón pobre). Humedecer la zona de trabajo y caminos de circulación, sobre todo en épocas estivales.

- El camión se mantendrá alejado de los bordes de excavaciones y taludes a una distancia aproximada de 2 metros.
- Evite circular por rodadas que puedan poner en peligro la inestabilidad del vehículo. No realizar maniobras bruscas en la inmediaciones de vaciados, cunetas, terraplenes, etc., sobre todo en época de lluvias con el firme irregular,
- Conducir con velocidad lenta en lugares embarrados, deslizantes o inclinados. Las operaciones de giro, carga y descarga se hará sobre terreno nivelado.
- Mantener las distancias de seguridad tanto de otras máquinas en movimiento como de obstáculos que puedan causar daños y situaciones de peligro.
- El conductor del vehículo avisará con señales a las personas que trabajan en su proximidad antes de cualquier maniobra según un sistema establecido de avisos o señales.
- Vigilar que no hay personal trabajando en el radio de acción de la máquina. Tenga especial precaución cuando circule cerca de maquinaria o vehículos que estén o se vayan a poner en marcha. Cuando tenga que pasar próximo a ellos hágalo de forma que sea visible en todo momento para el conductor del vehículo o la máquina
- Se prohibirá el transporte de personas encaramadas en cualquier parte del camión.
- Medidas preventivas del camión:
- Se le realizarán al camión las revisiones periódicas, en particular a los frenos, luces, parabrisas, espejos retrovisores, dejando constancia del mantenimiento. El mantenimiento lo realizará personal cualificado. Realización del mantenimiento con el motor apagado. Se mantendrá la presión de los neumáticos en la tara que marque el fabricante.
- Los peldaños de acceso y la zona de apoyo de los pies en el puesto de la caja deben ser antideslizantes y estar limpios. Así mismo dispondrá de asideros suficientes. Se limpiarán periódicamente.
- Evitar el contacto con el electrolito de la batería y líquidos anticongelantes. Se utilizarán guantes y gafas protectoras durante las labores de mantenimiento. Mantenga la zona del motor limpia de trapos impregnados de aceites o grasas.
- El repostado de los vehículos se deberá efectuar con el motor parado y los circuitos eléctricos desconectados, lejos de elementos que puedan producir chispas o llamas. Se prohíbe fumar o utilizar dispositivos de llama abierta, en un área comprendida dentro de 15 m de la zona de repostado o de almacenamiento de combustible. Se colocarán carteles visibles que indiquen esta prohibición.
- El camión deberá estar dotados de medios de extinción en función de su P.M.A.: hasta 7.000 kg, 1 extintor de eficacia 21A113B, hasta 20.000 kg, 1 extintor de eficacia 34A144B, más de 20.000 kg, 2 extintores de eficacia 34A144B. Compruebe la accesibilidad, la carga y la presión del extintor.
- Durante las operaciones de carga:
- Cuando se están realizando operaciones de carga y descarga no debe situarse ninguna persona en el radio de acción.
- El conductor debe tener a la vista la carga, si es necesario le deberá ayudar un señalista.
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga, además de haber sido accionado el freno de mano, se extenderán totalmente los gatos estabilizadores de los camiones contenedor. No permita que nadie se acerque a ellos durante su extendido.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible.
- Asegúrese de que los gatos estabilizadores se asientan sobre un terreno firme, en caso contrario, ponga debajo de ellas tablones gruesos o chapas metálicas para asegurar la estabilidad.
- Revisiones periódicas de acuerdo con las instrucciones del fabricante del sistema hidráulico y de los mecanismos.

- Asegurarse de la inexistencia de líneas aéreas. En caso, se establecerá una distancia de seguridad de 5 metros entre el extremo superior de la grúa y la línea.

Actuación en caso de contacto:

- El conductor permanecerá en la cabina, maniobrando, si es posible, para que cese el contacto. Indicará a todas las personas que se alejen del lugar hasta que cese el contacto, o le confirmen que la instalación ha sido desconectada. Si el vehículo se incendiara y se viera obligado a abandonarlo podrá hacerlo comprobando que no hay cables en el suelo, ni en el vehículo. Descenderá del camión dando un salto con los pies juntos. No tocará el camión y el suelo al mismo tiempo. Se alejará del camión con pasos cortos.

11 Hormigonera

Descripción

Equipo de trabajo, que puede ser accionado de forma eléctrica o mediante motor de explosión de gasolina, que consistente en un depósito rotatorio donde se mezclan los ingredientes del hormigón: áridos de diferente granulometría, cemento y agua.

Riesgos y medidas preventivas

Caída al mismo nivel	- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. - Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir. - Situar la hormigonera en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso.
Caída de objetos por desplome, derrumbamiento o manipulación.	- Usar calzado de protección para trabajar con la hormigonera, sobre todo al verter los áridos dentro del bombo.
Choques/Cortes contra objetos o herramientas	- En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos. - Antes de poner en funcionamiento la máquina, hay que asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones protectores. - Las partes móviles de la hormigonera como peñones, correas deben estar protegidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas, Contactos eléctricos y térmicos	- Utilizar hormigoneras eléctricas con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 1215/1997. - Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. - Seguir las instrucciones del fabricante. - Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. - La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. - Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.

	- La hormigonera tiene que disponer de freno de basculación del bombo. - Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica. - No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. - Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. - Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. - - Los interruptores exteriores deben tener enclavamiento mecánico.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: por contactos con cemento.	- Utilizar guantes de protección y ropa de trabajo adecuada.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: Ruidos.	- Utilizar protectores auditivos
Sobreesfuerzo o daño por mal uso	- Utilizar hormigoneras eléctricas con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 1215/1997. - Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. - Seguir las instrucciones del fabricante. - Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. - Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir. - Tienen que ser reparadas por personal autorizado.

Equipos de protección individual (EPI)

- Casco de protección.
- Protectores auditivos: tapones o auriculares.
- Gafas de protección.
- Guantes contra agresiones químicas.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

12 Pulidora

Descripción

Las pulidoras son herramientas eléctricas cuya versatilidad es importante para pulir salientes o bordes, así como soltar remaches, redondear ángulos, cortar metales, etc. Por ello, la industria las requiere de manera permanente para varios procesos en los que involucre bruñido, afilado o bordeado de superficies.

Riesgos y medidas preventivas

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina	– Disponer de armazón de protección para evitar atrapamientos. – Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. – No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. – Cargar el combustible con el motor parado. – Almacenamiento de estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.
Proyección de fragmentos o partículas	– Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. – Utilizar el equipo de protección adecuado durante la tarea.
Sobresfuerzos	– Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. Hacer descansos.
Contactos térmicos y eléctricos	– Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica. – La conexión o suministro eléctrico se ha de realizar con manguera antihumedad. – Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos	– Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir, antes de empezar a trabajar.
Exposición a agentes físicos: ruido, vibraciones	– Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. – Usar las protecciones pertinentes. – Atenuar las vibraciones su transmisión al hombre, interponiendo equipos auxiliares o materiales aislantes y/o absorbentes de las vibraciones.

Normas generales

- Utilizar pulidoras con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 1215/1997.
- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.
- Seguir las instrucciones del fabricante.
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad.
- Guantes contra agresiones mecánicas.
- Mascarilla
- Protectores auditivos: tapones o auriculares.
- Gafas de protección.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

13 Máquina p/ pintar banda vial autopropulsada

Descripción

Equipo de trabajo destinado a pintar las líneas de señalización viaria.

Riesgos

- Caída de personas a diferente nivel.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Atrapamientos por vuelco de máquinas.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.
- Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.
- Explosiones.
- Incendios.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: vapores.
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas

NORMAS GENERALES

- Deben utilizarse máquinas pintabandas que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica el R.D. 1215/1997.
- Se recomienda que la máquina pintabandas esté dotada de avisador luminoso tipo rotatorio o flash.
- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.
- Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Los registros de ITV sólo son exigibles en las máquinas matriculadas que superen los 25 km/h.

- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina pintabandas responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres.
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de acceder a la cabina.
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles.
- Verificar la existencia de un extintor en la máquina pintabandas

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.
- La máquina pintabandas no se utilizará como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.
- No subir ni bajar con la máquina pintabandas en movimiento.
- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.
- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.
- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.
- Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.
- Siempre que sea posible, utilizar pinturas con etiqueta ecológica o compuestas por productos menos perjudiciales que otros para la salud de los trabajadores.
- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados.
- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.
- Efectuar las tareas de reparación de la máquina pintabandas con el motor parado y la máquina estacionada.
- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores.
- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina pintabandas y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto.
- Estacionar la máquina pintabandas en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m. de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y el compartimento del motor.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad

- Mascarilla (cuando sea necesaria).
- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).
- Calzado de Seguridad.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Ropa de Trabajo.
- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).

14 Equipo de soldadura electrica

Descripción

Equipos de trabajo consistentes en que la pieza a soldar está sometida a uno de los polos de la fuente de energía y el electrodo que se encuentra conectado al otro polo.

Riesgos y medidas preventivas

Caída de personal a distinto y mismo nivel	- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas
Pisadas y golpes contra objetos	- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas - Desconectar el equipo cuando no se utilice
Proyección de fragmentos o partículas	- Utilizar equipos de soldadura con el marcado CE prioritariamente o adoptados al Real Decreto 1215/1997 - Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
Contactos térmicos y eléctricos	- Comprobar periódicamente el estado de los cables de alimentación, pinzas, etc. - En los trabajos en zonas húmeda o mojada, la tensión nominal de trabajo no puede exceder de 50 V en c.a. o 75 V en c.c. - Se prohíbe trabajar en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la presencia de extintores. - Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. - La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. - Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica. - Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores, se recomienda la utilización de pequeñas tensiones. En otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar, no será superior a 90 V, valor eficaz para corriente alterna, y 150V en corriente continua. - No cambiar los electrodos sin guantes, con guantes mojados o sobre una superficie mojada. - No tocar la pieza recientemente soldada.
Inhalación o ingestión de	- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo - No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento

agentes químicos peligrosos	
Explosiones Incendios	- Los portaelectrodos tienen que tener el apoyo de manutención en material aislante y en perfecto estado de mantenimiento. - Seguir las instrucciones del fabricante - Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir - Se debe disponer de extintores en zonas de trabajo con riesgo de incendio - Se prohíbe trabajar en zonas de trabajo donde se almacenen materiales inflamables o combustibles. - No trabajar con ropa sucia por grasa o sustancias inflamables - No realizar operaciones de soldadura en lugares donde se está desengrasando
Posturas forzadas Sobreesfuerzo	- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo
Riesgos de daños a la salud derivados de la exposición a agentes: químicos y físicos	- Desconectar el equipo de soldadura en pausas de una cierta duración. - El grupo estará fuera del recinto de trabajo - No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan sido limpiados completamente y desgasificados con vapor si fuera necesario. - El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad.
- Gafas.
- Pantallas faciales, con vidrio filtrante, que protejan de la proyección violenta de partículas y de las radiaciones de soldadura.
- Guantes contra agresiones de origen térmico.
- Manoplas.
- Manguitos y mangas.
- Calzado de seguridad.
- Polainas.
- Delantales de protección contra agresiones mecánicas.
- Arnés (en trabajos en altura).
- Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada).

15 Embarcaciones auxiliares- Barcaza o pontona

Descripción

Una embarcación auxiliar es una embarcación de cualquier tipo, independientemente de su medio de propulsión, cuya eslora máxima no sea superior a 4 metros y cuya potencia instalada, en su caso, no sea superior

a 8 kW12 (aprox. 10CV). Está destinada exclusivamente al servicio auxiliar de la embarcación principal de recreo a la que sirve.

En términos más generales, una embarcación auxiliar es una embarcación menor, adjunta a un barco de cierta importancia, que se emplea para operaciones complementarias de transporte de personas o mercancías o para maniobras fundamentales en la navegación.

Las embarcaciones auxiliares modernas en general son a motor en cualquier formato existente (intraborda, extraborda, eléctrico, de combustión interna, etc), aunque sigue habiendo barcas a remos.

Riesgos asociados

- Caídas al mismo nivel
- Caídas a distinto nivel
- Caída de "hombre al agua"
- Atrapamientos
- Cortes y golpes con herramientas
- Caídas de objetos
- Manejo manual de cargas
- Posturas forzadas y movimientos repetitivos
- Riesgo eléctrico
- Exposición al ruido
- Vibraciones
- Quemaduras por contacto
- Contacto sustancias químicas peligrosas
- Exposición a sustancia tóxicas o irritantes

Medidas preventivas

Medidas preventivas específicas de la fase para la embarcación de apoyo:

- La tripulación hará uso de los medios del equipamiento de seguridad personal según lo establecido en la normativa vigente.
- -El patrón de la embarcación velará por el cumplimiento de las medidas referidas a la utilización de equipos de protección individual por parte de los tripulantes.
- El embarque y el desembarque se realizará desde el muelle operativo o desde la línea de playa.
- Durante el proceso de inmersión, la dotación de la embarcación vigilará en todo momento las burbujas procedentes de los equipos respiratorios de los buceadores y estará informada, en lo posible, de la duración aproximada de la inmersión.
- Al hacer los buceadores inmersión desde la embarcación, ésta permanecerá desembragada, mientras los buceadores estén en superficie o próximos a ella
- Cuando se sepa, o haya evidencia del regreso de los buceadores a superficie, el patrón desembragara el motor y no volverá a embragarlo, mientras no se encuentren los buceadores fuera del agua o hayan vuelto a hacer inmersión.
- La dotación de la embarcación estará alerta para recoger en el menor tiempo posible a un buceador que saliera a superficie con cualquier problema.

- La única operación de buceo permitida desde una embarcación en movimiento, es la de búsqueda con buceador remolcado. En este caso no se embragará el motor de la embarcación hasta que el buceador se encuentre fuera del alcance de las hélices.

Medidas preventivas durante el uso de la embarcación

- **Caídas al mismo nivel**

- Eliminar la suciedad, papeles, polvo, desechos de seres vivos, grasas y desperdicios contra los que se pueda tropezar.
- Mantener los suelos libres de agua en cubierta.
- Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se están utilizando.
- Instalar suelos y escalones antideslizantes de fácil limpieza y desinfección.
- Instalar drenajes para líquidos, con suelos con suficiente inclinación para evitar retenciones de líquidos.
- Limpiar rápidamente la suciedad o los derrames.
- Mantener las zonas de paso despejadas y perfectamente iluminadas.
- Concienciar a los trabajadores del mantenimiento del orden y la limpieza de sus puestos de trabajo.
- Usar calzado apropiado, con suela antideslizante y con los cordones debidamente anudados.
- Fomentar hábitos de orden y limpieza evitando el riesgo de caída al mismo nivel. Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados.

- **Caídas a distinto nivel**

  – Las medidas preventivas que adoptaremos serán:

- A las escaleras de mano se debe subir con precaución, siempre de frente a ellas, agarrándose con las dos manos al subir y al bajar, no llevando objetos en las manos.
- Instalar en los altillos y zonas de trabajo elevadas barandillas, con listón intermedio y rodapié.
- Cubrir las tapas de escotillas, así como los tambuchos presentes en cubierta.
- Accesos a lugares elevados dotados de barandillas y peldaños con superficies antideslizantes.
- Evitar los grandes desniveles y la desprotección en las rampas de acceso al barco.
- Cumplir que la regala tenga una altura suficiente y que esté en buen estado.

- **Atrapamientos**

  – Las medidas preventivas que adoptaremos serán:

- Comprar máquinas y herramientas seguras, que tengan el marcado CE.
- Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante.
- Proteger la parte peligrosa de las máquinas y herramientas con resguardos móviles con enclavamiento, resguardos regulables o retractiles o barreras inmateriales (tarimas sensibles, células fotoeléctricas).
- Colocar interruptores de emergencia accesibles que permitan parar la máquina en condiciones seguras.
- Uso de la maquinaria solo por el personal designado por la empresa, con formación e información de sus riesgos.
- Comprobar periódicamente que los dispositivos de protección por recubrimiento, cercado, etc. son eficaces.
- Usar los equipos de protección individual, con marcado CE que sean necesarios en cada operación (guantes, gafas).
- Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas.
- Efectuar las operaciones de mantenimiento siempre con la máquina parada y adecuadamente enclavada, por personal autorizado.
- Llevar la ropa de trabajo ajustada al cuerpo, evitando el uso de pulseras, anillos, cadenas, etc.

- **Cortes y golpes con herramientas**

- Comprar máquinas y herramientas seguras, que tengan el marcado CE.
- Cumplir las normas de seguridad indicadas por el fabricante.
- Proteger la parte cortante de las máquinas y herramientas con resguardos móviles con enclavamiento, resguardos regulables o retractiles o barreras inmateriales (tarimas sensibles, células fotoeléctricas).
- Utilizar herramientas con mangos bien diseñados (guardamanos).

- Uso de la maquinaria solo por el personal designado por la empresa, con formación e información de sus riesgos.
- Comprobar periódicamente que los dispositivos de protección son eficaces.
- Usar los equipos de protección individual, con marcado CE que sean necesarios en cada operación.
- Se utilizarán las herramientas de acuerdo a su función, manteniéndolas en buen estado.
- Guardar las herramientas cortantes en fundas y/o soportes adecuados.
- Limpieza de las herramientas tras su utilización, evitando en todo momento la potente acción corrosiva del agua salada y el efecto del óxido como vía de infecciones ante posibles cortes.
- Evitar o eliminar los cantos o bordes cortantes.

- **Caídas de objetos**

- Prestar atención a la capacidad de carga nominal del medio de elevación y al equilibrado de los materiales.
- Ubicar y fijar el cargamento correctamente.
- Establecer la prohibición de situarse debajo de las cargas suspendidas.
- Información del uso correcto de los medios de elevación y transporte de cargas.
- Garantizar la estabilidad de los apilamientos, sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos sólidos, colocando las cargas más pesadas en los estantes bajos.
- Realizar mantenimiento periódico de los equipos (grúas, gatos, elevadores, etc.).
- Utilizar casco de protección homologado con marcado CE.
- Trincar en cubierta todos los elementos movibles, susceptibles de ser desplazados por balanceos y cabeceos.
- Adujar bien todos los cabos. • Fijar bien los utensilios de cocina.

- **Manejo manual de cargas**

- Manipular las cargas con ayuda de medios auxiliares (carretillas, transpaletas) o con ayuda de otras personas.
- Formación e información del manejo y uso de carretillas elevadoras, transpaletas, etc. y demás equipos de trabajo utilizados en el transporte de cargas.
- Utilizar los medios mecánicos de manipulación de cargas disponibles. Fase: Apoyar los pies firmemente. 2ª Fase: Separar los pies ligeramente. 3ª Fase: Doblar la cadera y las rodillas para coger la carga. 4ª Fase: Levantar la carga con la espalda recta. 5ª Fase: Mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible.
- Respetar las cargas máximas según sexo y edad.

En el caso de realizan la manipulación de cargas manualmente tendremos en cuenta:

- **Posturas forzadas y movimientos repetitivos**

- Diseño ergonómico de los puestos de trabajo, analizando los procedimientos de trabajo.
- Seleccionar útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar posturas forzadas y sobreesfuerzos.
- Posibilitar los cambios de postura y los descansos, alternando de tarea si es factible.
- Colocar los útiles y demás medios de trabajo al alcance de la mano.
- Realizar la vigilancia periódica de la salud.

- **Postura de trabajo de pie**

- Evitar en lo posible los movimientos bruscos y forzados del cuerpo.
- Para reducir la tensión muscular mantener un pie apoyado sobre un objeto o reposapiés y alternar un pie tras otro.
- El plano de trabajo, con carácter general, debe estar a la altura aproximada de los codos.
- Debe mantenerse el cuerpo erguido con el tronco recto.
- No permanecer demasiado tiempo en la misma posición, cambiando de postura y efectuando movimientos suaves de estiramiento de los músculos.

- **Riesgo eléctrico**

- Realizar un control visual antes de comenzar a trabajar.

- Como norma general, la instalación deberá ejecutarse de acuerdo a la reglamentación vigente.
- El aislamiento de los cables eléctricos debe estar en perfecto estado.
- Utilizar sistemas de puesta a tierra en combinación con interruptores diferenciales y magneto térmicos.
- Exámenes periódicos de la instalación eléctrica por personal autorizado, así como las reparaciones.
- Colocar pararrayos en todos los palos y mástiles de madera.
- Si el barco está construido con material no conductor, conectar el pararrayos a una chapa de cobre fijada en el casco, muy por debajo de la línea de flotación.
- No reparar, más que por personal especializado, las averías eléctricas. • En espacios confinados y en ambientes con presencia de agua, usar equipos de bajo voltaje.
- No utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas y desconectar los equipos antes de limpiarlos.

- **Exposición al ruido**

- Comprar máquinas y equipos de trabajo con marcado CE, teniendo en cuenta el nivel de ruido que producen.
- Efectuar un mantenimiento adecuado de máquinas y herramientas.
- Aislar las fuentes de ruido, instalándolas lo más lejos posible de las zonas de trabajo.
- Reducir el tiempo de exposición mediante turnos de trabajo.
- Delimitar y señalizar las zonas de exposición al ruido.
- Utilizaremos los EPI (Elementos de Protección Individual) adecuados al nivel de ruido ambiental, que tengan marcado CE.
- Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con ruido.
- Diseñar programas de reducción de ruido, así como la realización de controles médicos.

- **Vibraciones**

- Usar materiales que atenúen las vibraciones.
- Delimitar y señalizar las zonas de exposición a vibraciones.
- Reducir el tiempo de exposición.
- Diseño ergonómico de herramientas y mantenimiento preventivo de la maquinaria.
- Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con vibraciones.
- Revisar y realizar un mantenimiento periódico de las instalaciones y equipos de trabajo (alineándolas, equilibrándolas...) para evitar las vibraciones.

- **Quemaduras por contacto**

- Apantallar y/o separar las zonas de riesgo, señalizándolas adecuadamente.
- Trabajar en espacios lo más amplios posible.
- Aislar térmicamente las superficies calientes.
- Utilizar equipos de protección individual con marcado CE en caso de manipular objetos o superficies calientes.

- **Contacto con sustancias químicas peligrosas**

- Utilizar sustancias con las mismas propiedades pero que sean menos peligrosa.
- Almacenar los productos químicos en lugares adecuados, bien ventilados, señalizando su ubicación y manteniéndolos en sus envases originales.
- Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos.
- Utilizar sólo productos etiquetados y conservar las etiquetas en buen estado.
- Establecer un plan de acción para la utilización de los productos: métodos de trabajo, protecciones colectivas, individuales, almacenamiento, higiene y limpieza antes, durante y después de la utilización.
- Evitar el contacto con la piel utilizando mezcla - dores, paletas, sistemas cerrados, homogeneizadores.
- Disponer y utilizar los equipos de protección individual, con marcado CE, según las prescripciones de uso de estos y la ficha de datos de seguridad de los productos.
- Disponer de métodos de neutralización, recogida de derrames, y de eliminación de residuos.
- Mantener los recipientes cerrados.

- Cubrir los cortes y heridas con vendajes impermeables.

- **Exposición a sustancias tóxicas o irritantes**

- Ventilación adecuada del local, ya sea natural o forzada.
- Utilizar sistemas cerrados para minimizar la liberación de contaminantes.
- Instalar sistemas de extracción localizada en el origen del foco.
- Realizar controles ambientales periódicos.
- Limpiar y reemplazar los filtros de ventiladores y extractores según las instrucciones del fabricante.
- Utilizar protección para manos, cuerpo, protectores ignífugos, bata de laboratorio, etc... por el posible contacto con ácidos y productos corrosivos.
- Utilizar equipos respiratorios de protección individual, con marcado CE, si no fuese posible o fuese insuficiente la extracción localizada.
- Elaborar y seguir las instrucciones de llenado de los contenedores.

- **Riesgo de incendio**

- Disponer sólo de la cantidad necesaria de materiales inflamables y combustibles para el trabajo del día, el resto estará en almacén o locales independientes aislados y ventilados.
- Prohibir fumar en todo el recinto.
- Señalizar y dejar libres las salidas de emergencia.
- instalación eléctrica antideflagrantes en zonas donde exista riesgo de atmósferas inflamables.
- Revisar y mantener las instalaciones eléctricas, aisladas y protegidas.
- Seguir las instrucciones del suministrador y del instalador de gases inflamables.
- Tener instalaciones fijas de extinción, realizando su mantenimiento periódico.
- Instalar sistemas de detección y alarma, de suficiente volumen para que toda la tripulación pueda oírla.
- Colocar carteles con plano de localización.
- Dotar al barco de extintores de CO_2 de activación automática en la sala de máquinas.

- **Exposición agentes biológicos (seres vivos, desechos, hongos)**

- Establecer y realizar un programa de limpieza y desinfección en el barco.
- Desinfectar periódicamente la piel.

Equipos de protección individual

- Casco de seguridad.
- Botas de goma.
- Chaleco reflectante hinchable
- Ropa de lluvia.

PLIEGO DE CONDICIONES

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD P.O. 74.24 “ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Autor: Dña. Cristina Cobalea Medina

Ingeniero Industrial- Nº Col: 980

1 Normativa

En el pliego de condiciones particulares se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Disposiciones legales y reglamentarias de aplicación:

Principios generales

- *Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 31/1995 de 8 de noviembre. BOE núm. 269 de 10 de noviembre.*

  Artículos modificados:

  - Artículo 32, por Ley 35/2014, de 26 de diciembre
  - Artículo 30.5, por Ley 14/2013, de 27 de septiembre
  - Artículos 16, 30, 31, 39 por Ley 25/2009, de 22 de diciembre
  - Artículos 5 y 26 por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
  - Artículo 3, por Ley 31/2006, de 18 de octubre
  - Artículos 9, 14, 23, 24, 29, 43 por Ley 54/2003, de 12 de diciembre
  - Artículo 26, por Ley 39/1999, de 5 de noviembre
  - Artículos 45, 47, 48, 49 por Ley 50/1998, de 30 de diciembre
  - Se derogan los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 52, por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
- *Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.*
- *Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas.*
- *Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.*
- *Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, que modifica el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.*
- *Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. BOE de 9 de agosto de 1996.*
- *Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales.*
- *Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el RD 1879/1996, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. BOE de 5 de abril de 2001.*
- *Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). BOE de 24 de febrero de 1999.*
- *Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social*
- *Orden de 9 de marzo de 1971. La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. BOE, núm. 64 de 16 de marzo. Donde solo queda vigente el capítulo VI del título II.*
- *Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores*.

- Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
- *Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE núm. 250 de 19 de octubre).*
- *Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.*
- *Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.*
- *Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.*

Servicios de prevención

- *Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. Del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE núm. 27 de 31 de enero de 1997.*
- *Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.*
- *Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.*
- *Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención*
- *Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.*
- *Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE de 1 de mayo de 1998.*
- *Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, publicado en el BOE número 285 de 29 de Noviembre de 2006.*
- *Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.*

Ergonomía

- Cargas

- *Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores (Directiva 90/269/CEE), del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE núm. 97 de 23 de abril de 1997.*
- *Convenio 127 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador.*

- Pantallas de visualización de datos

- *Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen Pantallas de Visualización. BOE núm. 97 de 23 de abril de 1997.*

Higiene industrial

- Enfermedades profesionales

- *Convenio 42 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales (revisado en 1934).*
- *Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.*
- *Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.*

Contaminantes químicos

- *Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, publicado por el BOE número 176 de 25 de Julio de 2017.*
- *Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.*

- Plomo y cloruro de vinilo

- *Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.*

- Cancerígenos

- *Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. BOE núm. 124 de 24 de mayo de 1997.*
- *Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno.*
- *Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.*

- Amianto

- *Convenio 162 de la OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad. Adoptado el 24 de junio de 1986.*
- *Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991. Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por amianto.*
- *Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.*

Contaminantes físicos

- Ruido

- *Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.*

- *Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.*
- *Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.*

- Radiaciones ionizantes

- *Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo de 1997 relativa a la protección operacional de los trabajadores exteriores con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. BOE de 16 de abril de 1997.*
- *Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes.*
- *Real Decreto 1566/1998, de 17 de julio de 1998, relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas. BOE de 28 de agosto de 1998.*
- *Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.*
- *Real Decreto 601/2019, de 18 de octubre, sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de exposiciones médicas.*
- *Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.*

- Vibraciones

- *Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.*
  - *Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.*

- Condiciones climatológicas

- *Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.*

Contaminantes biológicos

- *Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo. BOE núm. 124 de 24 de mayo de 1997.*
  - *- Orden Ministerial del 25 de marzo de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997. BOE de 30 de marzo de 1998. Y corrección de errores. BOE de15 de marzo de 1998.*

Otras disposiciones

- *Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.*
- *Real Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.*

- Residuos

- *Real Decreto 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Plan Nacional de Residuos Industriales.*
- *Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.*
- *Decisión de la Comisión 96/350/CE de 24 de mayo de 1996.*
- *Reglamento (CCE) 259/1993, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y control de los traslados de residuos en el interior y a la entrada y salida de la Comunidad Europea.*
- *Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre, y la Lista de Residuos Peligrosos, aprobada por la Decisión 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre.*
  - *- Modificada por el Real Decreto Legislativo 4/2001, de 16 de febrero, sobre el régimen de intervención administrativa aplicable a la valorización energética de harinas de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales.*
- *Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, complementa la Ley 10/1998, de 21 de abril, estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan.*

- Lugares de trabajo

- *Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, publicado en BOE de 23 de Abril de 1997.*
- *Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales BOE núm. 97 de 23 de abril de 1997.*
- *Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.*

- Etiquetado de sustancias peligrosas

- *Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. BOE de 5 de junio de 1995.*

  Modificada por:

  - *Orden de 13 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo I.*
  - *Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I.*
  - *Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes de los Anexos I, III, V y VI.*
  - *Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I y VI.*
  - *Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V.*
  - *Orden de 5 de octubre de 2000, por el que se modifican los Anexos I, III, IV y VI.*
  - *Orden de 5 de abril de 2001, por el que se modifican los Anexos I, IV, V, VI y IX*
  - *Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el artículo 13.1*
  - *PRE/2317/2002, de 11 de mayo, por el que se modifica los anexos I a VIII*
  - *Real Decreto 99/2003, de 24 de enero por el que se modifica el artículo 23.1 y el anexo XI*
  - *Orden PRE7124472006, de 20 de abril, por el que se modifican los anexos I y V*
- *Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de*

10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH).

- Señalización

- *Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas en materia de Señalización de seguridad y salud en el trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE núm. 97 de 23 de abril de 1997.*
- *IC 8.3. de Señalización de Obras en Carreteras.*

- Incendios

- *Orden de 24 de octubre de 1979 sobre protección anti-incendios en los establecimientos sanitarios.*
- *Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en establecimientos turísticos.*
- *Real Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros.*
- *Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios*
- *Orden de 27 de julio de 1999 por el que se determinan las condiciones que deben reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de mercancías.*
- *Ordenanzas Municipales.*
- *Reglamento del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentos de Gijón.*

Electricidad

- *Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.*
- *Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.*
- *Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23*
- *Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 A 23*
- *Orden de 27 de noviembre de 1987. Actualización de las Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.*
- *Orden de 23 de junio de 1988. Actualización de diversas instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT de Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.*
- *Orden de 16 de abril de 1991, por la que se modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.*
- *Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 21 de junio de 2001.*

Construcción

- *Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 256 de 25 de octubre de 1997.*
- *Ordenanza de trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica. OM de 28 agosto 1970. BOE 5, 7, 8 y 9 de septiembre de 1970. OM 28 de julio de 1977. OM de 4 de julio de 1983. Resolución de 30 de enero de 1997, de la Dirección General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del contenido de la prórroga de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, en el sector.*
- *Convenio 62 de la OIT, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación.*
- *Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, concreta en la Disposición adicional cuarta la titulación académica y profesional de los Coordinadores de Seguridad y Salud en las obras de edificación. BOE de 6 de noviembre de 1999.*
- *Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa artículo 18 de RD 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.*
- *Ordenanzas Municipales sobre Vallados de Obra, Ocupaciones de Viales, etc.*

Equipos de trabajo

- *Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE núm. 188 de 7 de agosto de 1997.*
  - *- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.*

Máquinas

- *Convenio 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria.*
- *Real Decreto 2177/2004, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales.*
- *Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, publicada por el BOE número 246 de 11 de Octubre de 2008.*
- *Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales de construcción.*
- *Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al RD 2584/1981, de 18 de septiembre de 1981.*
- *- Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial.*
- *- Reglamento (CEE) núm. 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales.*

- Grúas

- *Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre de 1985. Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos. BOE de 11 de diciembre de 1985.*
- *Orden de 26 de mayo de 1989, Instrucción Técnica Complementaria I.T.C.-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras de manutención. BOE de 9 de junio de1989.*
- *Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de Equipos de Trabajo. BOE núm. 188, de 7 de agosto de 1997.*

- *Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.*
- *Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas*
- *Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.*

- Equipos de protección individual

- *Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial*
- *Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.*
- *Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPI). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE núm. 140 de12 de junio de 1997.*

- Aparatos de presión

- *Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales, publicado en BOE número 289 de 02 de Septiembre de 2000.*
- *Real Decreto 809/20121, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias*
- *Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión*
- *Orden de 17 de marzo de 1981 por el que se aprueba la ITC MIE-AP1 referente a calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor. (Modificada por la Orden de 28 de marzo de 1985).*
- *Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles.*
- *Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE*

2 Característica de empleo y conservación de máquinas y herramientas de obra

2.1 Características de empleo y conservación de máquinas

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad de máquinas, Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre.

2.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado de Obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones dadas por el fabricante.

El Encargado de Obra cuidará que los útiles y herramientas se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para ellas y vigilará la no realización de tareas de mantenimiento de las máquinas en el interior de la obra.

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este Estudio, pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencia en su empleo. A dichas herramientas y útiles deben aplicarse las normas generales de carácter práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

3 Características, empleo y conservación de los equipos preventivos.

Dentro de los equipos preventivos, se consideran los dos grupos fundamentales: Equipos de Protección Individual (EPI) y Medios de protección Colectiva.

3.1 Equipos de protección individual

- Protectores de la cabeza:
  - Cascos de seguridad (obras públicas y construcción, minas e industrias diversas).
  - Cascos de protección contra choques e impactos.
  - Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc. , de tejido recubierto, etc.).
  - Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos, etc.).
- b).- Protectores del oído:
  - Protectores auditivos tipo "tapones"
  - Protectores auditivos desechables o reutilizables.
  - Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.
  - Casco antirruido.
  - Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria.
  - Protectores auditivos dependientes del nivel.
  - Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación.
- c).- Protectores de los ojos y de la cara:
  - Gafas de montura "universal".
  - Gafas con montura "integral" (uni o biocular).
  - Gafas de montura "cazoletas"
  - Pantallas faciales.
  - Pantallas para soldadura (de mano, de cabeza, acoplables a casco de protección para la industria).

- d).- Protección de las vías respiratorias
  - Equipos filtrantes de partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radiactivas).
  - Equipos filtrantes frente a gases y vapores.
  - Equipos filtrantes mixtos.
  - Equipos aislantes de aire libre.
  - Equipos aislantes con suministro de aire.
  - Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura.
  - Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
  - Equipos de submarinismo.
- e).- Protectores de manos y brazos:
  - Guantes contra agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
  - Guantes contra las agresiones químicas.
  - Guantes contra las agresiones de origen eléctrico.
  - Guantes contra las agresiones de origen térmico.
  - Manoplas.
  - Manguitos y mangas.
- f).- Protectores de pies y piernas:
  - Calzado de seguridad.
  - Calzado de protección.
  - Calzado de trabajo.
  - Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor.
  - Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío.
  - Calzado frente a la electricidad.
  - Calzado de protección contra las motosierras.
  - Protectores amovibles del empeine.
  - Polainas.
  - Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación, o antitranspiración).
  - Rodilleras.
- g).- Protectores de la piel
  - Cremas de protección y pomadas.
- h).- Protectores del tronco y el abdomen
  - Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión).
  - Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas.
  - Chalecos termógenos.
  - Chalecos salvavidas.
  - Mandiles de protección contra los rayos X.
  - Cinturones de sujeción del tronco.
  - Fajas y cinturones antivibraciones.
- i).- Protección total del cuerpo:
  - Equipos de protección contra las caídas de altura.
  - Dispositivos anticaidas deslizantes.
  - Arneses.
  - Cinturones de sujeción.
  - Dispositivos anticaidas con amortiguador.
  - Ropa de protección.
  - Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes).
  - Ropa de protección contra las agresiones químicas.
  - Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las radiaciones infrarrojas.

- Ropa de protección contra las fuentes de calor intenso o estrés térmico.
- Ropa de protección contra bajas temperaturas.
- Ropa de protección contra la contaminación radiactiva.
- Ropa antipolvo.
- Ropa antigás.
- Ropa y accesorios (brazalete, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescente).

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

Todo Equipo de Protección Individual, se ajustará al R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. Dichos equipos tendrán marcado "CE". Así mismo se cumplirá el Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

3.2 Equipos de protección colectiva

La protección colectiva puede definirse como: "La incorporación al medio productivo de una protección, que sirviendo para todos los trabajadores, elimina el riesgo".

Una forma de clasificar las protecciones colectivas es mediante dos grandes grupos, según protejan de riesgo de accidentes o de enfermedad del trabajo.

- Protecciones colectivas de seguridad contra el riesgo de:
  - Caídas de personas
  - Caídas de materiales y objetos
  - Caídas de vehículos
  - Sobrecargas en máquinas
  - Electricidad
  - Incendios
- Protecciones colectivas de Higiene industrial contra los riesgos de:
  - Radiaciones
  - Ruidos

- Vibraciones
- Gases
- Polvos

En esta obra se van a emplear los siguientes elementos de protección colectiva

- Vallas de protección de la zona de actuación
- Tapas de madera o metálicas: Las de madera deben tener sus elementos unidos por tablas clavadas transversalmente.
- Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel
- Extintores

Los elementos de protección colectiva y los elementos de señalización se ajustarán a las características fundamentales siguientes:

- Vallas autónomas de limitación y protección:

Tendrán como mínimo 90 cm de altura, metálicas y con pies derechos de apoyo de tal modo que conserven sus estabilidad. Estas vallas podrán utilizarse, ancladas convenientemente, para la protección de zanjas y pozos.

- Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel:

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

- Balizamientos:

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo.

- Señales de circulación:

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, B.O.E. 7.7.76) y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I.C. Señalización de Obras (Orden 31.8.87, B.O.E. 18.9.87).

Respecto a su colocación, se atenderá al Código de Circulación.

- Señales de seguridad:

Se proveerán y se colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de 9 de Marzo, por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (B.O.E. 8.7.86).

- Extintores:

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible.

Se revisarán cada 6 meses como máximo.

4 Condiciones generales

4.1 Condiciones generales de la obra

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto:

- Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la Empresa Contratista adjudicataria del proyecto.
- Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida.
- Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la Empresa Contratista.
- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el fin de garantizar su éxito.
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su administración.
- Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada.

Todo eso con el objetivo global de conseguir un desarrollo de la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

4.2 Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra

4.2.1 Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra

Estabilidad y solidez:

- Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
- El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.

Instalaciones de suministro y reparto de energía:

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustará a lo dispuesto en su normativa específica.
- Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
- En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.

Vías y salidas de emergencia:

- Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más directamente posible en una zona de seguridad.
- En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
- El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos.
- Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente.
- Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.
- En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Detección y lucha contra incendios:

- Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma.
- Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y mantendrán con regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.
- Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y manipulación. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y tendrá la resistencia suficiente.

Ventilación:

- Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente.

Exposición a riesgos particulares:

- Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).
- En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.
- En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. Al menos, quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

Temperatura:

- La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.

Iluminación:

- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente

durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de señalización.
- Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
- Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

Vías de circulación y zonas peligrosas:

- Las vías de circulación estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
- Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
- Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
- Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones.
- Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo claramente visible.

Espacio de trabajo:

- Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.

Primeros auxilios:

- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.
- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente visible indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.

Servicios higiénicos:

- Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición vestuarios adecuados.
- Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

- Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
- Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
- Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los trabajadores duchas apropiadas, en número suficiente.
- Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría.
- Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.
- Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros será fácil.
- Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.
- Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o se preverá una utilización por separado de los mismos.

Locales de descanso o de alojamiento:

- Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
- Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.
- Cuando no existan este tipo de locales, se pondrá a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
- Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.
- En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

Mujeres embarazadas y madres lactantes:

- Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

Trabajadores minusválidos:

- Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.

Consideraciones varias:

- Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean claramente visibles e identificables.
- En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
- Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

4.2.2 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en la obra en el exterior de los locales

Factores atmosféricos:

- Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud.

Vehículos y maquinaria para manipulación de materiales:

- Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales:
  - 1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
  - 2° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.
  - 3° Se utilizarán correctamente.
- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales recibirán una formación especial.
- Se adoptarán medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales.
- Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales estarán equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.

Instalaciones, máquinas y equipos:

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
- Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor:
  - 1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía.
  - 2° Se mantendrá en buen estado de funcionamiento.
  - 3° Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
  - 4° Serán manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
- Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.

Instalaciones de distribución de energía:

- Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.
- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán localizadas, verificadas y señalizadas claramente.

- Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra se desviarán fuera del recinto de la obra o se dejarán sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura.

4.2.3 Procedimientos para el control de acceso de personal a la obra

Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada jornada, en estadillos diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores:

Nombre y Apellidos:	
Entrada	**Firma:**
Salida	**Firma:**

Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.

De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra.

El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de dejar constancia documental de dicha asistencia.

El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán entregar este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.

La Autoridad Portuaria de Baleares realiza la coordinación de actividades empresariales mediante la OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES en adelante OCAE, por lo cual, todas las empresas que realicen trabajos en los recintos portuarios adscritos a esta administración promotora deberá estar homologada en OCAE, además se deberá comunicar a esta oficina OCAE las actividades que se realizaran con el periodo en el que se realice y quienes serán las empresas participantes en la actividad, para realizar una adecuada coordinación con las demás empresas que realicen trabajos en el área descrita.

5 Condiciones legales

5.1 Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y que deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita.

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.
  - A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.
  - Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
  - Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras.
  - El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley.
  - A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.
  - Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
  - Se tendrá especial atención a:

  CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a:

- Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
- Art. 15. Principios de la acción preventiva.
- Art. 16. Evaluación de los riesgos.
- Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
- Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
- Art. 19. Formación de los trabajadores.
- Art. 20. Medidas de emergencia.
- Art. 21. Riesgo grave e inminente.
- Art. 22. Vigilancia de la salud.
- Art. 23. Documentación.
- Art. 24. Coordinación de actividades empresariales.
- Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
- Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

CAPÍTULO IV : Servicios de prevención

- Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales.
- Art. 31.- Servicios de prevención.

CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores.

- Art. 33.- Consulta a los trabajadores.
- Art. 34.- Derechos de participación y representación.
- Art. 35.- Delegados de Prevención.
- Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
- Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
- Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud.
- Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
- Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones.

- Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad.
- Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Art. 44.- Paralización de trabajos.
- Art. 45.- Infracciones administrativas.
- Art. 46.- Infracciones leves.
- Art. 47.- Infracciones graves.
- Art. 48.- Infracciones muy graves.
- Art. 49.- Sanciones.
- Art. 50.- Reincidencia.
- Art. 51.- Prescripción de las infracciones.
- Art. 52.- Competencias sancionadoras.
- Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo.
- Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos

reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Especial atención al siguiente artículo del Real Decreto:

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales.

CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva.

CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas.

Afectado por:

- RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia
- RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- RD 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.
- RD 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a:
  - Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado en la obra.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
  - Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en el que se introduce la disposición adicional única: *Presencia de recursos preventivos en obras de construcción.*
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
  - Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del artículo 18 de dicho RD 1627/1997.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
  - Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración de las actuaciones preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los escombros ocasionados en la obra.
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en especial a:
  - Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales.
  - Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:

- Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre señalizaciones, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 2/2015.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización en Seguridad y Salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.
- Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

- Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de riesgos laborales.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
- Real Decreto 833/1988, sobre residuos tóxicos y peligrosos.
- Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.
- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 2/2015.
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (en aquellos artículos no derogados y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente):

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la misma:

TÍTULO I: El Título I ha quedado totalmente derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley PRL 31/1995)

TÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE LOS MECANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El título II permanece en vigor siempre y cuando no se oponga a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hasta que se dicten los Reglamentos oportunos que cita el artículo 6 de la referida Ley, entre ellos el RD 1627/1997 que anteriormente ya se ha especificado y el cual exige este documento de seguridad.

Posteriormente el Real decreto 486/1997, declara derogados expresamente los Capítulos I , II, III, IV, V y VII de este Título II. No obstante, esta derogación no tiene efecto para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Por lo tanto este Título II todavía puede considerarse en vigor en algunos casos específicos como lo es en la Construcción, ya que el propio RD 486/1997 en su Artículo 1. Objeto, establece con estas misma palabras:

…….este Real Decreto 486/1997 no será de aplicación a: ***Las obras de construcción temporales o móviles.***

Es decir, que en consecuencia están vigentes en las obras de construcción los siguientes capítulos de la OGSHT:

Capítulo Primero.- Edificios y locales. Art.13 al 33.

Capítulo II.- Servicios permanentes. Art. 34 al 37.

Capítulo III.- Servicios de higiene. Art. 38 al 42.

Capítulo IV.- Instalaciones sanitarias de urgencia. Art. 43.

Capítulo V.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. Art. 44 al 50.

Capítulo VI.- Electricidad. Art. 51 al 70. (siempre que no se contrapongan al REBT aprobado por el **Real Decreto 842/2002**, el cual ya ha sido comentado anteriormente).

Capítulo VII.- Prevención y extinción de incendios. Art. 71 al 82.

Capítulo VIII.- Motores, transmisiones y máquinas. Art. 83 al 93.

Capítulo IX.- Herramientas portátiles. Art. 94 al 99.

Capítulo X.- Elevación y transporte. Art. 100 al 126.

Capítulo XI.- Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. Art. 127 al 132.

Capítulo XII.- Trabajos con riesgos especiales. Art. 133 al 140.

Capítulo XIII.- Protección personal. Art. 141 al 151.

TÍTULO III.: El Título III ha quedado derogado según la Disposición Derogatoria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrán en vigor los capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI "Seguridad en caso de incendio":

Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio.

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Este RD deroga la siguiente normativa:
  - Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

  - Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
  - Reglamento de aparatos elevadores para obras, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1977.
- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de los equipos de protección individual.
- Resolución de 21 de Septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo del sector de la construcción.
- Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación.
- Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.
- Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones.
- ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

VI Convenio Colectivo del sector de la construcción, en especial a los artículos y puntos tratados en el siguiente cuadro:

VI Convenio Colectivo del sector de la construcción

Artículo 20.- Vigilancia y control de salud.

Artículo 67.- Jornada. La jornada ordinaria anual será la que se establece a continuación:

1.736 horas / año

Artículo 78.- Personal de capacidad disminuida.

Capítulo XII: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la Seguridad y Salud de los trabajadores).

Capítulo I. Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo

Libro II: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la construcción

En general todos los Títulos, pero en especial el ***Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.***

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado con la seguridad y salud.
- Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

En especial con relación a los riesgos higiénicos:

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (Corrección errores B.O.E. 71; 24.03.06)
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- Modificación del R.D. 665/1997 por el Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del Ministerio de la Presidencia.
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
- Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico el Real Decreto 664/1997.
- Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada.
- Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. (Corrección de errores. B.O.E. 129; 30.05.01 y B.O.E. 149; 21.06.01)
- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (Corrección de errores B.O.E. 264; 04.11.99)
- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
- Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (Corrección de errores B.O.E. 56; 05.03.03).
- Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

- Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.
- Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

En especial con relación a los riesgos Ergonómicos:

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

5.2 Otras especificaciones para la obra proyectada

- El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor (Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
- El Estudio Básico de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio será visado en el Colegio profesional correspondiente y quedará documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad.
- El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal.
- La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados.
- Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no

incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

- El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
- Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa.
- La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero.
- El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.
- El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Las empresas de esta obra (contratistas y subcontratistas), deberán tener en cuenta y cumplir los requisitos exigibles a los contratistas y subcontratista, en los términos establecidos por la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y muy en especial las especificaciones establecidas en el CAPÍTULO II: Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción, así como por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIÓN DE LOS MISMOS:

El Contratista, está obligado a realizar las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, con su Servicio de Prevención, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos, o que pudieran detectarse durante la ejecución de la obra.

Se ofrece aquí una relación no exhaustiva de los mismos:

- Cantidad de oxígeno en las excavaciones de túneles o en mina.
- Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina.
- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
- Presencia de amianto en operaciones de excavación, demolición, derribo y/o rehabilitación.
- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.
- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos en la atmósfera, (pinturas, barnices, lacas, etc.).
- Productos de limpieza utilizados en fachadas.
- Productos fluidos de aislamiento.

- Proyección de fibras.

Todas mediciones y evaluaciones necesarias para garantizar las condiciones de higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de los aparatos técnicos especializados con control de calibración, y manejados por personal debidamente cualificado.

Los informes de estado y evaluación, serán entregados a la Coordinación de Obra y a la Dirección Facultativa, para su estudio y análisis de decisiones.

EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD A LAS INICIALMENTE PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, siempre que lo considere conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad, utilizará los siguientes criterios técnicos:

- 1º Respecto a las protecciones colectivas:
  - 1. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidido inicialmente.
  - 2. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la propuesta a sustituir. Pues se entiende que a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos.
  - 3. Una protección colectiva no será sustituida por equipos de protección individual.
  - 4. No aumentará los costos económicos previstos.
  - 5. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
  - 6. No será de calidad inferior a la prevista inicialmente.
  - 7. Las soluciones previstas, que estén comercializadas y ofrezcan garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos, la realización de las pruebas de carga que corresponda y la firma de un técnico competente que se responsabilice de su cambio.
- 2º Respecto a los equipos de protección individual:
  - 1. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas inicialmente.
  - 2. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad, de las prestaciones y mejore la seguridad.
- 3º Respecto a otros aspectos contemplados para la obra:
  - 1. En el Plan de Seguridad y Salud, se incluirá el documento de 'Coordinación de actividades empresariales de la obra', dando una copia del mismo a todas las empresas participantes del proceso constructivo, y cuyo contenido y estructura se ajusta a las recomendaciones de la 2ª Edición de la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la obras de construcción, donde se ofrecen criterios para aplicar el RD 1627/1997 en esta obra:
- Medidas concretas a implantar para controlar los riesgos derivados de la concurrencia de empresas: Para contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

- Forma de llevar a cabo la coordinación de actividades empresariales dentro de la obra: Estableciendo los medios de coordinación concretos, actuaciones encaminadas a coordinar las actuaciones de las empresa, etc.
- Definición de las obligaciones preventivas para cada una de las empresas que intervienen en la obra.
- Cauces de comunicación entre empresas y trabajadores autónomos: Implementando las TICs en las obras, y aportando herramientas que facilitan esta implantación.
- Planificación de las actividades preventivas integradas en el planning de obra: Estableciendo las fechas de implantación y retirada de los medios de protección colectiva (Barandillas, Redes, Marquesinas, Cierre de obra, etc.), de la señalización, de las instalaciones o locales anejos, etc.
- Implantación en obra del Plan de Seguridad: Definiendo responsabilidades y funciones, coordinando y protocolizando las actuaciones en la obra y estableciendo los procesos y procedimientos en materia de Seguridad y Salud durante el proceso constructivo.

CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:

A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

- Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.

B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995).

- Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
- Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala:

De 50 a 100 trabajadores	2 Delegados de Prevención
De 101 a 500 trabajadores	3 Delegados de Prevención
De 501 a 1.000 trabajadores	4 Delegados de Prevención
De 1.001 a 2.000 trabajadores	5 Delegados de Prevención
De 2.001 a 3.000 trabajadores	6 Delegados de Prevención
De 3.001 a 4.000 trabajadores	7 Delegados de Prevención
De 4.001 en adelante	8 Delegados de Prevención

- En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
- A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
  - a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
  - b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.
- Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los Delegados de Prevención:

- a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
- d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

- En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.

- En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
  - a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
  - b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está, sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
  - c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
  - d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  - e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
  - f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
  - g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
  - h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
  - i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

- j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

- Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.
- La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
- En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995)

- En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
- Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
- Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.
- Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.
- Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
- Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.
- En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
- El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentarios establecidos.
- Los Servicios de prevención ajenos, según Artículo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma,

sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

- Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece:
- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
  - a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
  - b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
  - c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
  - d) La información y formación de los trabajadores.
  - e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
  - f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

D) RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA

D1) Funciones que deberán realizar.

- Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales), estos deberán:
  - Tener la capacidad suficiente
  - Disponer de los medios necesarios
  - Ser suficientes en número
- Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.
- La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.
- En el documento de la Memoria de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifican detalladamente aquellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria su presencia por alguno de estos motivos:
  - Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
  - Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
- Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico

D2) Forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.

- Para dar cumplimiento al Artículo segundo del RD 604/2006 sobre Modificación del Real Decreto 1627/1997, por el que se introduce una disposición adicional única en el RD 1627/1997, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos se realizará del siguiente modo:

- En el documento de la Memoria de Seguridad se detallan las unidades de obra para las que es necesaria su presencia, (en función de los Artículo 1 apartado Ocho del R.D. 604/2006).
- Si en una unidad de obra es requerida su presencia, igualmente en el documento de la Memoria de Seguridad se especifican muy detalladamente mediante un check-list, las actividades de Vigilancia y Control que deberá realizar el recurso preventivo.
- Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
- Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997.

5.3 Obligaciones en relación a la ley 32/2006

A) Registro de Empresas Acreditadas.

Tal como se establece en el Artículo 3 del RD 1109/2007, las empresas de esta obra, con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas", dependiente de la autoridad laboral competente.

A tal fin deberán proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral".

Las empresas comitentes exigirán esta certificación relativa a dicha inscripción en el Registro, a todas sus empresas subcontratistas dentro del mes anterior al inicio de la ejecución del contrato.

La certificación deberá ser oficial, es decir emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días naturales desde la recepción de la solicitud y tal como se establece en la actual normativa, tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada.

La exigencia de este certificado por la empresa comitente será obligatoria en la obra, para cumplir con el deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa subcontratista de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

Con dicho acto, la empresa comitente quedará exonerada legalmente durante la vigencia del contrato y con carácter exclusivo para esta obra de construcción, de la responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley, para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista de las obligaciones de acreditación y registro.

B) Porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido.

Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en

la obra deberán contar, en los términos que se establecen en el RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.

No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: no será inferior al 30%.

A efectos del cómputo del porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido que se establece, se han aplicado las siguientes reglas:

- a) Se toma como período de referencia los doce meses naturales completos anteriores al momento del cálculo.
- No obstante, en empresas de nueva creación se tomarán como período de referencia los meses naturales completos transcurridos desde el inicio de su actividad hasta el momento del cálculo, aplicando las reglas siguientes en función del número de días que comprenda el período de referencia.
- b) La plantilla de la empresa se calculará por el cociente que resulta de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa.
- c) El número de trabajadores contratados con carácter indefinido se calculará por el cociente que resulte de dividir por trescientos sesenta y cinco el número de días trabajados por trabajadores contratados con tal carácter, incluidos los fijos discontinuos.
- d) Los trabajadores a tiempo parcial se computarán en la misma proporción que represente la duración de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable.
- e) A efectos del cómputo de los días trabajados previsto en las letras anteriores, se contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los permisos retribuidos y días festivos, las vacaciones anuales y, en general, los períodos en que se mantenga la obligación de cotizar
- f) En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serán computados de manera análoga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:
- a) La duración de su vínculo social.
- b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial, y
- c) A que hayan superado la situación de prueba o no.

La empresa comitente recibirá justificación documental por escrito mediante acta en el momento de formalizar la subcontratación, y en la que se manifieste el cumplimiento de los porcentajes anteriores.

C) Formación de recursos humanos de las empresas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

Conforme se especifica en el VI Convenio colectivo del sector de la construcción, el requisito de formación de los recursos humanos a que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre y en el

RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas las empresas participantes mediante alguna de estas condiciones:

- a) Tarjeta Profesional de la Construcción: Conforme lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley 32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, será exigible la cartilla o carné profesional mediante la denominada 'Tarjeta Profesional de la Construcción' (TPC), cuyo objetivo es implantarse como única vía de acreditación y es la preferentemente exigible en esta obra.
- b) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en las obras de construcción.
- c) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y decisiones: Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la Fundación Laboral de la Construcción, la autoridad laboral o educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

- 1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la Construcción.
- 2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa.
- 3.º Obligaciones y responsabilidades.
- 4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención.
- 5.º Legislación y normativa básica en prevención.

D) Libro de subcontratación

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido.

El Libro de Subcontratación será habilitado por la autoridad laboral correspondiente.

Se anotará en el mismo a la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra, conforme se establece en el RD 337/2010.

En dicho Libro de subcontratación el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, conteniendo todos los datos que se establecen en el Real Decreto 1109/2007 y en el Artículo 8.1 de la Ley 32/2006.

El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra.

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:

- a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación.
- b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de Subcontratación.
- c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.
- d) En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio.

El contratista conservará en su poder el original.

Procedimiento a realizar en cada subcontratación

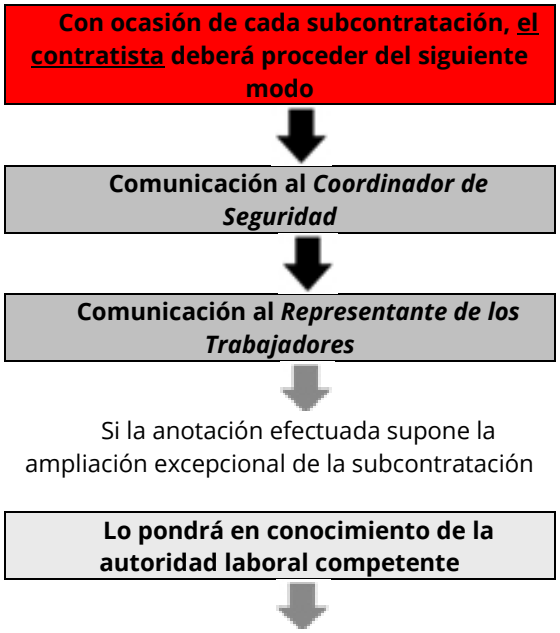

Si la obra de edificación se le aplica la *Ley 38/1999, de 5 de noviembre*

Entregar una copia para que se incorpore al *Libro del Edificio.*

E) Libro registro en las obras de construcción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, la obligación de la empresa principal de disponer de un libro registro en el que se refleje la información sobre las empresas contratistas y subcontratistas que compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, establecida en el artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es cumplida en esta obra de construcción incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, mediante la disposición y llevanza del Libro de Subcontratación por cada empresa contratista.

F) Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que son tenidas en cuenta en esta obra.

Anotaciones en el libro de incidencias

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

6 Condiciones facultativas

6.1 Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra proyectada relativas a contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones:

- Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.
- Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las

condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.

- Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.
- Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo establecido.
- Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.
- Conforme se establece en el VI CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN, en su Artículo 18.- Ingreso en el trabajo: Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de trabajos en esta obra, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 referente al contrato para la formación.
  - Por lo tanto y atendiendo a dicho artículo, los trabajadores menores de 18 años en esta obra, no podrán ser contratados salvo mediante un contrato de formación (Art. 25.4).
  - Para dichos trabajadores, se deberá establecer un riguroso control y seguimiento en obra, tal como se establece en la LPRL, en el Artículo 27: Protección de los menores :
  - Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.
  - A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
  - En todo caso, se informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud.

Menores de 18 años NO PUEDEN
- Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 6:00 AM) - Realizar más de 8 horas de trabajo - Realizar horas extraordinarias - Manejar un vehículo de motor - Operar una carretilla elevadora - Manejar y / o utilizar maquinaria de obra accionada por motor. - Colaborar en trabajos de demolición o apuntalamiento - Trabajar donde exista riesgo de exposición a radiación (en presencia de trabajos de soldadura)

Menores de 18 años SI DEBEN
- Cumplir todas las normas de seguridad establecidas - Usar y mantener los equipos de protección individual que se le faciliten, atendiendo a las instrucciones dadas - Informar de inmediato a su superior sobre cualquier peligro de seguridad o salud que detectase.

- Trabajar a una altura superior a 4,00 m, a no ser que se encuentre en piso continuo, estable y suficientemente protegido. - Trabajar en andamios. - Transportar a brazo cargas superiores a 20kg. - Transportar con carretilla cargas superiores a 40kg.	

- Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra, de tal manera que no se vean expuestas a riesgos que puedan causar daños o secuelas.

Mujeres embarazadas NO PUEDEN	**Mujeres embarazadas SI DEBEN**
- Realizar trabajos nocturnos (20.00 PM a 6:00 AM) - Realizar más de 8 horas de trabajo - Realizar horas extraordinarias - Colaborar en trabajos de demolición o apuntalamiento - Trabajar donde exista riesgo de exposición a radiación (en presencia de trabajos de soldadura) - Trabajar en lugares o actividades donde exista riesgo de caídas al mismo nivel o a distinto nivel. - Trabajar en lugares o actividades donde exista el riesgo de golpes o atrapamientos - Trabajar en andamios. - Transportar a brazo cargas	- Cumplir todas las normas de seguridad establecidas - Usar y mantener los equipos de protección individual que se le faciliten, atendiendo a las instrucciones dadas - Rechazar trabajos que puedan suponer un riesgo para su salud - Informar de inmediato a su superior sobre cualquier peligro de seguridad o salud que detectase.

- Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral.
- Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.
- Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.
- Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.
- Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras.

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de:

- **<u>1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:</u>**

Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio Básico de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.

- **2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD:**

Conforme establece el Real Decreto 337/2010 Artículo tercero (Modificación del Real Decreto 1627/1997), la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud.

- **3º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:**

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que desarrollan dicha actividad.

Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte.

- **4º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES:**

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados.

En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.

- **5º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:**

Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.

- **6º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD:**

Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma.

7º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:

Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra.

- **8º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:**

Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por:

- Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista
- Recursos Preventivos.
- Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o trabajadores Autónomos.
- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan.

- **9º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:**

El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones Particulares: Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra.

- **OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO:**

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.)

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.

El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad.

En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra":

- a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
  - 1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
  - 2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
- c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

- d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.
- e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de:

- a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
- b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.
- c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores.
- d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes de la obra.

Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a su utilización.

Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá:

- a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las empresas participantes en la obra.
- b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud.
- c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD.

El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:

- Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.
- Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.
- Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.
- Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema organizativo implantado en obra.
- Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales de la misma.
- Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra.
- Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de ejecución de obras (Arquitecto Técnico), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:

- el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa,
- la Empresa Subcontratista,
- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y
- a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD.

Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo:

- Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de Seguridad y Salud.
- Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su empresa en su especialidad.
- Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.
- Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista.
- Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones mensuales de la misma.
- Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a su especialidad.
- Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y colectivas.
- Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.

La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones:

- Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
- Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos.
- Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en el Plan.
- Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra.
- Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con respecto a su actuación en la obra.
- Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave.
- Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.
- Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las medidas de prevención.
- Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.
- Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual.

E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal.

El empresario Principal antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información a los trabajadores.

A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad.

El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud recogerá y habrá tenido en cuenta:

- a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico.
- b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal.
- c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos.

- d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de riesgos.

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra.

Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán:

- a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
- b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7.
- c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
- d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
- e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales:

- a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.
- b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo.
- c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.
- d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva,

considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.

- e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.

Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario Principal deberán:

- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio Básico de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.
- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
- Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.

Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004).

Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra deberán en sus contratos tener presente el CAPÍTULO II Normas generales sobre subcontratación en el sector de la construcción y en especial las establecidas en el Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción:

Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos prefabricados; acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de pintura y limpieza; saneamiento.

Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán:

- Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación como contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas contratistas".
- Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la Dirección Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral".
- Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla.

No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los siguientes porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: no será inferior al 30%.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos.

Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido.

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.

Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente:

- Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
  - a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.
  - b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
  - c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  - d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
  - e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.

- f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
- Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:
  - Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio Básico de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.
  - Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.
  - Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS.

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.

De este modo, la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo.

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes:

- Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
- Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997

6.2 Vigilancia de la Salud

6.2.1 Accidente laboral

ACTUACIONES

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.

En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:

- a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.
- b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
- c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.
- d) En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia. Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita y según el buen criterio de las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.
- e) Se publicará la infraestructura sanitaria de la obra, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación en caso de accidente. Para ello se instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se informe a los trabajadores sobre el centro asistencial más próximo, su dirección, teléfonos de contacto, itinerario, etc.

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES :

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES:

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra.

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible.

COMUNICACIONES

Comunicaciones en caso de accidente laboral:

- A) Accidente leve.
  - Al Coordinador de Seguridad y Salud.

    - A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
    - A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
- B) Accidente grave.
    - Al Coordinador de seguridad y salud.
    - A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
    - A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.
- C) Accidente mortal.
    - Al Juzgado de Guardia.
    - Al Coordinador de Seguridad y Salud.
    - A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
    - A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.

7 Condiciones técnicas

7.1 Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso, comedores y primeros auxilios

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente:

- A) Vestuarios (siempre que no sea posible que el trabajador se presente en la obra con el uniforme de trabajo). Estarán dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.
    - Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios.
    - La altura libre a techo será de 2,30 metros.
    - Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione.
    - La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo.
    - Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente.
- B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos e inodoro
    - Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.
    - La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.
    - La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo.
    - En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.

  - Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.
- C) Comedor (en el supuesto de que el contratista .no presente un convenio con algún local de restauración y/o ocio cercano a la zona de actuación donde el personal de obra pueda comer). Dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras. La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.
  - Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.
  - Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada.
  - Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa.
- D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real Decreto 486/1997:
  - desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil salicílico, etc...)
  - gasas estériles
  - algodón hidrófilo
  - venda
  - esparadrapo
  - apósitos adhesivos
  - tijeras
  - pinzas
  - guantes desechables

Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas desechables y termómetro clínico.

Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de Accidentes y Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc.

En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR

- Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.
- La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de empezar la obra.
- Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

- Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.
- La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.
- La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual.

7.2 Requisitos de los equipos de protección individual y sus accesorios en cuanto a su diseño, fabricación, utilización y mantenimiento

7.2.1 Condiciones técnicas de los EPI

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Los EPI's deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los equipos de protección individual (EPI's), el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI's fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto.

El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992.

Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones:

- A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre- y deberán cumplir con lo expresado en el Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- B) Solo los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia.
- C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores.
- D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos.

- E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.
- F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra.
- G) Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se ajustarán a lo previsto en los folletos explicativos y de utilización de cada uno de sus fabricantes, que se certificará haber hecho llegar a cada uno de los trabajadores que deban utilizarlos.

ENTREGA DE EPIS:

- Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos.
- El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo.

7.3 Requisitos de los equipos de protección colectiva

7.3.1 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a continuación.

- Vallado perimetral de la obra: revisiones diarias.
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente).
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, etc. (semanalmente).

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Instalación eléctrica provisional de obra:
  - Red eléctrica:
    - La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.
    - Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4.
    - En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24
    - Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
  - b) Interruptor diferencial de 30 mA:

        - Interruptor diferencial de 30 mA para la red de alumbrado, instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
        - Serán nuevos, a estrenar
        - El interruptor diferencial de 30 miliamperios será del modelo establecido por el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra. Instalación.
        - Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.
        - Se comprobará diariamente, que no han sido puenteados. En caso afirmativo: se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.
    - c) Interruptor diferencial de 300 mA:
        - Serán nuevos, a estrenar
        - Interruptor diferencial de 300 mA para la red de fuerza, instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.
        - Se comprobará diariamente, que no han sido puenteados. En caso afirmativo: se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.
    - d) Toma de tierra:
        - Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.
        - Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 Mm.
        - Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo.
- Vallado de obra:
    - Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.
    - Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra
- Protección contra incendios:
    - En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales.
    - Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan de Emergencia.

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo una atención especial a la señalización.

- B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.
- C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.
- D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
- E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección de obra.
- F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se observen deterioros con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema.
- G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra.
- H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas.
- I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto
- J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de un riesgo idéntico.
- K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra.
- L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección.

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la utilización de las protecciones.

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso.

7.4 Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, seguridad vial, etc.

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización:

- BALIZAMIENTO

Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

- ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES

En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases.

- SEÑALES

Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

- <u>Señalización de obra.</u>

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales.

- <u>Señalización vial.</u>

Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.

- Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC.
- En el montaje de las señales deberá tenerse presente:
  - Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal.
  - Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán con esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es

una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente.

7.5 Requisitos para la correcta utilización y mantenimiento de los útiles y herramientas portátiles

- Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras.
- Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro.
- Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra.
- Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
- Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin de garantizar la reposición de los mismos.
- En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad.
- El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.
- Correcta utilización de herramientas de albañilería en general. Las herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomada, etc.) están sujetas a riesgos. Para evitarlos, deberán seguirse los pasos que se expresan a continuación:
    - Las paletas, paletines o llanas, pueden originar cortes, para evitarlos, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo más ajustados posible.
    - Utilice calzado de seguridad para evitar lesiones en caso de que se le caiga una herramienta.
- Correcta utilización de herramientas manuales. Las herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca, alicates, etc.) están sujetas a riesgos. Para evitarlos, deberán seguirse las medidas preventivas indicadas en el apartado correspondiente incluido en la memoria de este documento.

7.6 Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de los medios auxiliares

- Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra. Deberá reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra.
- Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser preferiblemente nuevos, dispondrán obligatoriamente de marcado CE (en casos excepcionales si no disponen de marcado CE, deberán ser homologados por organismo competente). En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta.
- Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento para el uso por todo el personal de los medios auxiliares que se van a utilizar en la obra.

Carretón o carretilla de mano

- Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el uso de carretillas de mano:
  - Para cargar la carretilla, flexione ligeramente las piernas, sujete firmemente los mangos y elévese de manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla, empuje y transporte el material.
  - Para descargar la carretilla, repita la misma maniobra anterior, pero en sentido inverso.
  - Cargue siempre la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
  - Si debe salvar obstáculos o desniveles, debe preparar una pasarela de al menos 60 cm. de ancho, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede accidentarse por sobreesfuerzo.
  - Evite la conducción de las carretillas con objetos que sobresalgan por los lados, es peligroso y puede chocar en el trayecto y accidentarse.
  - El camino de circulación debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar el contenido.
  - Debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante si transita por lugares en los que están trabajando con máquinas.

Contenedor de escombros

- Procedimiento de seguridad obligatorio para la descarga y ubicación del contenedor de escombros en obra.
  - Controlar los movimientos de descarga para que se realicen según las instrucciones del operario del camión de transporte.
  - Subir y bajar del camión solo por los lugares establecidos por el fabricante para este fin.
  - No saltar nunca desde la plataforma de transporte al suelo, puede fracturarse algún hueso.
  - Suba a la plataforma solamente si es necesario para soltar las mordazas de inmovilización del contenedor.
  - Apártese a un lugar seguro y ordene el inicio de la maniobra de descarga. El contenedor quedará depositado sobre el suelo.
  - Situarlo en el lugar adecuado para su función, evitando sobreesfuerzos. En este sentido instale un tráctel amarrado por un extremo a un punto fuerte y por el otro al contenedor y muévalo por este procedimiento.
  - Cargar el contenedor sin colmo, enrasando la carga, después avisar al camión para su retirada.
- Procedimientos de seguridad y salud obligatorios, para la utilización en obra del contenedor de escombros.
  - Cubran el contenedor con una lona contra los vertidos accidentales de la carga.

- Por el sistema explicado de tracción con tráctel, esta vez amarrado al contenedor y a uno de los anclajes de la plataforma de carga del camión, realicen los movimientos necesarios para que el mecanismo de carga pueda izarlo.
- Apártense a un lugar seguro mientras se realiza la carga.
- Para la realización de las maniobras descritas en los dos apartados anteriores, es necesario que utilicen el siguiente listado de equipos de protección individual: casco, gafas contra el polvo, guantes de cuero, botas de seguridad, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo.

7.7 Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria

- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
- Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:

- Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra..
- Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.
- Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la reposición de los mismos.
- En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad.

- El control afectará a toda máquina y se realizará por el empresario responsable de la misma asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios.
- En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones establecidas, exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio.

7.8 Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de las instalaciones provisionales

7.8.1 Requisitos de las instalaciones eléctricas

- La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.
- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles.
- Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles.
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
- Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados.
- Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber:
  - Azul claro: Para el conductor neutro.
  - Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección.
  - Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.
- En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza.
- Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados.
- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

- Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta:
  - Medidas de protección contra contactos directos:
    - Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
  - Medidas de protección contra contactos indirectos:
    - Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continúa.
    - Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual.

7.8.2 Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de lo siguiente:

- Servicios higiénicos dotados de lavamanos e inodoro.
- Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente.
- Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas.

  Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.

Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.

Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.

La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.

La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual de la zona.

7.8.3 Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios

Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado cumplimiento, estando prohibido en la obra:

- a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno.
- b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables.
- c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización.
- d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas.

La existencia de extintores de incendio en la obra es obligatoria, como medida de prevención frente a el riesgo de incendio.

En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este Pliego de condiciones particulares: Plan Emergencia de la Obra.

Condiciones de los extintores de incendio de la obra:

- Los extintores serán para los fuegos de las Clases "A", "B", "C" y los de CO2 especiales para fuegos eléctricos.
- Lugares de la obra en los que se instalarán los extintores de incendios:
  - Servicios de higiene y bienestar (vestuario).
  - Comedor del personal de la obra.
  - Local de primeros auxilios.
  - Oficinas de la obra.
  - Almacenes con productos o materiales inflamables.
  - Cuadro general eléctrico.
  - Cuadros de máquinas fijas de obra.
  - Almacenes de material.
  - En todos los talleres.
  - Acopios especiales con riesgo de incendio (papel y cartón).
- Está prevista, además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras, oxicorte y aquellos otros que pueden originar incendios.
- Mantenimiento de los extintores de incendios
  - Los extintores serán revisados, retimbrados y mantenidos conforme las especificaciones del fabricante. Se deberá concertar con una empresa acreditada para realizar estos mantenimientos y revisiones.
- Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
  - Se instalarán colgados o sobre carro, según las necesidades previstas.
  - En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".
  - Al lado de cada extintor, existirá un rótulo, que mostrará las Normas para utilización del extintor:

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR DE INCENDIOS

- En caso de incendio, descuelgue el extintor.
- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
- Colóquese en la misma dirección que el viento, evitando que las llamas o el humo vayan hacia usted.
- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.
- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 112 lo más rápidamente que pueda, informando sobre la magnitud y gravedad de los hechos.

7.9 Índices de control

En esta obra se llevarán los índices siguientes:

Índice de incidencia

Definición: número de trabajadores con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

$$\text{Cálculo I.I.} = \frac{\text{Nº de accidentes con baja}}{\text{Nº de trabajadores}} \times 100$$

Índice de frecuencia

Definición: número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas trabajadas.

$$\text{Cálculo I.F.} = \frac{\text{Nº de accidentes con baja}}{\text{Nº de horas trabajadas}} \times 1000000$$

Índice de gravedad

Definición: número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

$$\text{Cálculo I.G.} = \frac{\text{Nº de jornadas perdidas por accidente con baja}}{\text{Nº de horas trabajadas}} \times 1000$$

Duración media de incapacidad

Definición: número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

$$\text{Cálculo D.M.I.} = \frac{\text{Nº de jornadas perdidas por accidente con baja}}{\text{Nº de accidentes con baja}}$$

Estadísticas:

- Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas.
- Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias.
- Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.

Málaga, agosto del 2024

Autor: Dña. Cristina Cobalea Medina
Ingeniero Industrial- Nº Col: 980

ANEJO Nº 2: ANTECEDENTES

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

IDOM

ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS EN EL PERIODO DE 2023 Y 2024

Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

P.O.74.24

Anejo 2. Antecedentes

Julio de 2024

Encargo P/103731

TABLA DE REVISIONES

Edición	Fecha	Redactado	Revisado	Destinatario
1	01/10/2023	ACA	CTF	APB – Autoridad Portuaria de Baleares

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. PUERTO DE ALCUDIA 4

3. PUERTO DE MAÓ 5

4. PUERTO DE EIVISSA 6

5. PUERTO DE LA SAVINA 7

1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente anejo se incluyen las fichas extraídas de los Planes Estratégicos para la mejora de la accesibilidad en los edificios del ámbito portuario de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

Cabe destacar que los informes se prepararon con anterior normativa de accesibilidad, ORDEN VIV/561/2010, ya derogada, así como con normativa portuaria específica de accesibilidad "Manual Técnico de Accesibilidad en el Ámbito Portuario".

En el presente proyecto se ha actualizado conforme a la normativa vigente, Orden TMA/851/2021. Por lo tanto, existen ciertos umbrales admisibles que difieren ligeramente de lo indicado en las fichas incluidas en el presente Anejo Nº1 Antecedentes, los cuales se han tenido en cuenta en la propuesta de medidas incluidas.

De igual manera, en los informes se definen itinerarios peatonales accesibles que tras analizarse en detalle y siguiendo indicaciones de la APB, no se han considerado en el presente proyecto, bien por existir rutas alternativas accesibles a los mismos o bien por no considerarse un itinerario accesible (como sería el caso de espaldones de diques).

2. PUERTO DE ALCUDIA

E2 2			
PUERTAS DE ACCESO			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	EDIFICIO DE VESTUARIOS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

El acceso a la edificación es el punto de conexión entre el espacio exterior y edificado. En esta ficha se trata de especificar la identificación y localización de la puerta de acceso y salida del Edificio de vestuarios.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Mínimo un acceso accesible en cada edificios, a ser posible a coincidir con el acceso principal.			Escalón en acceso sin espacio de aproximación Ø ≥150 cm
-	Si hay accesos no accesibles, el recorrido hasta el acceso accesible más próximo deberá estar señalizado según las condiciones del Bloque 5			No hay
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			Mecanismo a presión
SÍ	Puertas abatibles o correderas. No admisibles giratorias. No recomendadas puertas batientes automáticas.			Puerta abatible
-	Puertas batientes situadas en acceso a ser posible con barra de accionamiento horizontal en ambas caras.y resorte o dispositivo de cierre automático.			Sin barra de accionamiento horizontal
-	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente sobre máquinas.(Directiva 98/37/CE)			
-	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura			
	Dimensionado			
SÍ	Discontinuidades umbral ≤2 cm, achaflanadas a 45°.			No hay discontinuidades
NO	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm		Escalón en acceso
SÍ	Altura libre	≥210 cm	236 cm	
SÍ	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja. Recomendable 90 cm	≥80 cm	84 cm	
SÍ	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm	103 cm	
-	Altura barra de accionamiento puertas baitentes	80 cm ± 5 cm,		No hay
SÍ	D mecnaismo apertura hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	≥40 cm	
SÍ	F apertura puerta salida ≤25 N (≤65 N cuando sean resistentes al fuego)		≤25	
-	Señalización en puertas de vidrio, franjas	Altura1: 120 cm Altura2: 170 cm		
	Acabados			
NO	Itinerario Ficha E.1	E.1		
SÍ	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8	C7-C8		
SÍ	Banda diferenciada cromáticamente en el contorno hueco			
-	Puertas de vidrio y fachadas de vidrio diferenciadas entre sí			No hay

CONCLUSIONES

Puertas de acceso no accesibles. Será necesario substituir la puerta por otra con un ancho de paso mínimo de 80 cm y alto de 210 cm. Las puertas batientes situadas en acceso deben llevar, siempre que sea posible, una barra de accionamiento, de lado a lado, por ambas caras y a una altura de 80 cm ± 5 cm, así como unresorte o dispositivo de cierre automático que evite que queden entreabiertas. Se asegurará un espacio horizontal previo y posterior a la puerta de acceso donde se pueda incribir un círuclo de diámetro de 150 cm.

IMÁGENES

E3 1			
VESTÍBULOS			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-EDIFICIO DE OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los vestíbulos son espacios en los que se realiza la transición entre el exterior y el interior de la edificación y la accesibilidad es fundamental para garantizar el acceso y la salida en igualdad de condiciones. En esta ficha analizaremos el vestíbulo de entrada del edifico de los vestuarios.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
-	Felpudos y moquetas, encastrados o fijados alsuelo y resistentes a la deformación			No hay
	Dimensionado			
SÍ	Espacio de giro libre de obstáculos, sin invadir por el barrido de las puertas	Ø = 150 cm	Ø = 150 cm	
SÍ	Iluminación	≥200 luxes	200 luxes	
NO	Diferencias de iluminación int-ext	≤100 lux		Exterior 60 luxes, interior 200 luxes
	Acabados			
SÍ	Pavimento no deslizante (ensayo péndulo) ni en seco ni en mojado, de clase 2, con un coeficiente de Resistencia al deslizamiento entre 35< Rd ≤45	clase 2	clase 2	
NO	Características de itinerario accesible, seguir Ficha E.4. Pavimentos interiores.			Escalón en acceso
SÍ	Libres de obstáculos y elementos volados dando respuesta a la Ficha U.14.		Prof. 90 cm	
NO	Señalización según lo señalado en el Bloque 5			No comunicación acústica. Itinerarios interiores sin señales de direccionamiento. Baños no accesibles por tanto sin señalización.
NO	Espacios de atención al público según la Ficha E.21 Áreas de atención al público			Información en hoja pertinente. Mostradores no accesibles. Mobiliario no accesible.
-	Si existen espacios de espera, el mobiliario considerará lo recogido en la Ficha E.17. Asientos y Ficha E.18 Apoyos isquiáticos			No hay apoyo isquiático.

CONCLUSIONES

En vestíbulo de las oficinas de la APB incumple la necesidad de conectarse a través de un itinerario accesible ya que para acceder a él es necesario salvar un escalón de 13 cm.

IMÁGENES

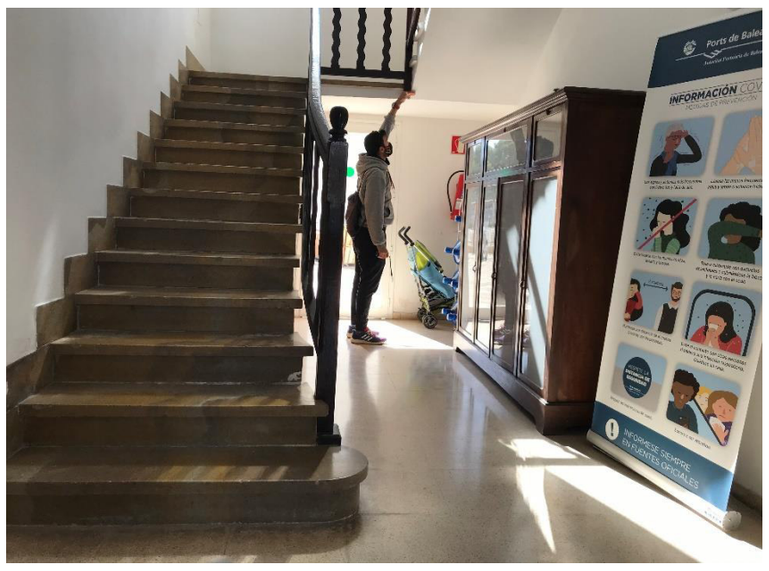

E5 2

PUERTAS DE PASO

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-EDIFICIO DE OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las puertas junto con las áreas de conexión horizontal, son los dos elementos que garantizan una circulación accesible entre diferentes espacios al mismo nivel.
Un diseño inadecuado de las puertas, de alguna de las partes que las conforman o de los huecos de paso puede impedir que todas las personas utilicen el edificio en condiciones de seguridad e igualdad.
En esta ficha estudiaremos aquellas puertas situadas en el edificio de oficinas de la APB.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
-	No se recomienda usar puertas de vaivén			
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			Maneta a presión
-	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura.	40 cm		
-	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente.			
	Dimensiones			
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥120 cm		No se cumple en interior de baños
-	Parte transparente o traslucida en puertas de vaivén	mín. de 70 cm a 150 cm		
-	Si pasillos A <250 cm puertas abatibles retranqueadas			
SÍ	Ángulo en p abatibles	≥90°		
-	Espacio p. corredera hoja-marco	≥5 cm		
-	Hueco admisible en carril	≤1,5 cm.No admite resalte		
NO	Altura libre	≥210 cm	202 cm	
SÍ	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja	≥80 cm	80 cm	Baños no accesibles con A de puerta de 60 cm
SÍ	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		No hay, puerta automática corredera
SÍ	D hasta el encuentro en rincón	≥40 cm		No se cumple en interior de baños
SÍ	F apertura puerta	25 N .≤65 N resist fuego	>25	
-	Señalización en puertas de vidrio. Franjas.	Altura1:120 cm Altura2:170cm		
	Acabados			
-	Itinerario Ficha E.1			
NO	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8			Sin comunicación acústica. Itinerarios interiores sin señales de direccionamiento.
NO	Puertas de aseos adaptados Ficha E.24			No existe baño accesible
SÍ	Puerta contrastada en hoja o en marco			

CONCLUSIONES

Zona Formación P01: Puerta doble abatible de hojas simétricas. Dimensiones 131x202. Una de las hojas debería tener un A mín de 80 m. Zona apartamento P01: Puerta doble abatible de hojas simétricas. Dimensiones 123x202. Una de las hojas debería tener un A mín de 80 m. Debería existir almenos una unidad de aseo accesible en cada zonificación diferenciada del edificio de oficinas de la APB. (oficinas, despachos, zona de formación...)

IMÁGENES

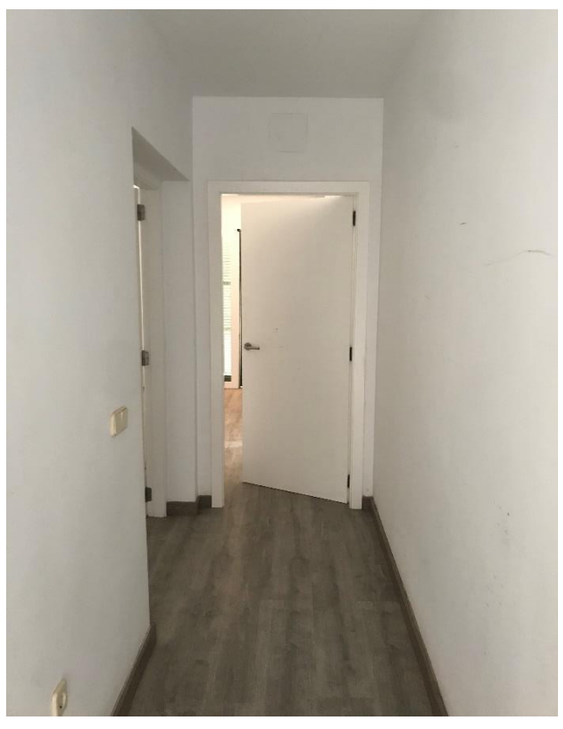

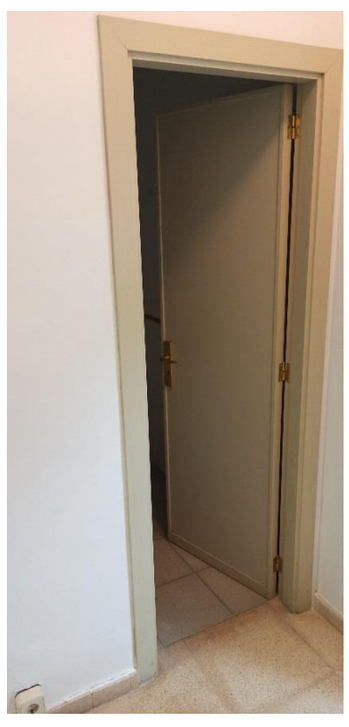

E6 5			
PASILLOS Y ÁREAS DE CONEXIÓN			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-EDIFICIO DE OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En esta ficha se estudian los pasillos, pasarelas y áreas de conexión existentes entre los diferentes ámbitos del edificio de Oficinas de la APB.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Entre áreas al menos un pasillo accesible que las conecte			Acceso a Despachos P0 impedido por la presencia de mostrador no accesible. P01 pasillo apartamento no accesible (108cm). 1 Aula de formación no accesible zona afectada por barrido de la puerta.
NO	En pasillos no accesibles, el accesible más próximo deberá estar señalizado			Zona de formación
	Dimensiones			
NO	Anchura libre	Ø ≥120 cm		P01 pasillo apartamento no accesible (108cm)
-	Estrechamientos admisibles	A ≥100 cm a lo largo de 50 cm		
-	Si se prevé cruce de dos personas usuarias de silla de ruedas	A ≥180 cm		
-	Cambios de dirección, cada 10,00 m máximo	Ø =150 cm		
	Altura	≥220 cm	≥220 cm	
NO	Elementos volados altura <220 cm deben contar con en su proyección vertical de elementos de altura ≥25 cm medidos desde el suelo.	elemento perimetral de A ≥25 cm		Sin elementos de protección bajo escalera
SÍ	Iluminación	≥100 lux	≥100 lux	
SÍ	Se recomienda que la frecuencia de las luces intermitentes sea inferior a 5 Hz	5 Hz	5 Hz	
	Acabados			
SÍ	Pavimento accesible	Ficha E.4		
NO	Señalización	Bloque 5		
SÍ	La señalización tendrá el tamaño adecuado en funciónde la distancia	Ficha C.7		

CONCLUSIONES

_Se trata de un edificio no accesible para PMR. Para acceder al edificio debemos salvar un escalón de 13 cm. El edificio cuenta con dos planta sin alternativa de circulación vertical accesible por lo que antes de modificar la configuración del pasillo situado en el apartamento de planta segunda para que sea accesible sería necesario colocar un ascensor accesible. Una vez realizadas las modificaciones pertinentes para adaptar el edificio a PMR colocar señalización SIA en ascensores, itinerarios accesibles, vías de evacuación y baños.

IMÁGENES

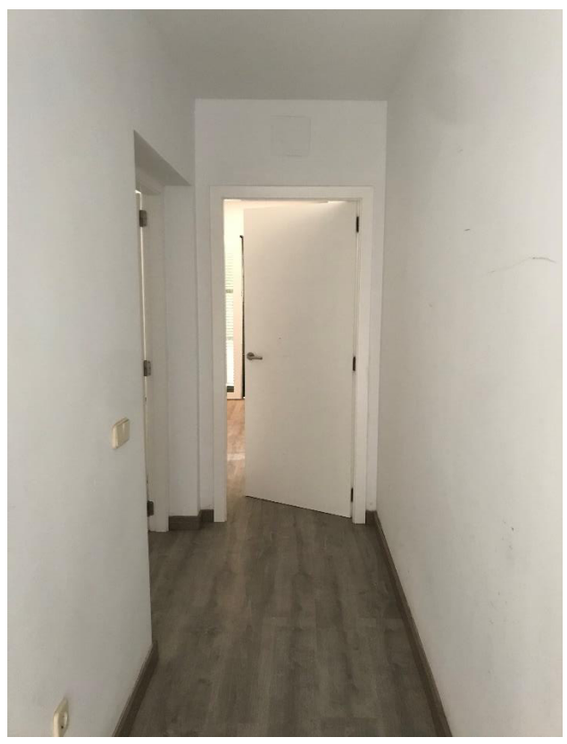

E7 1				
ESCALERAS FIJAS INTERIORES				
PUERTO	ALCÚDIA		ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-EDIFICIO DE OFICINAS DE LA APB			

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se analizan las escaleras fijas de uso habitual existentes en el Edificio de las oficinas de la APB

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Con alternativa Accesible próxima y señalizada	Rampas Ficha E.8 Ascensores Ficha E.10		No existe alternativa accesible
SÍ	Directriz recta o ligeramente curva		Directriz recta	
NO	Contrahuella obligatoria. No admisible: solapes ni bocel. Escalones dimensiones iguales.			Presenta bocel
	Dimensiones			
NO	Tramos	Mín 3 esc. Máx 10 esc	12 esc	
NO	Anchura	≥120 cm	103 cm	
NO	Altura espacio inferior escalera	<220 cm protegidos		No protegido
SÍ	Relación, proporciones.	54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm	66 cm	
SÍ	Huella	30 cm ≤ H ≤ 36 cm	31 cm	
NO	Contrahuella o tabica	13 cm ≤ C ≤ 16 cm	17.5 cm	
NO	Ángulo entre H y C	90°		Bocel de 3 cm de saliente y alto 3 cm
NO	Rellanos: A =A de escalera y Profundidad ≥A de escalera.	120 cm en recto recomendable 150 cm cambios dirección	287x101 cm	Profundidad 101 cm
NO	Inicio y final de la escalera, espacio de A =A escalera y Profundidad	≥150 cm		Invadido por el itinerario peatonal
	Acabados			
NO	Señalización en el ancho del escalón, tira antideslizante contrastada (textura y color)	de 5 cm a 3 cm del borde		Sin señalización
NO	En Inicio y final situar franja de pavimento táctil de acanaladura contrastado			Sin franja de pavimento táctil
-	Altura pavimento táctil	3 mm ± 1 mm		
-	anchura líneas de franja	≥25 mm y < 30 mm		
-	separación entre ejes de franjas	≥60 mm y < 65 mm		
NO	A franja de pavimento táctil=A escalera y Profundidad ≥120 cm	Ficha U.9		No hay franja de pavimento táctil
SÍ	Escalera: Pavimento accesible	clase 2. Ficha E.4	Cumple	
NO	Pasamanos y barreras de protección accesibles	Ficha E.9	97 cm	Huecos entre barrotes≥ 10 cm

CONCLUSIONES

Será necesario rehacer la configuración de la escalera para cumplir con los parámetros de escalera accesible. Deberá contar con una anchura mínima de 120 cm, con mesetas de igual anchura y profundidad de 150 cm preferiblemente. Sus huellas deberán tener una profundidad de entre 30 cm ≤ H ≤ 36 cm y la contrahuella una altura de entre 13 cm ≤ C ≤ 16 cm. La suma de 2 contrahuellas y una huella no deberá superar los 70 cm. La contrahuella no deberá admitir bocel ni solapes. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil de ancho igual a la escalera y profundidad de120 cm. Pavimento de acanaladura, en dirección perpendicular a la marcha, de 3 mm ± 1 mm de altura, 25 mm ≤ anchura de franja < 30 mm y 60 mm ≤ separación entre ejes de franjas < 65 mm. Anchura pavimento señalizador la misma que la escalera. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera a doble altura.

IMÁGENES

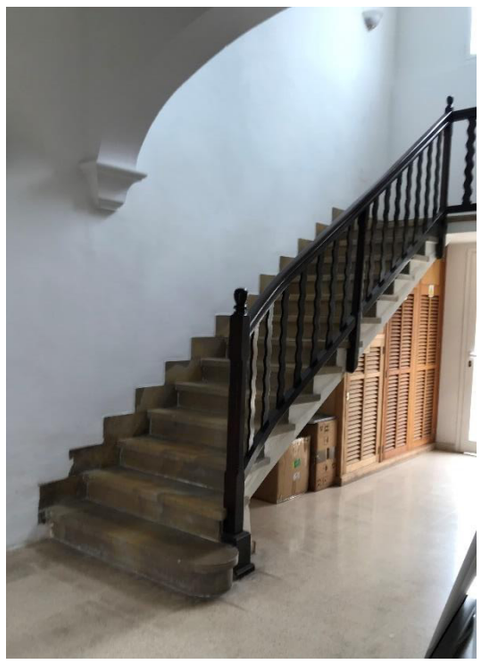

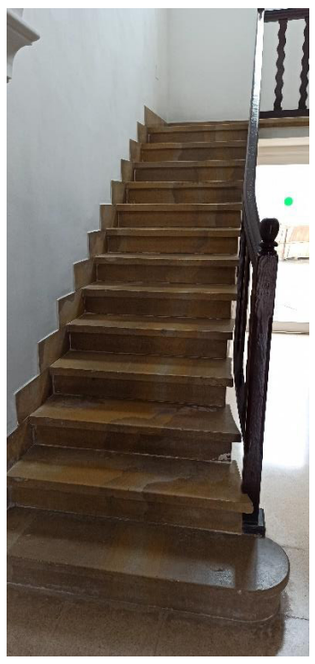

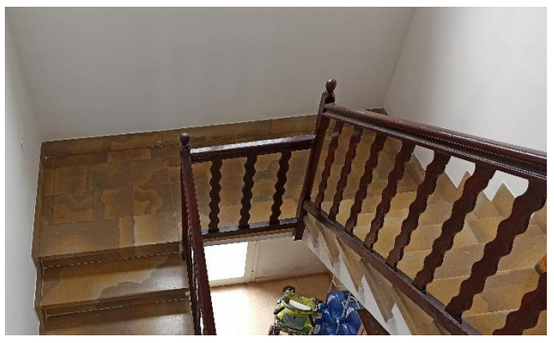

E14 1

MOSTRADORES DE VENTA DE BILLETES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-EDIFICIO DE OFICINAS DE LA APB	ATENCIÓN AL PÚBLICO AUTORIDAD PORTUARIA	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los espacios y equipamientos donde se produce la Atención al Cliente, deben estar diseñados para facilitar la labor a los trabajadores, así como permitir la máxima comodidad y prestaciones para los viajeros. En esta ficha se estudian los mostradores de información presentes en las oficinas de la APB.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Fácil localización desde el acceso			Desde el acceso se señalizará mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m
SÍ	Sin aristas vivas y sin elementos volados más de 15 cm por debajo de 220 cm o bien con proyección vertical	a -220 cm no + de 15cm de volado o proy.vertical		
NO	Mostrador de información dotado con bucle de inducción con señalización normalizada (almenos 1 taquilla)			Sin sistema dotado con bucle de inducción
NO	Personal de atención al público con conocimientos para atender a personas con diferentes capacidades y básicos de lengua de signos.			
NO	Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos.			
	Dimensiones			
NO	Entre entrada y mostrador franja guía	A 40 cm		No existe franja guía
SÍ	Mostrador plano de trabajo	Anchura ≥100 cm	145 cm	
SÍ	Mostrador plano de trabajo altura:	h ≤85 cm	75 cm	
NO	Mostrador, Espacio libre inferior	≥70 cm x 100 cm x 60 cm (h x a x p)	73 cm x 145 cm x 78 cm	Espacio libre inferior situado solamente en el lado del trabajador
NO	Iluminación	≥300 lux	125 lux	
	Acabados			
NO	Información relevante en diferentes soportes como visual, táctil y acústico, apoyándose en la tecnología y en varios idiomas	Bloque 5		

CONCLUSIONES

Los mostradores se deben señalizar desde el acceso mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m. Se debe dotar a los mostradores de información con bucle de inducción y con su pertinente señalización normalizada. El personal de atención al público debe contar con conocimientos sobre cómo tratar con personas con diferentes capacidades y conocimientos básicos de lengua de signos. Se deben dotar a los mostradores de un espacio libre inferior de 70 cm de altrua x100 cm de ancho y 60 cm de profundidad situado tanto el la zona del trabajador como del usuario. Por último se debe modificar la iluminación para que el nivel de iluminación en los puntos de atención al público sea de 300 lux.

IMÁGENES

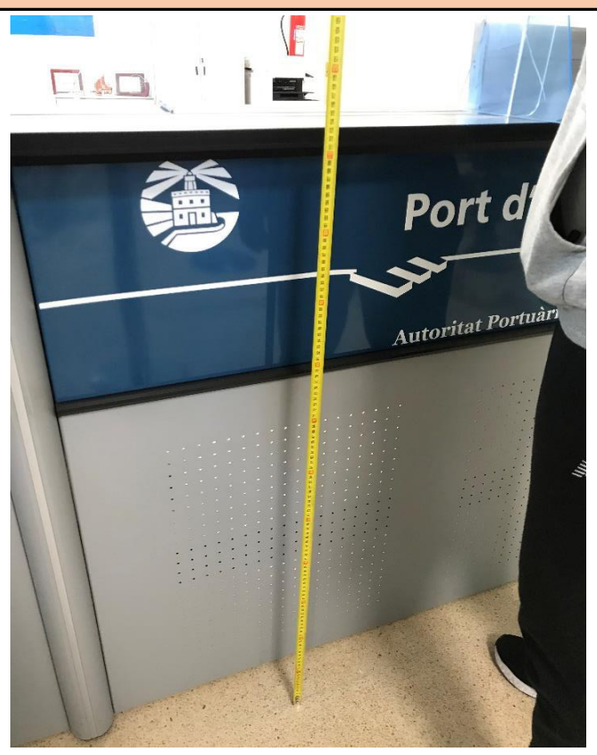

E14 2

MOSTRADORES DE VENTA DE BILLETES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-EDIFICIO DE OFICINAS DE LA APB	ATENCIÓN AL PÚBLICO CAPITANÍA MARÍTIMA	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los espacios y equipamientos donde se produce la Atención al Cliente, deben estar diseñados para facilitar la labor a los trabajadores, así como permitir la máxima comodidad y prestaciones para los viajeros. En esta ficha se estudian los mostradores de información presentes en las oficinas de capitanía marítima.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Fácil localización desde el acceso			Desde el acceso se señalizará mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m
SÍ	Sin aristas vivas y sin elementos volados más de 15 cm por debajo de 220 cm o bien con proyección vertical	a -220 cm no + de 15cm de volado o proy.vertical		Sin aristas vivas ni elementos volados
NO	Mostrador de información dotado con bucle de inducción con señalización normalizada (almenos 1 taquilla)			Sin sistema dotado con bucle de inducción
NO	Personal de atención al público con conocimientos para atender a personas con diferentes capacidades y básicos de lengua de signos.			
NO	Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos.			
	Dimensiones			
NO	Entre entrada y mostrador franja guía	A 40 cm		No existe franja guía
SÍ	Mostrador plano de trabajo	Anchura ≥100 cm	Anchura ≥100 cm	
NO	Mostrador plano de trabajo altura:	h ≤85 cm	114 cm	
NO	Mostrador, Espacio libre inferior	≥70 cm x 100 cm x 60 cm (h x a x p)		Espacio libre inferior situado solamente en el lado del trabajador
NO	Iluminación	≥300 lux	52 lux	
	Acabados			
NO	Información relevante en diferentes soportes como visual, táctil y acústico, apoyándose en la tecnología y en varios idiomas	Bloque 5		

CONCLUSIONES

Los mostradores se deben señalizar desde el acceso mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m. Se debe dotar a los mostradores de información con bucle de inducción y con su pertinente señalización normalizada. El personal de atención al público debe contar con conocimientos sobre cómo tratar con personas con diferentes capacidades y conocimientos básicos de lengua de signos. Se deben dotar a los mostradores de un espacio libre inferior de 70 cm de altrua x100 cm de ancho y 60 cm de profundidad situado tanto el la zona del trabajador como del usuario. Por último se debe modificar la iluminación para que el nivel de iluminación en los puntos de atención al público sea de 300 lux.

IMÁGENES

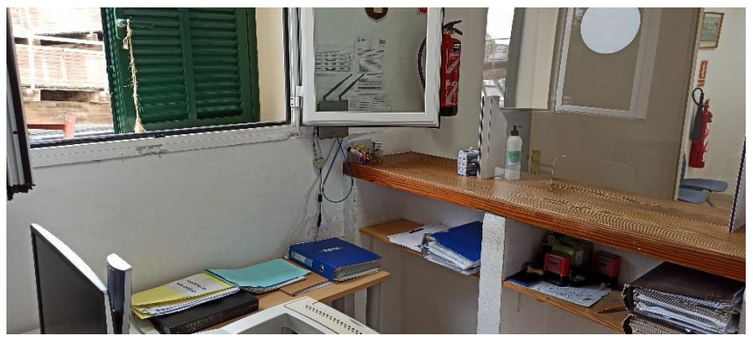
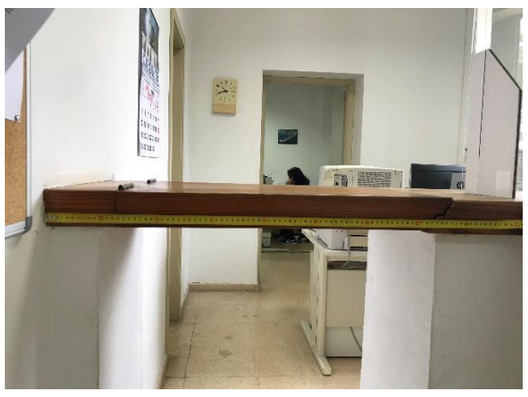

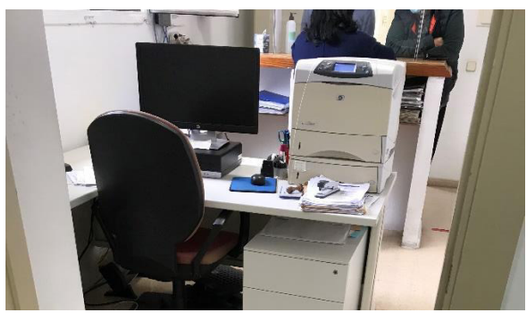

E17 1

ASIENTO

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-EDIFICIO DE OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En circunstancias dónde los tiempos de espera aumentan considerablemente y las instalaciones deben dar respuesta a las necesidades de descanso de los usuarios. Los asientos deben garantizar comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
	Número total en función de la concurrencia del espacio			
NO	Número. Al menos uno de ellos por cada agrupación será accesible, y al menos uno de cada cinco asientos o fracción.			
SÍ	Zona de asientos comunicado con el itinerario accesible sin invadirlo			
SÍ	Se permitirá la estancia de perros guía debajo de lo asientos	Ficha U.17		
SÍ	Con reposabrazos, respaldo y espacio libre inferior, bajo el asiento	Ficha U.17		
	Dimensiones			
-	En las salas de proyección, salones de actos, o similares se reservarán 2 plazas para sillas de ruedas por cada 100 o fracción	2 de 100		
-	Las plazas de sillas de ruedas estarán conectadas a los accesos por un itinerario accesible	ancho ≥1,50 m		No hay plazas para sillas de ruedas
-	Medidas plazas silla de ruedas	90 cm x 120 cm (ancho x profundidad)		
-	zonas para personas con discapacidad visual y/o auditiva, en la zona delantera, próximas a los sistemas de sonido y sistemas de inducción.	Ficha C.3		No hay sistemas de sonido e inducción
SÍ	Altura del plano del asiento:	40 cm - 45 cm.	41 cm	
SÍ	Profundidad del plano de asiento:	40 cm - 45 cm.	45 cm	
SÍ	Altura de apoyabrazos respecto al plano del asiento:	18 cm - 24 cm.	18 cm - 24 cm.	
SÍ	Altura del plano de respaldo medidos desde el suelo:	≥80 cm.	90 cm	
SÍ	Angulo máximo entre respaldo-vertical:	15°	Cumple	
SÍ	En su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos que no invadirá el itinerario peatonal accesible	≥60 cm.	≥60 cm.	
NO	Área libre anexa al menos a un lado.	Ø ≥150 cm	Ocupada por mobiliario	Retirar mobiliario consiguiendo Ø ≥150 cm libre delante del mostrados y anexo a la zona de asientos
	Acabados			
SÍ	Tendrán en cuenta lo recogido en la Ficha U.17	Ficha U.17		

CONCLUSIONES

Al menos, a un lado de la zona de asientos se dispondrá de un área libre de obstáculos donde se inscriba una circunferencia de Ø ≥150 cm hecho que permite que puedan ubicarse junto a los asientos los carritos de los bebés o personas que utilicen silla de ruedas.

IMÁGENES

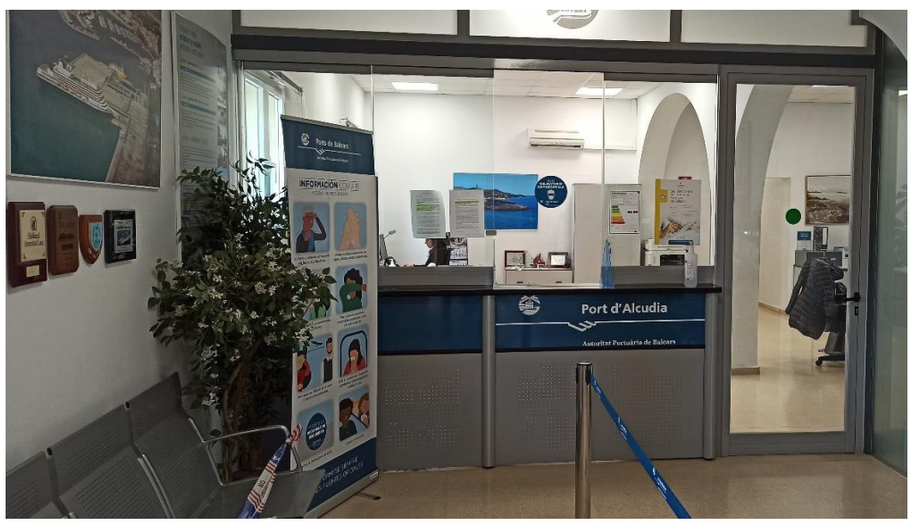

E17 2

ASIENTO

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-EDIFICIO DE OFICINAS DE LA APB	ZONA ESPERA DESPACHOS	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En circunstancias dónde los tiempos de espera aumentan considerablemente y las instalaciones deben dar respuesta a las necesidades de descanso de los usuarios. Los asientos deben garantizar comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
	Número total en función de la concurrencia del espacio			
NO	Número. Al menos uno de ellos por cada agrupación será accesible, y al menos uno de cada cinco asientos o fracción.			
SÍ	Zona de asientos comunicado con el itinerario accesible sin invadirlo			
SÍ	Se permitirá la estancia de perros guía debajo de lo asientos	Ficha U.17		
SÍ	Con reposabrazos, respaldo y espacio libre inferior, bajo el asiento	Ficha U.17		
	Dimensiones			
-	En las salas de proyección, salones de actos, o similares se reservarán 2 plazas para sillas de ruedas por cada 100 o fracción	2 de 100		
-	Las plazas de sillas de ruedas estarán conectadas a los accesos por un itinerario accesible	ancho ≥1,50 m		No hay plazas para sillas de ruedas
-	Medidas plazas silla de ruedas	90 cm x 120 cm (ancho x profundidad)		
-	zonas para personas con discapacidad visual y/o auditiva, en la zona delantera, próximas a los sistemas de sonido y sistemas de inducción.	Ficha C.3		No hay sistemas de inducción magnética
SÍ	Altura del plano del asiento:	40 cm - 45 cm.	41 cm	
SÍ	Profundidad del plano de asiento:	40 cm - 45 cm.	43 cm	
-	Altura de apoyabrazos respecto al plano del asiento:	18 cm - 24 cm.		No hay aproyabrazos
SÍ	Altura del plano de respaldo medidos desde el suelo:	≥80 cm.	83 cm	
SÍ	Angulo máximo entre respaldo-vertical:	15°	Máx 15	
SÍ	En su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos que no invadirá el itinerario peatonal accesible	≥60 cm.	≥60 cm.	
NO	Área libre anexa al menos a un lado.	Ø ≥150 cm		No hay espacio anexo suficiente
	Acabados			
SÍ	Tendrán en cuenta lo recogido en la Ficha U.17	Ficha U.17		

CONCLUSIONES

Al menos, a un lado de la zona de asientos se dispondrá de un área libre de obstáculos donde se inscriba una circunferencia de Ø ≥150 cm hecho que permite que puedan ubicarse junto a los asientos los carritos de los bebés o personas que utilicen silla de ruedas.

IMÁGENES

E2 5

PUERTAS DE ACCESO

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	14-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

El acceso a la edificación es el punto de conexión entre el espacio exterior y edificado. En esta ficha se trata de especificar la identificación y localización de las puertas de acceso y salida de la Estación Marítima.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Mínimo un acceso accesible en cada edificios, a ser posible a coincidir con el acceso principal.			
SÍ	Si hay accesos no accesibles, el recorrido hasta el acceso accesible más próximo deberá estar señalizado según las condiciones del Bloque 5			Los accesos son accesibles
NO	Mecanismos de apertura y cierre funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			Puerta automática
SÍ	Puertas abatibles o correderas. No admisibles giratorias. No recomendadas puertas batientes automáticas.			Puerta corredera automática
NO	Puertas batientes situadas en acceso a ser posible con barra de accionamiento horizontal en ambas caras.y resorte o dispositivo de cierre automático.			No hay
SÍ	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente sobre máquinas.(Directiva 98/37/CE)			
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura			Sin zócalo inferior
SÍ	Dimensionado			
-	Discontinuidades umbral ≤2 cm, achaflanadas a 45°.			No hay discontinuidad
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm	Cumple	
SÍ	Altura libre	≥210 cm	273 cm	
SÍ	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja. Recomendable 90 cm	≥80 cm	85 cm	
NO	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		No hay
NO	Altura barra de accionamiento puertas baitentes	=80 cm ± 5 cm,		No hay
NO	D mecnaismo apertura hasta el encuentro en rincón	≥40 cm		No hay
SÍ	F apertura puerta salida ≤25 N (≤65 N cuando sean resistentes al fuego)			
SÍ	Señalización en puertas de vidrio, franjas	Altura1: 120 cm Altura2: 170 cm	Altura 1: 121cm Altura 2: 155cm	
SÍ	Acabados			
SÍ	Itinerario Ficha E.1	E.1		Itinerario accesible
NO	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8	C7-C8		Situar señalización junto al marco en el paramento a la derecha de la puerta. Preferentemente h 145 cm-175 cm
SÍ	Banda diferenciada cromáticamente en el contorno hueco			
SÍ	Puertas de vidrio y fachadas de vidrio diferenciadas entre sí			

CONCLUSIONES

Puertas accesibles en acceso.

IMÁGENES

E5 4

PUERTAS DE PASO

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	14-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las puertas junto con las áreas de conexión horizontal, son los dos elementos que garantizan una circulación accesible entre diferentes espacios al mismo nivel.
Un diseño inadecuado de las puertas, de alguna de las partes que las conforman o de los huecos de paso puede impedir que todas las personas utilicen el edificio en condiciones de seguridad e igualdad.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
-	No se recomienda usar puertas de vaivén			
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			Maneta a presión
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura.	40 cm		Sin zócalo de seguridad
-	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente.			
	Dimensiones			
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥120 cm		
-	Parte transparente o traslucida en puertas de vaivén	mín. de 70 cm a 150 cm		
-	Si pasillos A <250 cm puertas abatibles retranqueadas			
SÍ	Ángulo en p abatibles	≥90°		
SÍ	Espacio p. corredera hoja-marco	≥5 cm		Puerta corredera automática
-	Hueco admisible en carril	≤1,5 cm.No admite resalte		
	Altura libre	≥210 cm	210 cm	
	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja	≥80 cm	86 cm	
	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		No hay, puerta automática corredera
SÍ	D hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	≥40 cm	
SÍ	F apertura puerta	25 N .≤65 N resist fuego	≤25	
NO	Señalización en puertas de vidrio. Franjas.	Altura1:120 cm Altura2:170cm		Sin señalización
	Acabados			
	Itinerario Ficha E.1			
	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8			Sin comunicación acústica. Itinerarios interiores sin señales de direccionamiento. Baño no accesible sin señalización.
	Puertas de aseos adaptados Ficha E.24			
NO	Puerta contrastada en hoja o en marco			

CONCLUSIONES

Se deberá colocar señalización mediante franjas a 120 y 170 cm de altura.

IMÁGENES

E6 1

PASILLOS Y ÁREAS DE CONEXIÓN

PUERTO	ALCÚDIA	**ÁMBITO**	EDIFICACIÓN
ZONA	14-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En esta ficha se estudian los pasillos, pasarelas y áreas de conexión existentes entre los diferentes ámbitos de la Estación Marítima.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Entre áreas al menos un pasillo accesible que las conecte			Pasillo a baño en terraza exterior de espera de embarque no accesible
NO	En pasillos no accesibles, el accesible más próximo deberá estar señalizado			Señalizar pasillo no accesible en oficinas
	Dimensiones			
SÍ	Anchura libre	Ø ≥120 cm		Pasillo baño exterior 90 cm. Posibilidad de acceder al baño de la zona de control.
SÍ	Estrechamientos admisibles	A ≥100 cm a lo largo de 50 cm	A ≥100 cm a lo largo de 50 cm	Estrechamiento debido a pilaes en P02 zona oficinas
SÍ	Si se prevé cruce de dos personas usuarias de silla de ruedas	A ≥180 cm	A ≥180 cm	
NO	Cambios de dirección, cada 10,00 m máximo	Ø =150 cm		Zona oficinas A= 1,48
SÍ	Altura	≥220 cm	≥220 cm	
NO	Elementos volados altura <220 cm deben contar con en su proyección vertical de elementos de altura ≥25 cm medidos desde el suelo.	elemento perimetral de A ≥25 cm		Señal informativa en pasarela de embarque P02 sin elemento perimetral.
NO	Iluminación	≥100 lux	≤ 100 lux	Pasillo oficinas. Pasillo P0 periférico. Pasillo a zona de espera exterior. Pasillo P02 a zona de control.
SÍ	Se recomienda que la frecuencia de las luces intermitentes sea inferior a 5 Hz	5 Hz	≤ 5 Hz	
	Acabados			
SÍ	Pavimento accesible	Ficha E.4		
NO	Señalización	Bloque 5		Colocar símoblo normalizado SIA (ascensores, itinerarios accesibles, vías de evacuación, sevicios asistencia al viajero PMR),simbolo inducción magnética.Toda información relevante, como mínimo en forma visual y acústica.Colocar pavimento táctil.
SÍ	La señalización tendrá el tamaño adecuado en funciónde la distancia	Ficha C.7		

CONCLUSIONES

_Será necesario cambiar la situación de la puerta del baño situado en la terraza de espera para embarque de la Planta Segunda, se accede a él a través de un pasillo no accesible. _Sustituir iluminación en zona de pasillo periférico de Planta Baja, pasillo oficinas Planta primera, pasillo Planta Segunda a zona de control y pasillo a terraza de espera de embaque para llegar al límite de 100 luxes. _Colocar señalización: Símbolo normalizado SIA en ascensores accesibles, en zonas de evacuación y en los itinerarios accesibles. No existe sistema de inducción magnética según la información facilitada por los trabajadores de la terminal y tampoco se observa ninguna señal. Por último es necesario colocar pavimento táctil en embarque de ascensores y escaleras, y franja guiá entre acceso a la terminal y mostrador de venta de billetes. _Señalizar pictograma situada en plataforma de embarque o subir la altura de éste.

_

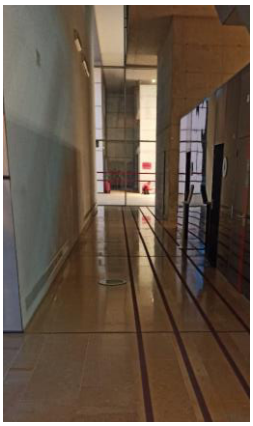




E7 5			
ESCALERAS FIJAS INTERIORES			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	14-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se analizan las escaleras fijas de uso habitual existentes en la Estación Marítima.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Con alternativa Accesible próxima y señalizada	Rampas Ficha E.8 Ascensores Ficha E.10	Ascensores accesibles	
SÍ	Directriz recta o ligeramente curva		Directriz recta	
SÍ	Contrahuella obligatoria. No admisible: solapes ni bocel. Escalones dimensiones iguales.		Cumple	
	Dimensiones			
SÍ	Tramos	Mín 3 esc. Máx 10 esc	Mín 5 esc. Máx 10 esc	
SÍ	Anchura mínima libre de paso en espacios de uso público de 120 cm	≥120 cm	≥120 cm	Embarque: 123 cm Desembarque:124 cm Oficinas:123 cm
SÍ	Altura espacio inferior escalera	<220 cm protegidos	Protegida	Bajo escalera cerrado
SÍ	Relación, proporciones.	54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm	Cumple	
SÍ	Huella	30 cm ≤ H ≤ 36 cm	30 cm ≤ H ≤ 36 cm	Embarque:30 cm Desem:30 Oficinas:29 cm
NO	Contrahuella o tabica	13 cm ≤ C ≤ 16 cm	≥ 16 cm	Embarque:16.5 Desem:16.5 Oficinas:17 cm
SÍ	Ángulo entre H y C	90°	90°	
SÍ	Rellanos: A =A de escalera y Profundidad ≥A de escalera.	120 cm en recto recomendable 150 cm cambios dirección	Cumple	Embarque:124 Desem:130 Oficinas:136cm
SÍ	Inicio y final de la escalera, espacio de A =A escalera y Profundidad	≥150 cm	≥150 cm	
	Acabados			
NO	Señalización en el ancho del escalón, tira antideslizante contrastada (textura y color)	de 5 cm a 3 cm del borde	de 4 cm a 3 cm del borde	Color no contrastado
NO	En Inicio y final situar franja de pavimento táctil de acanaladura contrastado			No hay pavimento táctil
-	Altura pavimento táctil	3 mm ± 1 mm		
-	anchura líneas de franja	≥25 mm y < 30 mm		
-	separación entre ejes de franjas	≥60 mm y < 65 mm		
NO	A franja de pavimento táctil=A escalera y Profundidad ≥120 cm	Ficha U.9		No hay pavimento táctil
SÍ	Escalera: Pavimento accesible	clase 2. Ficha E.4	Cumple	
NO	Pasamanos y barreras de protección accesibles	Ficha E.9	Sin pasamanos a doble altura	118cm H≥6m 104cm H≤ 6m

CONCLUSIONES

_ Incorporar pasamanos continúo a ambos lados a doble altura y prolongados en los embarques en 30 cm y rematados de forma curva y hacia abajo. H1 =90 cm - 95 cm (110 cm para salvar altura mayores a 6 m) . H2 =70 cm - 75 m. _Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil de ancho igual a la escalera de acanaladura, en dirección perpendicular a la marcha, de 3 mm ± 1 mm de altura, 25 mm ≤ anchura de franja < 30 mm y 60 mm ≤ separación entre ejes de franjas < 65 mm

IMÁGENES

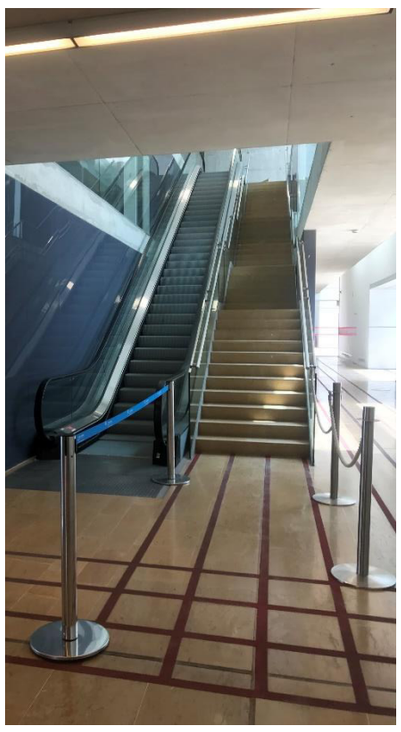
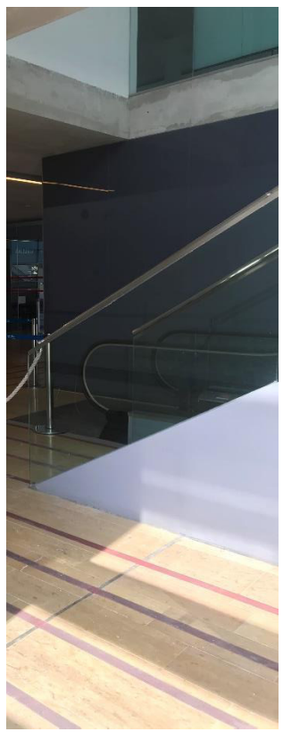
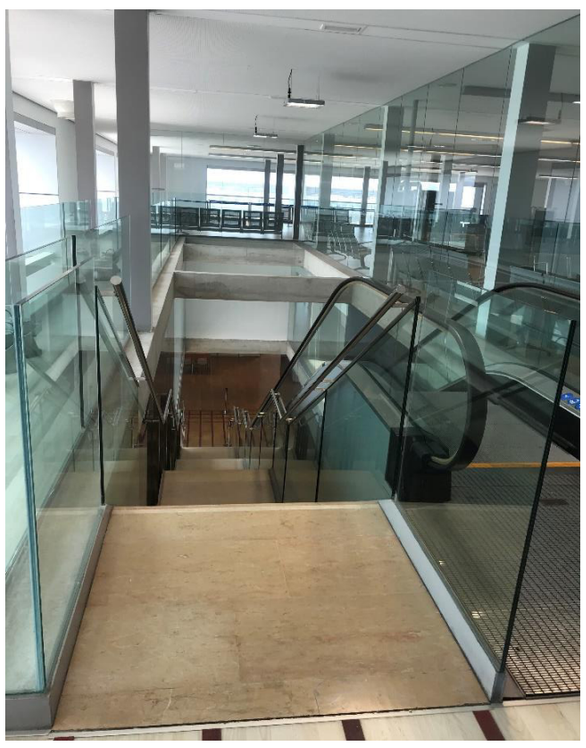

E9 5

PASAMANOS Y BARANDILLAS

PUERTO	ALCÚDIA	**ÁMBITO**	EDIFICACIÓN
ZONA	14-ESTACIÓN MARÍTIMA	ESCALERA OFICINAS	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las barandillas los pasamanos y los zócalos son elementos de apoyo y protección para las personas. Sirven para proteger los cambios de nivel y mejorar la deambulación en los itinerarios verticales. En esta ficha estudiaremos la tipología de pasamanos situada en la oficinas de la APB.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Pasamanos continúo a ambos lados a doble altura.			Una sola altura
NO	Pasamanos prolongados en los embarques en 30 cm.	30 cm		No prolongado
NO	Pasamanos rematados de forma curva o hacia abajo.			Sin remate
-	En los lados abiertos de escaleras y rampas, colocar barandillas para evitar caídas junto a desniveles con diferencia de cota ≥55 cm.	≠ de cota ≥55 cm		
NO	Todos los elementos son continuos, estables y sin cantos vivos			
SÍ	Dimensiones			
-	Altura zócalos rampas	≥10 cm		No hay rampa
SÍ	Sección pasamanos	3,5 - 5 cm		
SÍ	Separación pasamanos al paramento	5 cm	5 cm	
-	Si separación >5 cm, debe aumentarse el ancho de la escalera o rampa.			
NO	Pasamanos dobles	H1 =90 cm - 95 cm. H2 =70 cm - 75 m.		No hay pasamanos dobles
-	rampa o escalera fija con pasamanos doble central	ancho ≥4 m		Ancho menor a 4 metros
-	Altura Barandillas-barreras de protección	≥90 cm desniveles ≤6 m__ ≥110 cm desnivel >6 m	105 cm	Altura pasamanos 105 cm, no hay barandilla.
-	Barandillas no escalables:	no admisible apoyo entre 20- 70 cm de altura		
-	Aberturas en barandillas	≤10 cm		
SÍ	Barandillas deben soporta una fuerza concentrada en la posición más desfavorable	≥1,5 kN		
SÍ	Color contrastado en pasamanos y zócalos			
SÍ	Control de la inercia térmica de los materiales ext			

CONCLUSIONES

Se debe disponer de pasamanos a ambos lados a doble altura y prolongados en los embarques en 30 cm para guiar el recorrido y servir como elemento de apoyo y agarre durante la circulación. Los pasamanos deberán quedar rematados de forma curva o hacia abajo de modo que se eviten colisiones o enganches en los extremos.

IMÁGENES

E9 4

PASAMANOS Y BARANDILLAS

PUERTO	ALCÚDIA	**ÁMBITO**	EDIFICACIÓN
ZONA	14-ESTACIÓN MARÍTIMA	ESCALERA INTERIOR ESTACIÓN Y ESCALERA EXTERIOR	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las barandillas los pasamanos y los zócalos son elementos de apoyo y protección para las personas. Sirven para proteger los cambios de nivel y mejorar la deambulación en los itinerarios verticales. En esta ficha estudiaremos la tipología de pasamanos y barandillas situada en las escaleras de la Estación marítima que unen la planta de acceso con la zona de embarque, las escaleras que unen la planta baja con la zona de desembarque y las escaleras exteriores.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Pasamanos continúo a ambos lados a doble altura.			Una sola altura
NO	Pasamanos prolongados en los embarques en 30 cm.	30 cm		No prolongado
NO	Pasamanos rematados de forma curva o hacia abajo.			Sin remate
SÍ	En los lados abiertos de escaleras y rampas, colocar barandillas para evitar caídas junto a desniveles con diferencia de cota ≥55 cm.	≠ de cota ≥55 cm		
NO	Todos los elementos son continuos, estables y sin cantos vivos			
SÍ	Dimensiones			
-	Altura zócalos rampas	≥10 cm		No hay rampa
SÍ	Sección pasamanos	3,5 - 5 cm	3,5 cm	
SÍ	Separación pasamanos al paramento	5 cm	5 cm	
-	Si separación >5 cm, debe aumentarse el ancho de la escalera o rampa.			
NO	Pasamanos dobles	H1 =90 cm - 95 cm. H2 =70 cm - 75 m.		No hay pasamanos dobles
-	rampa o escalera fija con pasamanos doble central	ancho ≥4 m		Ancho menor a 4 metros
NO	Altura Barandillas-barreras de protección	≥90 cm desniveles ≤6 m__ ≥110 cm desnivel >6 m		Pasamanos a una sola altrua. 118cm H≥6m 104cm H≤ 6m
SÍ	Barandillas no escalables:	no admisible apoyo entre 20- 70 cm de altura		No admiten apoyos
SÍ	Aberturas en barandillas	≤10 cm	10 cm	
SÍ	Barandillas deben soporta una fuerza concentrada en la posición más desfavorable	≥1,5 kN		
SÍ	Color contrastado en pasamanos y zócalos			
SÍ	Control de la inercia térmica de los materiales ext			

CONCLUSIONES

Se debe disponer de pasamanos a ambos lados a doble altura y prolongados en los embarques en 30 cm para guiar el recorrido y servir como elemento de apoyo y agarre durante la circulación. Los pasamanos deberán quedar rematados de forma curva o hacia abajo de modo que se eviten colisiones o enganches en los extremos.

IMÁGENES




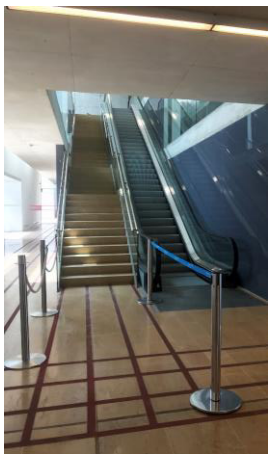

E10 1

ESCALERAS MECÁNICAS

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	14-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se analizan en este apartado las escaleras mecánicas existentes en la Estación Marítima. Debemos tener presente que es necesario ofrecer una opción accesible a las escaleras mecánicas como son los ascensores accesibles.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
	No permitida su utilización a personas usuarias de silla de ruedas.			
NO	Escaleras acompañadas de señalización de ascensores.			
SÍ	Si dispone de dispositivo presencial, su accionamiento será progresivo			
	Dimensiones			
SÍ	Espacio de aproximación libre de obstáculos	Ø ≥150 cm		
SÍ	Anchura	≥100 cm	100 cm	
SÍ	Altura libre de obstáculos. Por debajo protegido con elemento en suelo ≥25 cm	<220 cm protegidos		Cerrada
SÍ	Huella	40 cm	40 cm	
SÍ	Velocidad	≤0,5 m/s	≤0,5 m/s	
NO	Superficie H antes de generar peldaños en arranque y final	≥3 peldaños	2,5 peldaños	
-	Altura pasamanos para desniveles ≤6 m	≥90 cm		
NO	Altura pasamanos para Desniveles >6 m	≥110 cm	100 cm	
SÍ	Proyeción horizontal antes y después de las superficies móviles	3 peldaños u 80 cm	2,5 peldaños	80 cm de longitud horizontal
SÍ	Pavimento táctil en embarques	A =Aescalera Profundidad 120 cm		
NO	Iluminación en comienzo y final	≥200 luxes		De 150 luxes en embarque a 900 en llegada
	Acabados			
SÍ	Comienzo y final de las escaleras mecánicas con una franja de pavimento táctil	Ficha U.9		Existe pavimento táctil de fondo 120 cm
NO	Borde y laterales de cada peldaño con una franja de de pintura amarilla reflectante	5 cm anchura		

CONCLUSIONES

Sería conveniente asegurar una iluminación constante en todo el recorrido salvado por la escalera así cómo señalizar el borde de cada peldaño con un franja de pintura amarilla reflectante de 5 cm de anchura.

IMÁGENES

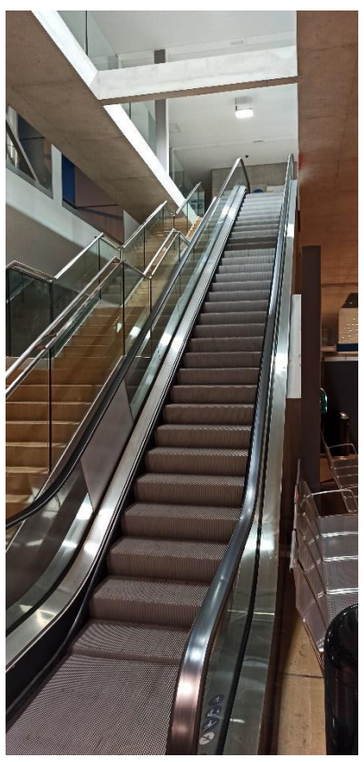

E14 3

MOSTRADORES DE VENTA DE BILLETES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	14-ESTACIÓN MARÍTIMA	VENTA BILLETES	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los espacios y equipamientos donde se produce la Atención al Cliente, deben estar diseñados para facilitar la labor a los trabajadores, así como permitir la máxima comodidad y prestaciones para los viajeros. En esta ficha se estudian los mostradores de venta de billetes presentes en la terminal de la estación marítima.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Fácil localización desde el acceso			Desde el acceso se señalizará mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m
SÍ	Sin aristas vivas y sin elementos volados más de 15 cm por debajo de 220 cm o bien con proyección vertical	a -220 cm no + de 15cm de volado o proy.vertical	Sin aristas ni elementos volados	
NO	Mostrador de información dotado con bucle de inducción con señalización normalizada (almenos 1 taquilla)			no existe bucle de inducción
NO	Personal de atención al público con conocimientos para atender a personas con diferentes capacidades y básicos de lengua de signos.			Personal sin conocimiento para atender a personas con diferentes discapacidades
NO	Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos.			No se dispone de sistema de comunicación de lengua de signos
	Dimensiones			
NO	Entre entrada y mostrador franja guía	A 40 cm		No existe franja guía
NO	Mostrador plano de trabajo	Anchura ≥100 cm	89 cm	
NO	Mostrador plano de trabajo altura:	h ≤85 cm	86 cm	
NO	Mostrador, Espacio libre inferior	≥70 cm x 100 cm x 60 cm (h x a x p)	76 cm x 89 cm x 25 cm	
NO	Iluminación	≥300 lux	53 luxes	
	Acabados			
SÍ	Información relevante en diferentes soportes como visual, táctil y acústico, apoyándose en la tecnología y en varios idiomas	Bloque 5		

CONCLUSIONES

Los mostradores se deben señalizar desde el acceso mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m. Se recomienda dotar almenos a un mostrador de venta de billetes con bucle de inducción y con su pertinente señalización normalizada. El personal de atención al público debe contar con conocimientos sobre cómo tratar con personas con diferentes capacidades y conocimientos básicos de lengua de signos. Se debe aumentar la anchura del plano de trabajo del mostrador a 100 cm y dotarlo de un espacio libre inferior de 70 cm de altrua x100 cm de ancho y 60 cm de profundidad.

IMÁGENES

E22 1

CONTROLES DE PASO Y SEGURIDAD

PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	01-DÁRSENAS NÁUTICO-DEPORTIVAS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los controles de paso y seguridad son elementos básicos en las instalaciones portuarias. Por ello su diseño debe garantizar la utilización segura y cómoda por parte de cualquier usuario, incluidas las personas con discapacidad.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Cumplirá con lo recogido en la Ficha E.4.			
-	Alternativa torniquete mediante puerta motorizada tipo pala o guillotina			No existe torniquete ni alternativa mediante puerta motorizada ni tipo pala o guillotina
SÍ	Altura libre de paso	≥220 cm.	≥220 cm.	
SÍ	Ancho libre	≥80 cm.	≥80 cm.	
SÍ	Elementos volados cumpliendo	Ficha U.18.	Cumple	
SÍ	Espacio previo y posterior horizontal libre de obstáculos de	≥150 cm	≥150 cm	
-	Anchura libre torno accesible	≥90 cm.		No hay torno
SÍ	Bandas en superficies acristaladas:	H1 =85 cm - 110 cm H2 =150 cm - 170 cm.	H1 =85 cm - 110 cm H2 =150 cm - 170 cm.	
NO	Diferencias de intensidad	≤100 lux.		Inicio pasillo control 140 lux, fin pasillo 330
NO	Iluminación	≥200 lux.		Inicio pasillo control 140 lux, fin pasillo 330
	Acabados			
SÍ	Iluminación homogénea, pudiendo reforzarse en paso PMR y diferenciarse con temperatura de color más fría	6500° K	6500° K	
SÍ	Señalización visual, tamaño en función de la distancia	Ficha C.7		
NO	Sistema de inducción	Ficha C.3		No hay sistema de inducción
NO	Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos.			No hay sistema de comunicación en lengua de signos
NO	Se recomienda utilización de pasos específicos para PMR usuarios de silla de ruedas y personas con carritos de bebés o similares, señalizadas.			No hay pasos específicos
NO	Arcos de seguridad:se advertirá del peligro de su uso por personas con implantes cocleares,se realizará control localizado evitando el implante con detector manual.			No hay aviso de peligro para personas con implantes cocleares

CONCLUSIONES

Asegurar una iluminación homogénea de al menos 200 lux. Añadir señalización.

IMÁGENES

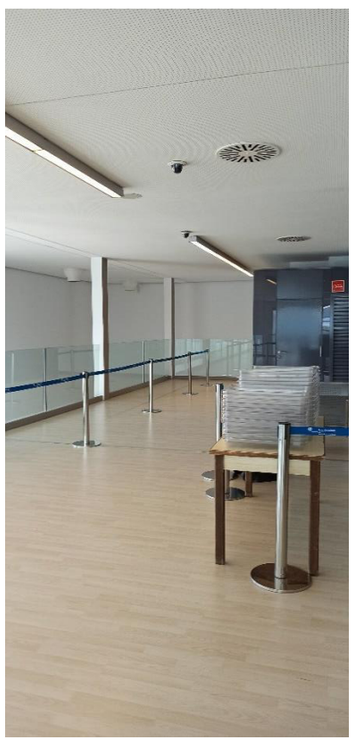
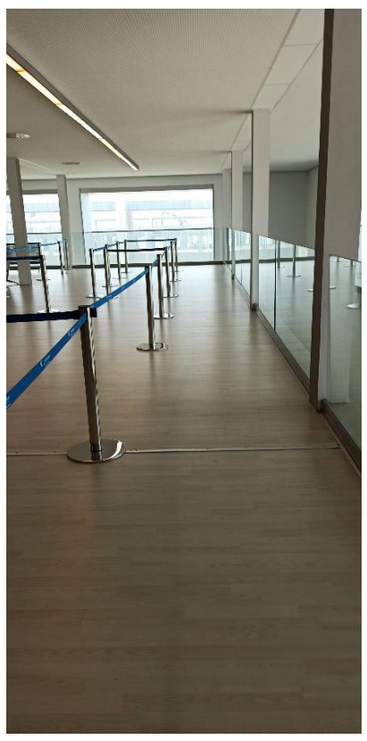
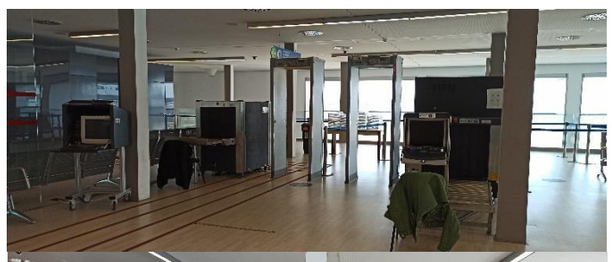
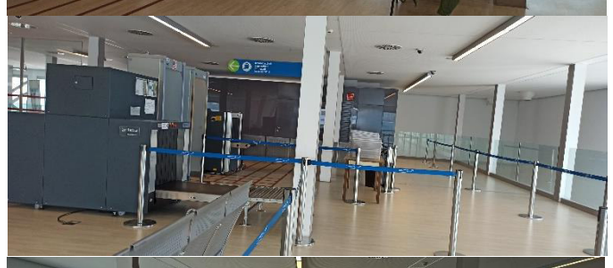
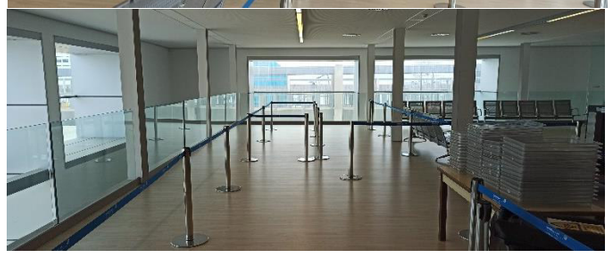

E1 3			
ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE EN ENTORNO URBANO			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	11-EDIFICIO DE LA LONJA DE PESCADORES		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En esta ficha estudiaremos el itinerario peatonal situado en el entorno urbano del edificio de vestuarios perteneciente a la Lonja de Pescadores

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Anchura mínima libre de obstáculos	120 cm	Superior	
SÍ	Anchura mínima libre de obstáculos en cambios de dirección	150 cm	>150 cm	
SÍ	Anchura cruce usuarios silla de ruedas	180 cm		
SÍ	Altura mínima libre de obstáculos	220 cm	>220 cm	
-	Pendiente longitudinal máxima	6%		Existen rampas del 7% de pendiente
-	Si pndt longitudinal > 6 % colocar zonas de descanso a máx 50 m con pasamanos.			
NO	Pendiente transversal máxima	1,5%		Se supera en el vado situado en la zona de venta de pescado
SÍ	Pendiente mínima transversal	1,0%		
NO	Nivel mínimo de iluminación a nivel de suelo. Recomendado 100 lux.	50 luxes	Inferior	
SÍ	El pavimento del itinerario peatonal será accesible, cumplirá lo señalado en la Ficha U.8. Pavimentos exteriores.			
	Discontinuidades longitudinales:			
SÍ	D ≤15 cm plano inclinado ≤25%			
	D>15 cm, Salvar con rampas Ficha E.8.			Existen rampas.
	Discontinuidades laterales:			
-	> 15 cm debe incorporar barandillas de > 90 cm de altura			No existen barandillas.
SÍ	Pavimento accesible exterior Ficha U.8.	Ficha U.8.		

CONCLUSIONES

No existe un itinerario peatonal accesible. Para acceder a la puerta de acceso de la Lonja de Pescadores, que conecta con la zona de oficinas, es necesario traspasar un espacio compartido por coches y peatones. El edificio de la Lonja de Pescadores se sitúa sobre una plataforma elevada 20 cm con respecto a la cota de suelo por lo que debemos tomar una rampa de 5,6 m de longitud y ancho de 2,1 m, que no cuenta con pasamanos ni zócalo de seguridad, para llegar a la cota de acceso. En cuanto a la puerta de acceso que comunica con el espacio de venta de pescado, accedemos a través de un vado que tiene una pendiente longitudinal del11%. Se plantea eliminar el vado existente y colocar una rampa accesible con un espacio horizontal previo y posterior donde se pueda colocar una circunferencia de 150 cm diámetro con una pendiente longitudinal del 10% con barandilla y zócalo de seguridad. Así daríamos respuesta a la conexión de la plataforma superior dónde se sitúa el edificio con la cota inferior compartida por tráfico rodado y peatones. Se deberá señalizar el itinerario peatonal accesible reservado al peatón en el espacio de uso mixto siguiendo lo parámetros marcados por la normativa.

IMÁGENES

E2 3			
PUERTAS DE ACCESO			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	11-EDIFICIO DE LA LONJA DE PESCADORES		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

El acceso a la edificación es el punto de conexión entre el espacio exterior y edificado. En esta ficha se trata de especificar la identificación y localización de la puerta de acceso y salida de la Lonja de Pescadores.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Mínimo un acceso accesible en cada edificios, a ser posible a coincidir con el acceso principal.			Espacio compartido por vehículos. Espacio aprox Ø ≥150 cm únicamente por el exterior
-	Si hay accesos no accesibles, el recorrido hasta el acceso accesible más próximo deberá estar señalizado según las condiciones del Bloque 5			No hay acceso accesible
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			Mecanismo a presión
SÍ	Puertas abatibles o correderas. No admisibles giratorias. No recomendadas puertas batientes automáticas.			Puerta abatible
-	Puertas batientes situadas en acceso a ser posible con barra de accionamiento horizontal en ambas caras.y resorte o dispositivo de cierre automático.			Sin barra de accionamiento horizontal
-	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente sobre máquinas.(Directiva 98/37/CE)			
-	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura			
	Dimensionado			
-	Discontinuidades umbral ≤2 cm, achaflanadas a 45°.			
NO	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm	90 cm interior	
SÍ	Altura libre	≥210 cm	228 cm	
NO	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja. Recomendable 90 cm	≥80 cm	45 cm	4 Hojas
SÍ	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm	Cumple	
-	Altura barra de accionamiento puertas baitentes	80 cm ± 5 cm,		No hay
SÍ	D mecnaismo apertura hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	≥40 cm	
SÍ	F apertura puerta salida ≤25 N (≤65 N cuando sean resistentes al fuego)		≤25	
-	Señalización en puertas de vidrio, franjas	Altura1: 120 cm Altura2: 170 cm		No hay
	Acabados			
NO	Itinerario Ficha E.1	E.1		Acceso compartido por vehículos
-	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8	C7-C8		No hay señalización
SÍ	Banda diferenciada cromáticamente en el contorno hueco			
-	Puertas de vidrio y fachadas de vidrio diferenciadas entre sí			No hay

CONCLUSIONES

Unidad no accesible. Será necesario substituir las puertas por otras cuyo ancho de paso mínimo se de 80 cm y el alto de 210 cm. Las puertas batientes situadas en acceso deben llevar, siempre que sea posible, una barra de accionamiento, de lado a lado, por ambas caras y a una altura de 80 cm ± 5 cm, así como unresorte o dispositivo de cierre automático que evite que queden entreabiertas. Se asegurará un espacio horizontal previo y posterior a las puertas de acceso donde se pueda incribir un círuclo de diámetro de 150 cm.

IMÁGENES

E5 3			
PUERTAS DE PASO			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	11-EDIFICIO DE LA LONJA DE PESCADORES		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las puertas junto con las áreas de conexión horizontal, son los dos elementos que garantizan una circulación accesible entre diferentes espacios al mismo nivel.
Un diseño inadecuado de las puertas, de alguna de las partes que las conforman o de los huecos de paso puede impedir que todas las personas utilicen el edificio en condiciones de seguridad e igualdad.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
-	No se recomienda usar puertas de vaivén			
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			Maneta a presión
-	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura.	40 cm		
-	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente.			
	Dimensiones			
NO	Espacio de aproximación	Ø ≥120 cm		No se cumple en aseos ni almacenes
-	Parte transparente o traslucida en puertas de vaivén	mín. de 70 cm a 150 cm		
-	Si pasillos A <250 cm puertas abatibles retranqueadas			
SÍ	Ángulo en p abatibles	≥90°	≥90°	
-	Espacio p. corredera hoja-marco	≥5 cm		
-	Hueco admisible en carril	≤1,5 cm.No admite resalte		
NO	Altura libre	≥210 cm	200 cm	
NO	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja	≥80 cm	Alamacenes: 1m. Resto:71 cm.	
SÍ	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm	0 cm - 120 cm	
SÍ	D hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	≥40 cm	
SÍ	F apertura puerta	25 N .≤65 N resist fuego	≤25	
NO	Señalización en puertas de vidrio. Franjas.	Altura1:120 cm Altura2:170cm		No hay señalización.
	Acabados			
-	Itinerario Ficha E.1			
NO	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8			Sin comunicación acústica. Itinerarios interiores sin señales de direccionamiento. Baño no accesible sin señalización.
NO	Puertas de aseos adaptados Ficha E.24			No existen aseos adaptados
SÍ	Puerta contrastada en hoja o en marco			

CONCLUSIONES

Conveniente adaptar las puertas de paso a las medidas mínimas de Altura 210 cm y ancho 80 cm.
Conveniente girar el sentido de apertura de las puertas en la zona de almacenillos para así, no invadir el itierario peatonal. Puertas en vestíbulo de acceso en zona de venta de pesacado de doble hoja y hueco de 124 x198 cm.Una de sus hojas debería cumplir medidas mínimas de 80 cm x 210 cm.
Puertas en vestíbulo ppal de doble hoja y hueco de 69x196 cm. Una de sus hojas debería cumplir medidas mínimas de 80 cm x 210 cm.

IMÁGENES

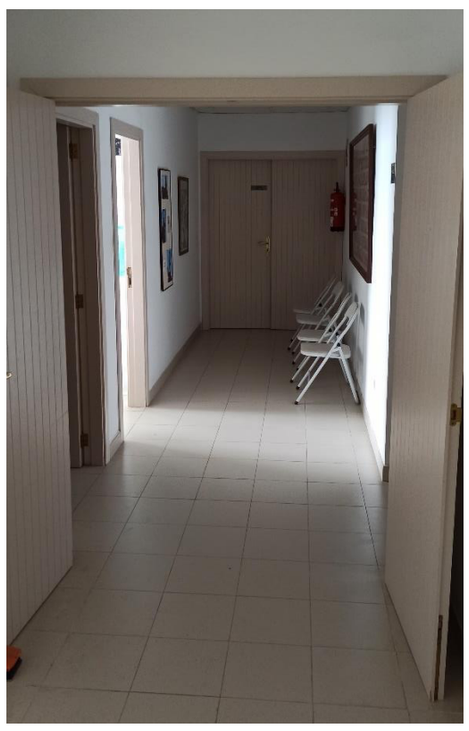

E6 3			
PASILLOS Y ÁREAS DE CONEXIÓN			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	11-EDIFICIO DE LA LONJA DE PESCADORES		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En esta ficha se estudian los pasillos, pasarelas y áreas de conexión existentes entre los diferentes ámbitos del edificio de la Lonja de Pescadores

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Entre áreas al menos un pasillo accesible que las conecte			No accesible pasillo baño oficinas (93cm), baño venta pescado (95cm). Pasillo almacenillo afectado por barrido de puertas.
-	En pasillos no accesibles, el accesible más próximo deberá estar señalizado			
	Dimensiones			
NO	Anchura libre	Ø ≥120 cm		No accesible pasillo baño oficinas, baño venta pescado. Pasillo almacenillo afectado por barrido de puertas. También afectado por el barrido de puertas distribuidor 1 P0 a zona de venta pescado.
SÍ	Estrechamientos admisibles	A ≥100 cm a lo largo de 50 cm	A ≥100 cm a lo largo de 50 cm	
-	Si se prevé cruce de dos personas usuarias de silla de ruedas	A ≥180 cm		
-	Cambios de dirección, cada 10,00 m máximo	Ø =150 cm		
SÍ	Altura	≥220 cm	≥220 cm	
NO	Elementos volados altura <220 cm deben contar con en su proyección vertical de elementos de altura ≥25 cm medidos desde el suelo.	elemento perimetral de A ≥25 cm		Sin elementos de protección bajo escalera
NO	Iluminación	≥100 lux		P01 Ditribuidor zona frigorífico 45 lux
SÍ	Se recomienda que la frecuencia de las luces intermitentes sea inferior a 5 Hz	5 Hz		
	Acabados			
SÍ	Pavimento accesible	Ficha E.4		
NO	Señalización	Bloque 5		
SÍ	La señalización tendrá el tamaño adecuado en funciónde la distancia	Ficha C.7		

CONCLUSIONES

Se trata de un edificio no accesible para PMR. El itinerario para acceder al edificio es compartido por vehículos y peatones. El edificio cuenta con dos planta sin alternativa de circulación vertical accesible y sus escaleras no cumplen los parámetros de accesibilidad.
_Son pasillos no accesibles lo que dan acceso al baño oficinas (93cm), baño venta pescado (95cm) y almacenillos, afectado por barrido de puertas por lo que debería cambiarse el sentido de giro de éstas. _Se debe modificar la configuración de los aseos para introducir baños accesibles. _Se debe señalizar el bajo escalera que se encuentra por debajo de 220 cm.

IMÁGENES

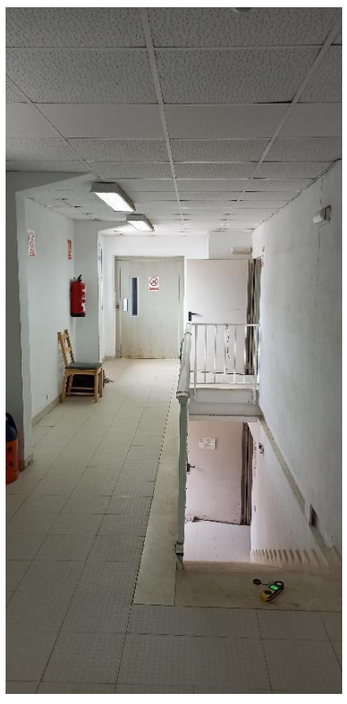

E7 3			
ESCALERAS FIJAS INTERIORES			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	11-EDIFICIO DE LA LONJA DE PESCADORES		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se analiza la escalera fija de uso habitual existente en el edificio de la Lonja de Pescadores que conecta con las oficinas de la lonja.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Con alternativa Accesible próxima y señalizada	Rampas Ficha E.8 Ascensores Ficha E.10		No existe alternativa accesible
SÍ	Directriz recta o ligeramente curva		Directriz recta	
NO	Contrahuella obligatoria. No admisible: solapes ni bocel. Escalones dimensiones iguales.		Existe bocel	
	Dimensiones			
SÍ	Tramos	Mín 3 esc. Máx 10 esc	Mín 3 esc. Máx 10 esc	
NO	Anchura	≥120 cm	118 cm	
NO	Altura espacio inferior escalera	<220 cm protegidos		No protegido
SÍ	Relación, proporciones.	54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm	66 cm	
SÍ	Huella	30 cm ≤ H ≤ 36 cm	32 cm	
NO	Contrahuella o tabica	13 cm ≤ C ≤ 16 cm	17 cm	
NO	Ángulo entre H y C	90°		Bocel de 3 cm de saliente y alto 3 cm
NO	Rellanos: A =A de escalera y Profundidad ≥A de escalera.	120 cm en recto recomendable 150 cm cambios dirección	265 x 92 cm	
NO	Inicio y final de la escalera, espacio de A =A escalera y Profundidad	≥150 cm	124 cm	
	Acabados			
NO	Señalización en el ancho del escalón, tira antideslizante contrastada (textura y color)	de 5 cm a 3 cm del borde		No hay señalización en escalón
SÍ	En Inicio y final situar franja de pavimento táctil de acanaladura contrastado			No hay pavimento táctil
-	Altura pavimento táctil	3 mm ± 1 mm		
-	anchura líneas de franja	≥25 mm y < 30 mm		
-	separación entre ejes de franjas	≥60 mm y < 65 mm		
NO	A franja de pavimento táctil=A escalera y Profundidad ≥120 cm	Ficha U.9		No hay franja
SÍ	Escalera: Pavimento accesible	clase 2. Ficha E.4	Cumple	
NO	Pasamanos y barreras de protección accesibles	Ficha E.9	100 cm	Huecos entre barrotes ≥ 10 cm

CONCLUSIONES

Será necesario rehacer la configuración de la escalera para cumplir con los parámetros de escalera accesible. Deberá contar con una anchura mínima de 120 cm, con mesetas de igual anchura y profundidad de 150 cm preferiblemente. Sus huellas deberán tener una profundidad de entre 30 cm ≤ H ≤ 36 cm y la contrahuella una altura de entre 13 cm ≤ C ≤ 16 cm. La suma de 2 contrahuellas y una huella no deberá superar los 70 cm. La contrahuella no deberá admitir bocel ni solapes. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil de ancho igual a la escalera y profundidad de120 cm. Pavimento de acanaladura, en dirección perpendicular a la marcha, de 3 mm ± 1 mm de altura, 25 mm ≤ anchura de franja < 30 mm y 60 mm ≤ separación entre ejes de franjas < 65 mm. Anchura pavimento señalizador la misma que la escalera. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera a doble altura.

IMÁGENES

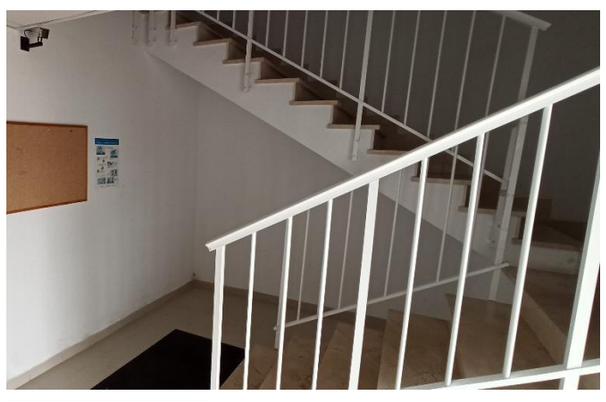

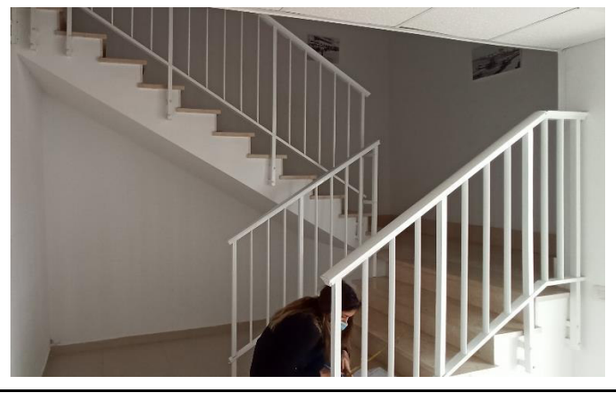

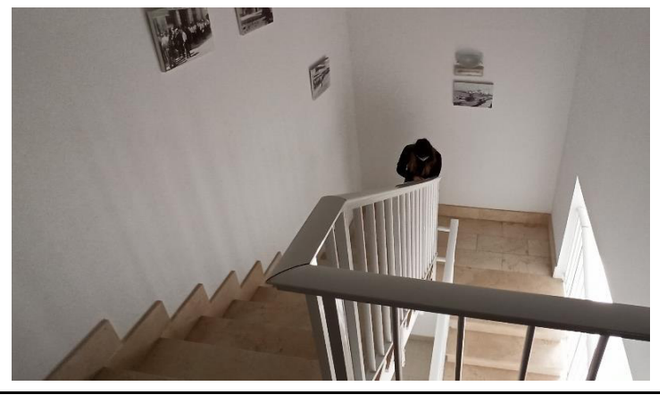

E7 2			
ESCALERAS FIJAS INTERIORES			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	11-EDIFICIO DE LA LONJA DE PESCADORES		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se analiza la escalera fija de uso habitual existentes en el edificio de la Lonja de Pescadores que conecta los almacenes de planta baja y planta primera.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Con alternativa Accesible próxima y señalizada	Rampas Ficha E.8 Ascensores Ficha E.10		No existe alternativa accesible
SÍ	Directriz recta o ligeramente curva		Directriz recta	
NO	Contrahuella obligatoria. No admisible: solapes ni bocel. Escalones dimensiones iguales.		Existe bocel	Bocel
	Dimensiones			
NO	Tramos	Mín 3 esc. Máx 10 esc	16 esc	
NO	Anchura	≥120 cm	110 cm	
NO	Altura espacio inferior escalera	<220 cm protegidos		No protegido
	Relación, proporciones.	54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm	67 cm	
SÍ	Huella	30 cm ≤ H ≤ 36 cm	33 cm	
NO	Contrahuella o tabica	13 cm ≤ C ≤ 16 cm	17 cm	
NO	Ángulo entre H y C	90°		Bocel de 3 cm de saliente y alto 3 cm
NO	Rellanos: A =A de escalera y Profundidad ≥A de escalera.	120 cm en recto recomendable 150 cm cambios dirección		Sin rellano
NO	Inicio y final de la escalera, espacio de A =A escalera y Profundidad	≥150 cm		Invadido por el itinerario peatonal
	Acabados			
NO	Señalización en el ancho del escalón, tira antideslizante contrastada (textura y color)	de 5 cm a 3 cm del borde		No hay señalización en escalón
NO	En Inicio y final situar franja de pavimento táctil de acanaladura contrastado			No hay franja de pavimento táctil
-	Altura pavimento táctil	3 mm ± 1 mm		
-	anchura líneas de franja	≥25 mm y < 30 mm		
-	separación entre ejes de franjas	≥60 mm y < 65 mm		
NO	A franja de pavimento táctil=A escalera y Profundidad ≥120 cm	Ficha U.9		No hay franja
SÍ	Escalera: Pavimento accesible	clase 2. Ficha E.4	Cumple	
NO	Pasamanos y barreras de protección accesibles	Ficha E.9	97 cm	Huecos entre barrotes ≥ 10 cm

CONCLUSIONES

Será necesario rehacer la configuración de la escalera para cumplir con los parámetros de escalera accesible. Deberá contar con una anchura mínima de 120 cm, con mesetas de igual anchura y profundidad de 150 cm preferiblemente. Sus huellas deberán tener una profundidad de entre 30 cm ≤ H ≤ 36 cm y la contrahuella una altura de entre 13 cm ≤ C ≤ 16 cm. La suma de 2 contrahuellas y una huella no deberá superar los 70 cm. La contrahuella no deberá admitir bocel ni solapes. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil de ancho igual a la escalera y profundidad de120 cm. Pavimento de acanaladura, en dirección perpendicular a la marcha, de 3 mm ± 1 mm de altura, 25 mm ≤ anchura de franja < 30 mm y 60 mm ≤ separación entre ejes de franjas < 65 mm. Anchura pavimento señalizador la misma que la escalera. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera a doble altura.

IMÁGENES

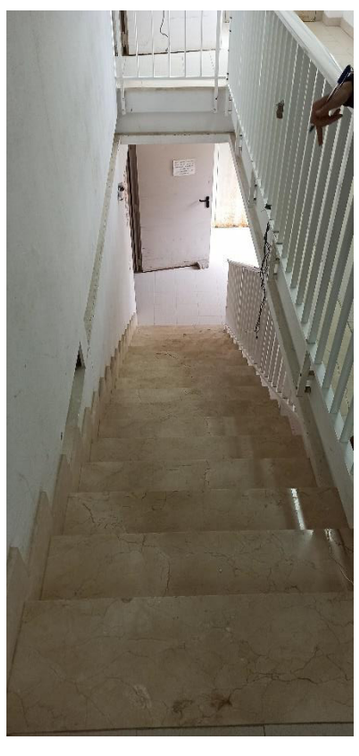

E9 2			
PASAMANOS Y BARANDILLAS			
PUERTO	ALCÚDIA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	11-EDIFICIO DE LA LONJA DE PESCADORES		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las barandillas y los pasamanos son elementos de apoyo y protección para las personas. Sirven para proteger los cambios de nivel y mejorar la deambulación en los itinerarios verticales. En esta ficha estudiaremos la tipología situada en las escaleras del edificio de la Lonja de Pescadores.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Pasamanos continúo a ambos lados a doble altura.			Pasamanos a un solo lado, a una sola altura
NO	Pasamanos prolongados en los embarques en 30 cm.	30 cm		No prolongado
NO	Pasamanos rematados de forma curva o hacia abajo.			Sin remate
SÍ	En los lados abiertos de escaleras y rampas, colocar barandillas para evitar caídas junto a desniveles con diferencia de cota ≥55 cm.	≠ de cota ≥55 cm		
SÍ	Todos los elementos son continuos, estables y sin cantos vivos			
SÍ	Dimensiones			
-	Altura zócalos rampas	≥10 cm		No hay rampa
SÍ	Sección pasamanos	3,5 - 5 cm	3,5 - 5 cm	
-	Separación pasamanos al paramento	5 cm		Un mismo elemento, sin separación
SÍ	Si separación >5 cm, debe aumentarse el ancho de la escalera o rampa.			
NO	Pasamanos dobles	H1 =90 cm - 95 cm. H2 =70 cm - 75 m.		No hay pasamanos dobles
-	rampa o escalera fija con pasamanos doble central	ancho ≥4 m	110 - 118 cm	Ancho menor a 4 metros
SÍ	Altura Barandillas-barreras de protección	≥90 cm desniveles ≤6 m__ ≥110 cm desnivel >6 m	97 - 100 cm	
SÍ	Barandillas no escalables:	no admisible apoyo entre 20- 70 cm de altura		
SÍ	Aberturas en barandillas	≤10 cm	≥10	
SÍ	Barandillas deben soporta una fuerza concentrada en la posición más desfavorable	≥1,5 kN	≥1,5 kN	
NO	Color contrastado en pasamanos y zócalos			Sin zócalo o pasamanos independiente de la barandilla
SÍ	Control de la inercia térmica de los materiales ext			

CONCLUSIONES

Se deberá realizar un diseño dónde las aberturas entre los elementos de la barandilla no superen los 10 cm y la distancia entre el límite inferior de la barandilla y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. Se debe disponer de pasamanos a ambos lados y prolongados en los embarques en 30 cm para guiar el recorrido y servir como elemento de apoyo y agarre . Los pasamanos deberán quedar rematados de forma curva o hacia abajo para evitar colisiones o enganches en los extremos.Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 3,5 cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos. Estarán separados del paramento vertical al menos 5 cm, el sistema de sujeción será firme y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.

IMÁGENES

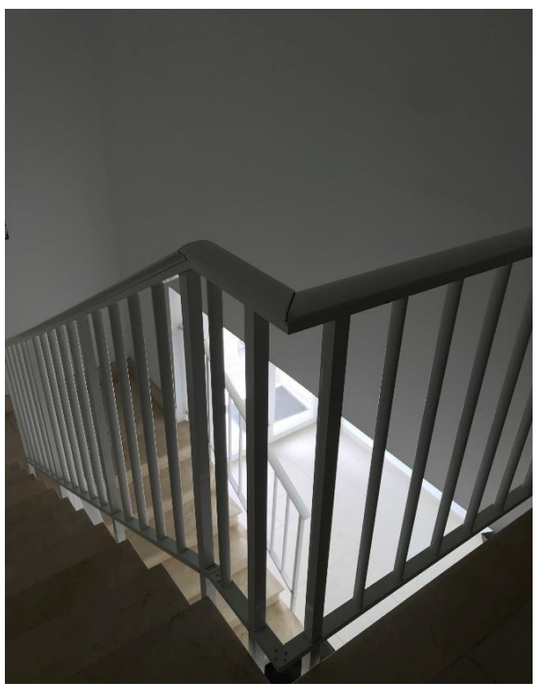

3. PUERTO DE MAÓ

E1 3			
ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE EN ENTORNO URBANO			
PUERTO	MAÓ	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Para que todas las personas puedan circular adecuadamente en entornos edificados, los itinerarios se realizarán de forma que los distintos espacios destinados a los usuarios, tengan acceso y se encuentren interconectados a través de un itinerario peatonal accesible.
Las características fundamentales del itinerario accesible son la continuidad y la seguridad. En esta ficha estudiaremos el itinerario situado en el entorno urbano de la Estación Marítima de Cruceros.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Anchura mínima libre de obstáculos	120 cm	110 cm	
NO	Anchura mínima libre de obstáculos en cambios de dirección	150 cm		
NO	Anchura cruce usuarios silla de ruedas	180 cm		
SÍ	Altura mínima libre de obstáculos	220 cm	>220 cm	
NO	Pendiente longitudinal máxima	6%	Rampa 13%	
-	Si pndt longitudinal > 6 % colocar zonas de descanso a máx 50 m con pasamanos.			
SÍ	Pendiente transversal máxima	1,5%	<1,5%	
SÍ	Pendiente mínima transversal	1,0%	>1,0%	
NO	Nivel mínimo de iluminación a nivel de suelo. Recomendado 100 lux.	50 luxes	Inferior	
SÍ	El pavimento del itinerario peatonal será accesible, cumplirá lo señalado en la Ficha U.8. Pavimentos exteriores.			
	Discontinuidades longitudinales:			
-	D ≤15 cm plano inclinado ≤25%			
-	D>15 cm, Salvar con rampas Ficha E.8.			
	Discontinuidades laterales:			
-	> 15 cm debe incorporar barandillas de > 90 cm de altura			
SI	Pavimento accesible exterior Ficha U.8.	Ficha U.8.		

CONCLUSIONES

El itinerario peatonal no es accesible en el entorno urbano de la Estación Marítima de Cruceros. La anchura de las calles es inferior a la anchura mínima marcada por la normativa.

IMÁGENES

E2 3

PUERTAS DE ACCESO

PUERTO	MAÓ	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

El acceso a la edificación es el punto de conexión entre el espacio exterior y edificado. En esta ficha se trata de especificar la identificación y localización de la puerta corredera de acceso al edifico de la Estación Marítima de Cruceros.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Mínimo un acceso accesible en cada edificios, a ser posible a coincidir con el acceso principal.			Acceso a través de una rampa no accesible o escaleras.
NO	Si hay accesos no accesibles, el recorrido hasta el acceso accesible más próximo deberá estar señalizado según las condiciones del Bloque 5			
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			Automático
SÍ	Puertas abatibles o correderas. No admisibles giratorias. No recomendadas puertas batientes automáticas.			Correderas
-	Puertas batientes situadas en acceso a ser posible con barra de accionamiento horizontal en ambas caras.y resorte o dispositivo de cierre automático.			
SÍ	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente sobre máquinas.(Directiva 98/37/CE)			
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura			
	Dimensionado			
SÍ	Discontinuidades umbral ≤2 cm, achaflanadas a 45°.			No hay discontinuidades en el umbral
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm	170 cm	
SÍ	Altura libre	≥210 cm	218 cm	
SÍ	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja. Recomendable 90 cm	≥80 cm	90 cm	
-	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		Puerta corredera
-	Altura barra de accionamiento puertas baitentes	80 cm ± 5 cm,		
-	D mecnaismo apertura hasta el encuentro en rincón	≥40 cm		
SÍ	F apertura puerta salida ≤25 N (≤65 N cuando sean resistentes al fuego)			
NO	Señalización en puertas de vidrio, franjas	Altura1: 120 cm Altura2: 170 cm		Señalización mediante pegatinas circulares de color verde. Poco contraste cromático.
	Acabados			
NO	Itinerario Ficha E.1	E.1		
NO	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8	C7-C8		
NO	Banda diferenciada cromáticamente en el contorno hueco			
NO	Puertas de vidrio y fachadas de vidrio diferenciadas entre sí			Poco contraste, falta señalización por franjas.

CONCLUSIONES

Las puertas de vidrio al estar situadas en fachadas acristaladas deberán diferenciar la parte móvil (puerta) de la fija (fachada), mediante el uso de señalización con, por ejemplo, diferente diseño o color. En las puertas de vidrio se colocará señalización mediante franjas de color contrastado, rojo por ejemplo, a una altura de 120 cm y 170 cm. El contorno del hueco de paso se señalizará mediante una banda cromáticamente diferenciada del paramento vertical.

IMÁGENES

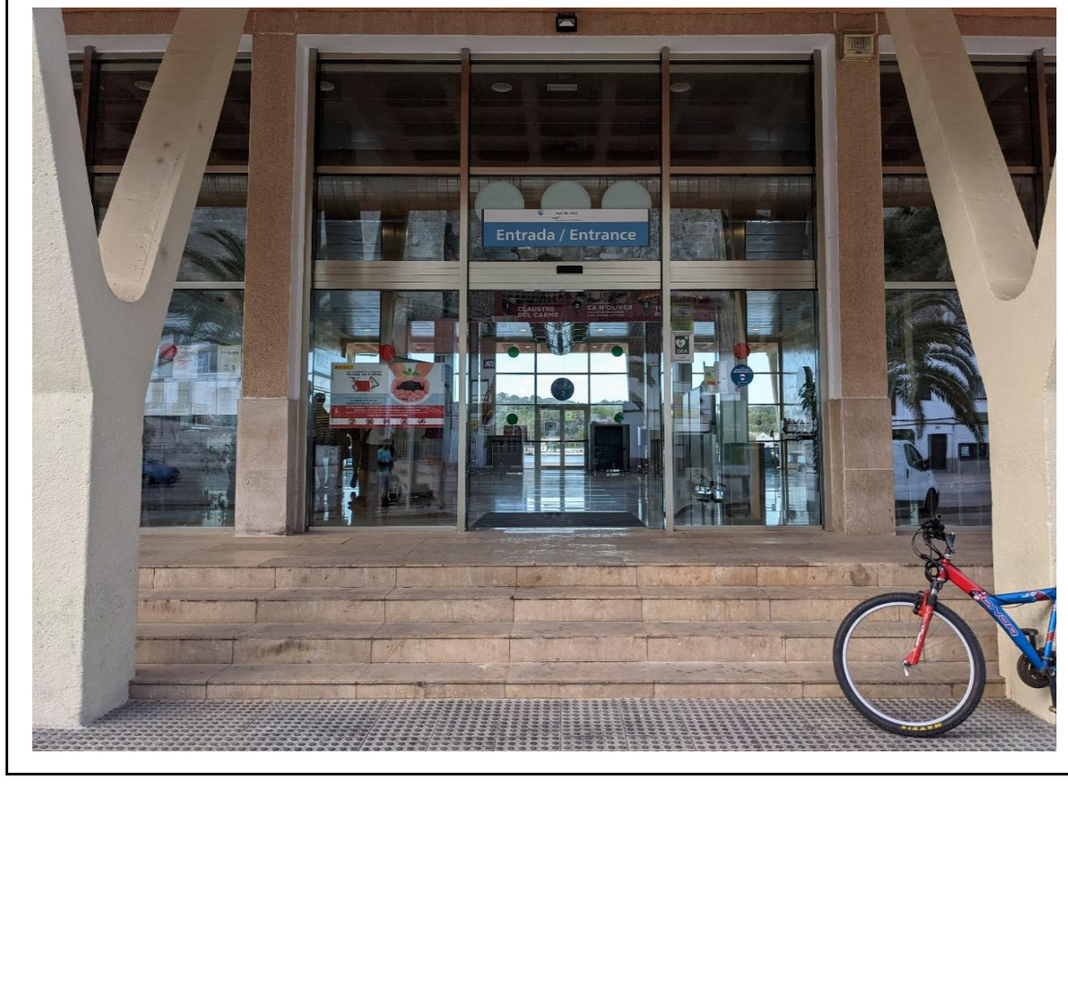

E2 4			
PUERTAS DE ACCESO			
PUERTO	MAÓ	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

El acceso a la edificación es el punto de conexión entre el espacio exterior y edificado. En esta ficha se trata de especificar la identificación y localización de las puertas batientes de acceso al edifico de la Estación Marítima de Cruceros.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Mínimo un acceso accesible en cada edificios, a ser posible a coincidir con el acceso principal.			Acceso a través de una rampa no accesible o escaleras.
NO	Si hay accesos no accesibles, el recorrido hasta el acceso accesible más próximo deberá estar señalizado según las condiciones del Bloque 5			
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			Funcionamiento por presión en maneta
SÍ	Puertas abatibles o correderas. No admisibles giratorias. No recomendadas puertas batientes automáticas.			Abatibles
NO	Puertas batientes situadas en acceso a ser posible con barra de accionamiento horizontal en ambas caras.y resorte o dispositivo de cierre automático.			Sin barra de accionamiento horizontal
-	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente sobre máquinas.(Directiva 98/37/CE)			
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura			Sin zócalo de seguridad
	Dimensionado			
SÍ	Discontinuidades umbral ≤2 cm, achaflanadas a 45°.			No hay discontinuidades en el umbral
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm	170 cm	
SÍ	Altura libre	≥210 cm	216 cm	
NO	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja. Recomendable 90 cm	≥80 cm	64 cm	
SÍ	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm	103 cm	
-	Altura barra de accionamiento puertas baitentes	80 cm ± 5 cm,		
SÍ	D mecnaismo apertura hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	≥40 cm	
SÍ	F apertura puerta salida ≤25 N (≤65 N cuando sean resistentes al fuego)			
NO	Señalización en puertas de vidrio, franjas	Altura1: 120 cm Altura2: 170 cm		Sin señalización por franjas cromáticamente contrastadas.
	Acabados			
NO	Itinerario Ficha E.1	E.1		
NO	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8	C7-C8		
NO	Banda diferenciada cromáticamente en el contorno hueco			
NO	Puertas de vidrio y fachadas de vidrio diferenciadas entre sí			Poco contraste, falta señalización por franjas.

CONCLUSIONES

Se recomienda substituir las puertas existente por puertas correderas con el mismo diseño que aquellas colocadas en el centro de las fachada. Las puertas de vidrio al estar situadas en fachadas acristaladas deberán diferenciar la parte móvil (puerta) de la fija (fachada), mediante el uso de señalización con, por ejemplo, diferente diseño o color. En las puertas de vidrio se colocará señalización mediante franjas de color contrastado, rojo por ejemplo, a una altura de 120 cm y 170 cm. El contorno del hueco de paso se señalizará mediante una banda cromáticamente diferenciada del paramento vertical.

IMÁGENES

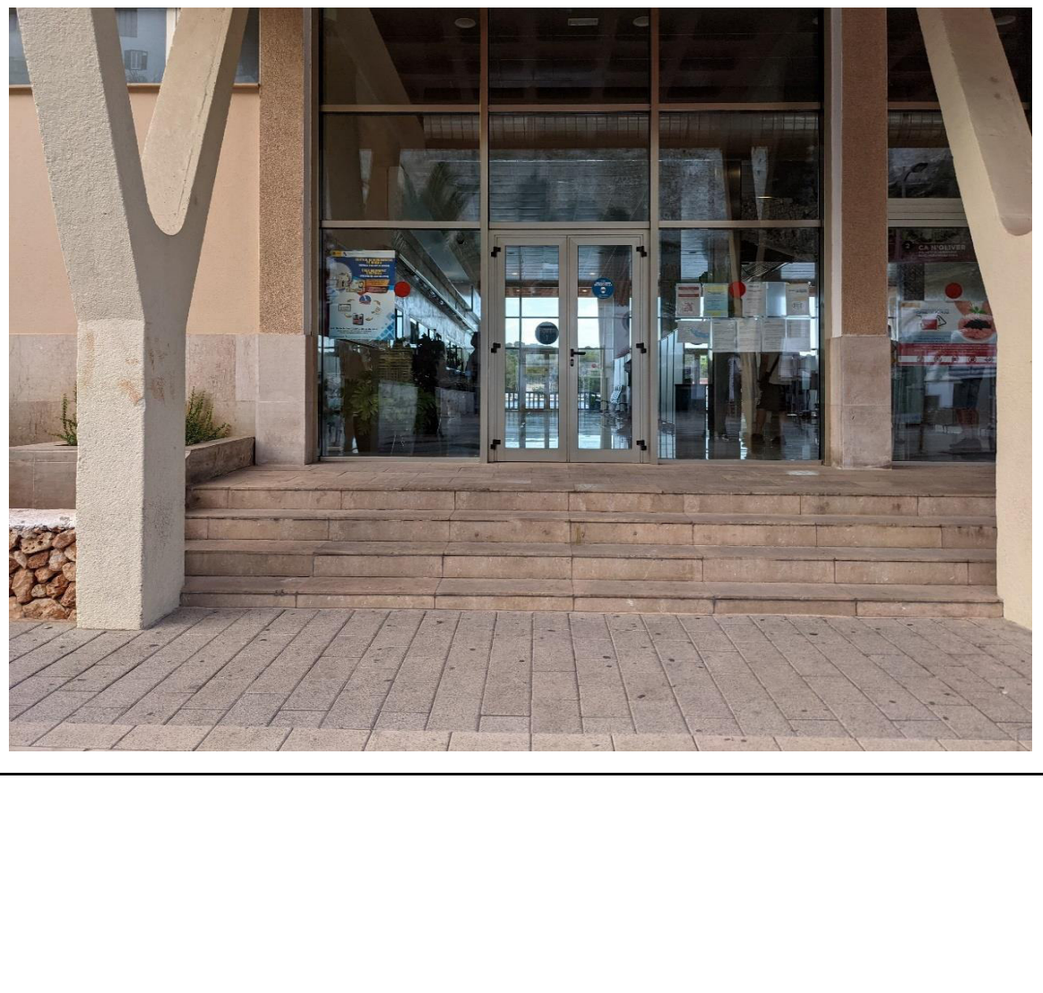

E3 4			
VESTÍBULOS			
PUERTO	MAÓ	**ÁMBITO**	EDIFICACIÓN
ZONA	09-ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los vestíbulos son espacios en los que se realiza la transición entre el exterior y el interior de la edificación y la accesibilidad es fundamental para garantizar el acceso y la salida en igualdad de condiciones. En esta ficha se estudia el vestíbulo situado en la Estación Marítima de Cruceros.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Felpudos y moquetas, encastrados o fijados alsuelo y resistentes a la deformación			
	Dimensionado			
SÍ	Espacio de giro libre de obstáculos, sin invadir por el barrido de las puertas	Ø = 150 cm	Ø = 150 cm	
-	Iluminación	≥200 luxes		
-	Diferencias de iluminación int-ext	≤100 lux		
	Acabados			
SÍ	Pavimento no deslizante (ensayo péndulo) ni en seco ni en mojado, de clase 2, con un coeficiente de Resistencia al deslizamiento entre 35< Rd ≤45	clase 2	clase 2	
SÍ	Características de itinerario accesible, seguir Ficha E.4. Pavimentos interiores.			
SÍ	Libres de obstáculos y elementos volados dando respuesta a la Ficha U.14.			
SÍ	Señalización según lo señalado en el Bloque 5			
NO	Espacios de atención al público según la Ficha E.21 Áreas de atención al público			Mostradores no accesibles
NO	Si existen espacios de espera, el mobiliario considerará lo recogido en la Ficha E.17. Asientos y Ficha E.18 Apoyos isquiáticos			Asientos no accesibles, sin pasamanos

CONCLUSIONES

Deberán existir asientos y mostradores accesibles. Se deberá asegurar un nivel de iluminación de 200 lux.

IMÁGENES

E7 3

ESCALERAS FIJAS INTERIORES

PUERTO	MAÓ	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se analizan las escaleras fijas de uso habitual existentes en la Estación Marítima de Cruceros

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Con alternativa Accesible próxima y señalizada	Rampas Ficha E.8 Ascensores Ficha E.10		
SÍ	Directriz recta o ligeramente curva		Directriz recta	
NO	Contrahuella obligatoria. No admisible: solapes ni bocel. Escalones dimensiones iguales.			Bocel de 2 cm
	Dimensiones			
SÍ	Tramos	Mín 3 esc. Máx 10 esc		
NO	Anchura	≥120 cm		Ancho mínimo 116 cm
NO	Altura espacio inferior escalera	<220 cm protegidos		No señalizado
SÍ	Relación, proporciones.	54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm		
SÍ	Huella	30 cm ≤ H ≤ 36 cm	32cm	
NO	Contrahuella o tabica	13 cm ≤ C ≤ 16 cm	17 cm	
NO	Ángulo entre H y C	90°		Bocel saliente
SÍ	Rellanos: A =A de escalera y Profundidad ≥A de escalera.	120 cm en recto recomendable 150 cm cambios dirección		Profunidad R1: 137 cm Profunidad R2: 155 cm
SÍ	Inicio y final de la escalera, espacio de A =A escalera y Profundidad	≥150 cm		
	Acabados			
NO	Señalización en el ancho del escalón, tira antideslizante contrastada (textura y color)	de 5 cm a 3 cm del borde		No hay señalización en el escalón
NO	En Inicio y final situar franja de pavimento táctil de acanaladura contrastado			No hay franja de pavimento táctil
-	Altura pavimento táctil	3 mm ± 1 mm		
-	anchura líneas de franja	≥25 mm y < 30 mm		
-	separación entre ejes de franjas	≥60 mm y < 65 mm		
-	A franja de pavimento táctil=A escalera y Profundidad ≥120 cm	Ficha U.9		
SÍ	Escalera: Pavimento accesible	clase 2. Ficha E.4		
NO	Pasamanos y barreras de protección accesibles	Ficha E.9	h barandilla 86 cm	Huecos superiores a 10 cm

CONCLUSIONES

Sería necesario rehacer la configuración de la escalera para cumplir con los parámetros de escalera accesible. Debería contar con una anchura mínima de 120 cm, con mesetas de igual anchura y profundidad de 150 cm preferiblemente. Sus huellas deberían tener una profundidad de entre 30 cm ≤ H ≤ 36 cm y la contrahuella una altura de entre 13 cm ≤ C ≤ 16 cm. La contrahuella no debería tener bocel ni solapes. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil de ancho igual a la escalera y profundidad de120 cm. Pavimento de acanaladura, en dirección perpendicular a la marcha, de 3 mm ± 1 mm de altura, 25 mm ≤ anchura de franja < 30 mm y 60 mm ≤ separación entre ejes de franjas < 65 mm. Anchura pavimento señalizador la misma que la escalera. Se deberían colocar pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera a doble altura.

IMÁGENES

Port de Maó
Ascensor
Lift
EN CASO DE INCENDIO
UTILICEN LAS ESCALERAS

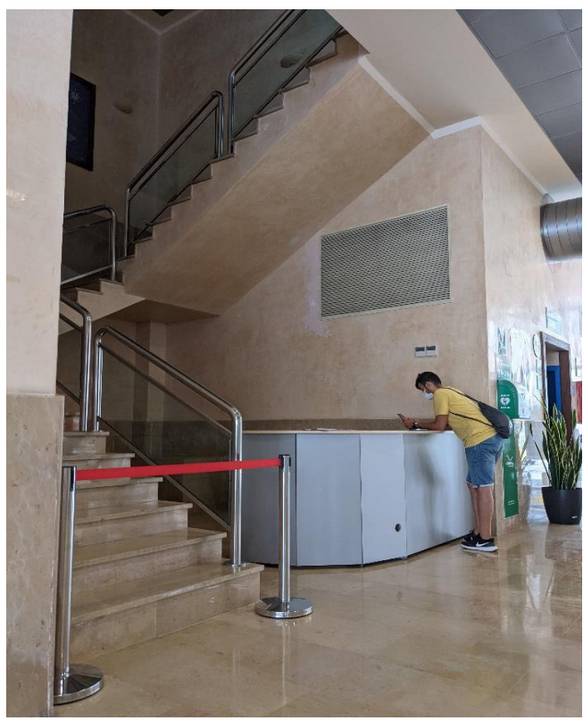

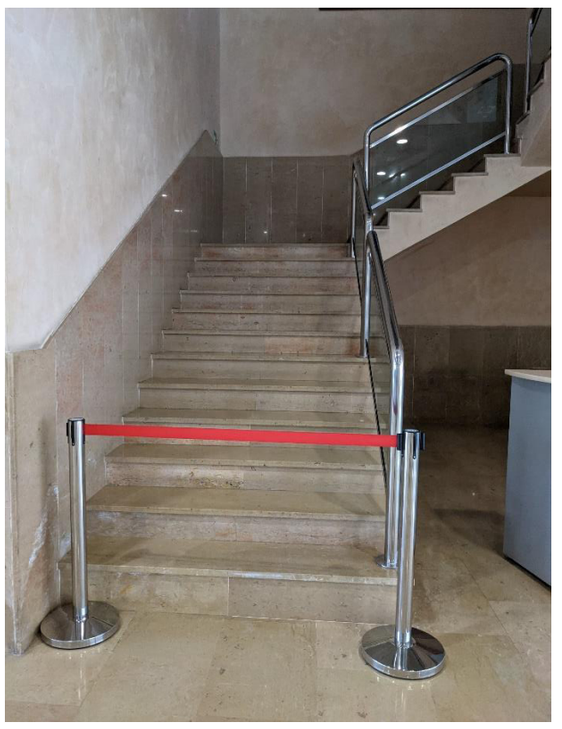

E9 3			
PASAMANOS Y BARANDILLAS			
PUERTO	MAÓ	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las barandillas los pasamanos y los zócalos son elementos de apoyo y protección para las personas. Sirven para proteger los cambios de nivel y mejorar la deambulación en los itinerarios verticales. En esta ficha estudiaremos los pasamanos y barandillas situados en la escalera del Corporación de Prácticos de Maó.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Pasamanos continúo a ambos lados a doble altura.			
NO	Pasamanos prolongados en los embarques en 30 cm.	30 cm		No prolongado
SÍ	Pasamanos rematados de forma curva o hacia abajo.			
SÍ	En los lados abiertos de escaleras y rampas, colocar barandillas para evitar caídas junto a desniveles con diferencia de cota ≥55 cm.	≠ de cota ≥55 cm		
NO	Todos los elementos son continuos, estables y sin cantos vivos			Discontinuo
SÍ	Dimensiones			
-	Altura zócalos rampas	≥10 cm		No hay rampa
NO	Sección pasamanos	3,5 - 5 cm		
NO	Separación pasamanos al paramento	5 cm		
-	Si separación >5 cm, debe aumentarse el ancho de la escalera o rampa.			
NO	Pasamanos dobles	H1 =90 cm - 95 cm. H2 =70 cm - 75 m.		No hay pasamanos dobles
-	rampa o escalera fija con pasamanos doble central	ancho ≥4 m		Ancho menor a 4 metros
NO	Altura Barandillas-barreras de protección	≥90 cm desniveles ≤6 m__ ≥110 cm desnivel >6 m	86 cm	
SÍ	Barandillas no escalables:	no admisible apoyo entre 20- 70 cm de altura		
NO	Aberturas en barandillas	≤10 cm	>10 cm	
SÍ	Barandillas deben soporta una fuerza concentrada en la posición más desfavorable	≥1,5 kN		
SÍ	Color contrastado en pasamanos y zócalos			
SÍ	Control de la inercia térmica de los materiales ext			

CONCLUSIONES

Se debe disponer de pasamanos a ambos lados a doble altura y prolongados en los embarques en 30 cm para guiar el recorrido y servir como elemento de apoyo y agarre durante la circulación. Los pasamanos deberán quedar rematados de forma curva o hacia abajo de modo que se eviten colisiones o enganches en los extremos. Los elementos de la barandilla no deberán estar separados más de 10 cm.

IMÁGENES

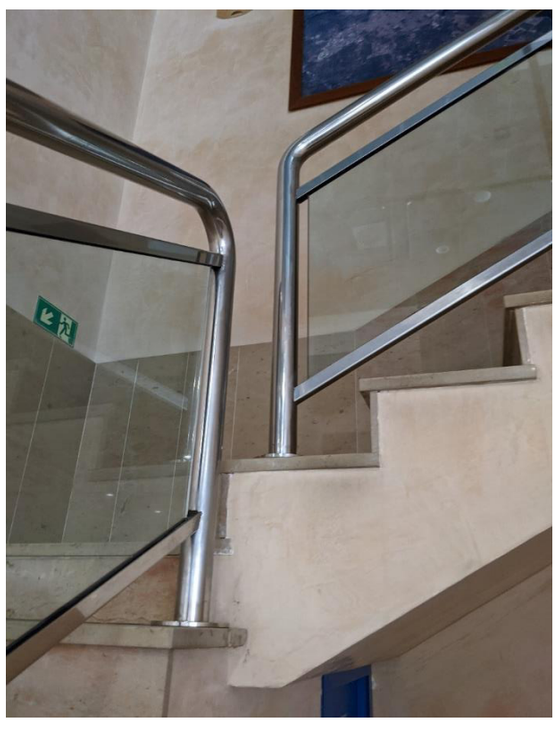

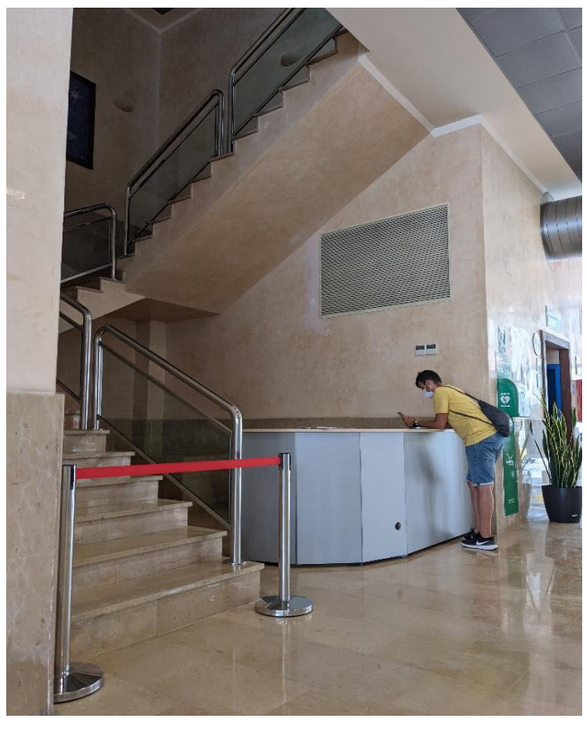

E12 1

ASCENSORES

PUERTO	MAÓ	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los ascensores son el medio más adecuado para el transporte de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y personas con perros guía. Deben vincularse claramente como alternativa a escaleras fijas o mecánicas, mediante señalización y proximidad. En esta ficha estudiaremos los parámetros del ascensor situado en la Estación Marítima de Cruceros.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Puertas automáticas con sensor anti-aprisionamiento			
SÍ	No admisibles puertas batientes o ascensores sin puerta			Puertas correderas automáticas
NO	Se recomienda en uso público puertas transparentes			Puertas opacas
NO	Pasamanos continuo estable y ergonómico. Ver Ficha E.9.	Ficha E.9		No hay pasamanos
	Dimensiones			
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm		
SÍ	Contará con mecanismo de auto-nivelado. El suelo de la cabina y el pavimento adyacente quedan enrasados			
NO	Entre suelo cabina y el pavimento exterior,distancia al forjado o GAP	≤2 cm	3 cm	
SÍ	Dimensiones mínimas de cabina 1 puerta	Ancho 110cm Profundidad 140 cm	Ancho 100cm Profunidad 120cm	125 cm x 220 cm
-	Dimensiones mínimas de cabina 2 puerta enfrentadas	Ancho 110cm Profundidad 140 cm		
-	Dimensiones mínimas de cabina 2 puerta en ángulo	Ancho 140cm Profundidad 140 cm		
SÍ	Altura libre en cabina	Mín 210 cm	220 cm	
SÍ	Ancho puertas	≥100 cm	110 cm	
SÍ	Altura puertas	≥2,00 m	200 cm	
-	Pasamanos	Ø =4 cm - 5 cm separado ≥4,5 cm		No hay pasamanos
-	Altura pasamanos	90 cm		No hay pasamanos
SÍ	Espacio libre junto a botoneras	≥20 cm	≥20 cm	
SÍ	Botoneras	90 cm - 120 cm	90 cm - 120 cm	
NO	Botones de emergencia y parada en la parte inferior del tablero y altura	>100 cm	>120 cm	
SÍ	Disposición de botones conforme:	UNE EN 81-70:2004		
NO	Embarque de ascensor Pavimento táctil acanaladura transversal	120 x 120 cm		No existe pavimento táctil
SÍ	Iluminación de cabina	200 lux	≥250 lux	
SÍ	Cumplirán requisitos para en el diseño y fabricación de ascensores y componentes de seguridad del Real Decreto 1314/1997 y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores	Real Decreto 1314/1997 Consejo 95/16/CE		
SÍ	cumplir especificaciones de accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad	UNE EN 81-70:2004		
	Acabados			
-	Si cabina <110 cm x 140 cm. dónde un usuario de silla de ruedas no puede girar se incluirá espejo	<110 cm x 140 cm		Cabina superior a 110 cm x 140 cm
-	Espejos de seguridad y evitando confusión óptica.			No hay espejos
SÍ	Pavimento firme, estable, no deslizante y sin discontinuidades			
SÍ	Marco exterior contrastado			
NO	Pavimento táctil acanaladura transversal conforme a Ficha U.9	Ficha U.9		No existe pavimeto como guía de dirección
NO	Indicador sonoro y visual de parada y nº de planta. Botones contrastados y con información visual, braille y alto relieven. Situados en la jamba izq. sentido salida.	120 cm de altura	indicador visual en interior ascensor>120 cm.	
NO	En uso público: bucle de inducción magnética	Según Real Decreto 1314/1997		

CONCLUSIONES

En el exterior de las cabinas disponer franjas de pavimento táctil de acanaladura colocadas en sentido transversal a la marcha frente a la puerta del ascensor, en todos los niveles, de 120 cm de ancho por 120 cm de fondo, cromáticamente contrastadas. Colocar símbolo SIA normalizado h =160 cm, junto al marco, a la dcha. sentido de la entrada. Se deben colocar pasamanos accesibles.

IMÁGENES

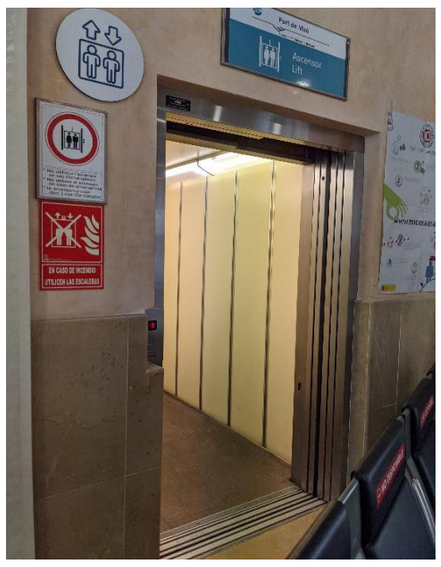
Ascensor
Lift
EN CASO DE INCENDIO
UTILICEN LAS ESCALERAS

OTIS
950 Kg. 12 P

CASO DE INCENDIO
ICEN LAS ESCALERAS

E14 2

MOSTRADORES DE VENTA DE BILLETES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

PUERTO	MAÓ	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los espacios y equipamientos donde se produce la Atención al Cliente, deben estar diseñados para facilitar la labor a los trabajadores, así como permitir la máxima comodidad y prestaciones para los viajeros. En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en la Estación Marítima de Cruceros.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Fácil localización desde el acceso			no hay señalización mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m
SÍ	Sin aristas vivas y sin elementos volados más de 15 cm por debajo de 220 cm o bien con proyección vertical	a -220 cm no + de 15cm de volado o proy.vertical		
NO	Mostrador de información dotado con bucle de inducción con señalización normalizada (almenos 1 taquilla)			sin bucle de inducción (sin señalización que lo indique)
-	Personal de atención al público con conocimientos para atender a personas con diferentes capacidades y básicos de lengua de signos.			
NO	Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos.			
	Dimensiones			
NO	Entre entrada y mostrador franja guía	A 40 cm		No existe franja guía
SÍ	Mostrador plano de trabajo	Anchura ≥100 cm	Anchura ≥100 cm	
NO	Mostrador plano de trabajo altura:	h ≤85 cm	120 cm	
-	Mostrador, Espacio libre inferior	≥70 cm x 100 cm x 60 cm (h x a x p)	72 cm x>100 cm x80 cm	No fue posible acceder a la zona privada de mostradores
NO	Iluminación	≥300 lux	<300lux	
	Acabados			
NO	Información relevante en diferentes soportes como visual, táctil y acústico, apoyándose en la tecnología y en varios idiomas	Bloque 5		

CONCLUSIONES

No existe ningún mostrador accesible en la Estación Marítima de Cruceros. Los mostradores deben estar comunicados con un itinerario accesible. Se deben señalizar desde el acceso mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m. Se debe dotar a los mostradores de bucle de inducción con su pertinente señalización normalizada. El personal de atención al público debe contar con conocimientos sobre cómo tratar con personas con diferentes capacidades y conocimientos básicos de lengua de signos. Se debe dotar a los mostradores de un espacio libre inferior de 70 cm de altrua x100 cm de ancho y 60 cm de profundidad situado tanto el la zona del trabajador como del usuario. Por último, se debe modificar la iluminación para que el nivel de iluminación en los puntos de atención al público sea de 300 lux.

IMÁGENES

E17 4			
ASIENTO			
PUERTO	MAÓ	**ÁMBITO**	EDIFICACIÓN
ZONA	09-ESTACIÓN MARÍTIMA DE CRUCEROS		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En circunstancias dónde los tiempos de espera aumentan considerablemente y las instalaciones deben dar respuesta a las necesidades de descanso de los usuarios. Los asientos deben garantizar comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas. En este apartado se estudiarán los asientos de la Corporación de Prácticos de Maó.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
	Número total en función de la concurrencia del espacio			
NO	Número. Al menos uno de ellos por cada agrupación será accesible, y al menos uno de cada cinco asientos o fracción.			
SÍ	Zona de asientos comunicado con el itinerario accesible sin invadirlo			
SÍ	Se permitirá la estancia de perros guía debajo de lo asientos	Ficha U.17		
NO	Con reposabrazos, respaldo y espacio libre inferior, bajo el asiento	Ficha U.17		Ningún asiento con reposabrazos
	Dimensiones			
-	En las salas de proyección, salones de actos, o similares se reservarán 2 plazas para sillas de ruedas por cada 100 o fracción	2 de 100		
-	Las plazas de sillas de ruedas estarán conectadas a los accesos por un itinerario accesible	ancho ≥1,50 m		
-	Medidas plazas silla de ruedas	90 cm x 120 cm (ancho x profundidad)		
-	zonas para personas con discapacidad visual y/o auditiva, en la zona delantera, próximas a los sistemas de sonido y sistemas de inducción.	Ficha C.3		
SÍ	Altura del plano del asiento:	40 cm - 45 cm.	45 cm	
SÍ	Profundidad del plano de asiento:	40 cm - 45 cm.	45 cm	
SÍ	Altura de apoyabrazos respecto al plano del asiento:	18 cm - 24 cm.		No hay apoyabrazos
SÍ	Altura del plano de respaldo medidos desde el suelo:	≥80 cm.	90 cm	
SÍ	Angulo máximo entre respaldo-vertical:	15°	Cumple	
SÍ	En su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos que no invadirá el itinerario peatonal accesible	≥60 cm.	≥60 cm.	
SÍ	Área libre anexa al menos a un lado.	Ø ≥150 cm	Ø ≥150 cm	
	Acabados			
SÍ	Tendrán en cuenta lo recogido en la Ficha U.17	Ficha U.17		

CONCLUSIONES

Por cada agrupación de cinco asiento una unidad debe ser accesible. Los asientos accesible deberán tener respaldo a ambos lados.

IMÁGENES

E5 5

PUERTAS DE PASO

PUERTO	MAÓ	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	07-ESTACIÓN MARÍTIMA CÓS NOU		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las puertas junto con las áreas de conexión horizontal, son los dos elementos que garantizan una circulación accesible entre diferentes espacios al mismo nivel.
Un diseño inadecuado de las puertas, de alguna de las partes que las conforman o de los huecos de paso puede impedir que todas las personas utilicen el edificio en condiciones de seguridad e igualdad.
En esta ficha estudiaremos las puertas de paso de la Estación Marítima Cós Nou

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
-	No se recomienda usar puertas de vaivén			
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			A presión
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura.			
-	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente.			
	Dimensiones			
NO	Espacio de aproximación	Ø ≥120 cm	Ø ≥120 cm	No se cumple en las puertas de acceso a los baños
-	Parte transparente o traslucida en puertas de vaivén	mín. de 70 cm a 150 cm		
-	Si pasillos A <250 cm puertas abatibles retranqueadas			
SÍ	Angulo en p abatibles	≥90°		
-	Espacio p. corredera hoja-marco	≥5 cm		
SÍ	Hueco admisible en carril	≤1,5 cm.No admite resalte	Sin carril o resalte	
NO	Altura libre	≥210 cm		Alturas entre 200 cm y 205 cm
SÍ	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja	≥80 cm	≥80 cm	
SÍ	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		Entre 103 cm y 105 cm
SÍ	D hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	40 cm	
SÍ	F apertura puerta	25 N .≤65 N resist fuego	≤25	
-	Señalización en puertas de vidrio. Franjas.	Altura1:120 cm Altura2:170cm		
	Acabados			Escalón en puerta de acceso a los mostradores
NO	Itinerario Ficha E.1			
NO	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8			
NO	Puertas de aseos adaptados Ficha E.24			
NO	Puerta contrastada en hoja o en marco			

CONCLUSIONES

Las puertas de paso cumplen con el ancho mínimo de 80 cm marcado por la normativa pero tiene una altura inferior a 210 cm. Para que las puertas fueran accesibles necesitarían tener una altura libre mínima de paso de 210 cm y contar con un espacio de aproximación previo y posterior horizontal sin invadir por el barrido de las puertas, libre de obstáculos de diámetro 120 cm. Las puertas de acceso a los aseos deberán contar con la señalización SIA normalizada en alto relieve y contraste cromático, a una altura de 160 cm, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

IMÁGENES

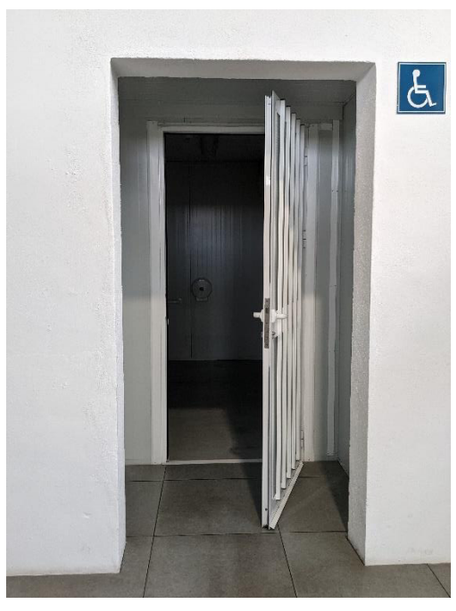

E8 6			
RAMPAS			
PUERTO	MAÓ	**ÁMBITO**	EDIFICACIÓN
ZONA	07-ESTACIÓN MARÍTIMA CÓS NOU		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En este apartado se estudia la configuración de la rampa de embarque de la Estación Marítima de Cós Nou.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Se considera rampa a partir del 4% de pendiente			
SÍ	Directriz recta y sin discontinuidades			
	Dimensiones			
-	P longitudinal máx L ≤ 3 m	10%		
NO	P longitudinal 3 <L ≤ 6 m	8%	9%	355 cm
-	P longitudinal 6 < L ≤ 9 m	6%		
SÍ	P transversal	≤1,50%		
NO	Anchura libre	≥180 cm	155 cm	
SÍ	Altura	<220 cm protegidos.		
SÍ	Tramo máximo	9 m		
-	mesetas intermedias: directriz recta	A rampa 180 y Profundidad ≥150 cm		No hay mesetas intermedias
NO	Si puerta en descansillo se aumenta el ancho igual al barrido de la puerta.			
SÍ	Al inicio y final de la rampa, espacio que no invada el itinerario peatonal accesible.	A = A rampa y Profundidad ≥150 cm		
NO	iluminación constante y sin reflejos	200 lux	Inferior	
	Acabados			
NO	Inicio y final franja de pavimento táctil contrastado de:	A=A rampa y Prof ≥100cm .Ficha U.9		No hay pavimento táctil
SÍ	Pavimento accesible	Clase 2. Ficha U.4		Clase 3, rampa exterior.
SÍ	Pasamanos, cuando las rampas salven desniveles superiores a 25 cm	Ficha E.9		Pasamanos en un solo lado
SÍ	Zócalo	si D >10 cm, Ficha E.9		
-	Barandillas	si D >55 cm. Ficha E.9		Desnivel inferior a 55 cm

CONCLUSIONES

Debería existir un segundo pasamanos en el paramento vertical. Los pasamanos se deberían prolongar 30 cm en los extremos. Se deberá asegurar una iluminación mínima de 200 lux.

IMÁGENES

E14 3

MOSTRADORES DE VENTA DE BILLETES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

PUERTO	MAÓ	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	07-ESTACIÓN MARÍTIMA CÓS NOU		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los espacios y equipamientos donde se produce la Atención al Cliente, deben estar diseñados para facilitar la labor a los trabajadores, así como permitir la máxima comodidad y prestaciones para los viajeros. En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en la Estación Marítima de Cós Nou.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Fácil localización desde el acceso			No hay señalización mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m
SÍ	Sin aristas vivas y sin elementos volados más de 15 cm por debajo de 220 cm o bien con proyección vertical	a -220 cm no + de 15cm de volado o proy.vertical		
NO	Mostrador de información dotado con bucle de inducción con señalización normalizada (almenos 1 taquilla)			sin bucle de inducción (sin señalización que lo indique)
-	Personal de atención al público con conocimientos para atender a personas con diferentes capacidades y básicos de lengua de signos.			
NO	Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos.			
	Dimensiones			
NO	Entre entrada y mostrador franja guía	A 40 cm		No existe franja guía
SÍ	Mostrador plano de trabajo	Anchura ≥100 cm	97 cm	
NO	Mostrador plano de trabajo altura:	h ≤85 cm	>85 cm	Accesible: 80 cm Resto:120 cm
NO	Mostrador, Espacio libre inferior	≥70 cm x 100 cm x 60 cm (h x a x p)		Espacio libre inferior cerrado en la zona de los usuarios.
NO	Iluminación	≥300 lux	<300lux	
	Acabados			
NO	Información relevante en diferentes soportes como visual, táctil y acústico, apoyándose en la tecnología y en varios idiomas	Bloque 5		

CONCLUSIONES

No existe ningún mostrador accesible ya que no presentan ningún espacio libre inferior abierto bajo el plano de trabajo que permita la aproximación a usuarios en silla de ruedas. Los mostradores deben estar comunicados con un itinerario accesible. Se deben señalizar desde el acceso mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m. Se debe dotar a los mostradores de bucle de inducción con su pertinente señalización normalizada. El personal de atención al público debe contar con conocimientos sobre cómo tratar con personas con diferentes capacidades y conocimientos básicos de lengua de signos. Se debe dotar a los mostradores de un espacio libre inferior de 70 cm de alturaa x100 cm de ancho y 60 cm de profundidad situado tanto la zona del trabajador como del usuario. Por último, se debe modificar la iluminación para que el nivel de iluminación en los puntos de atención al público sea de 300 lux.

IMÁGENES

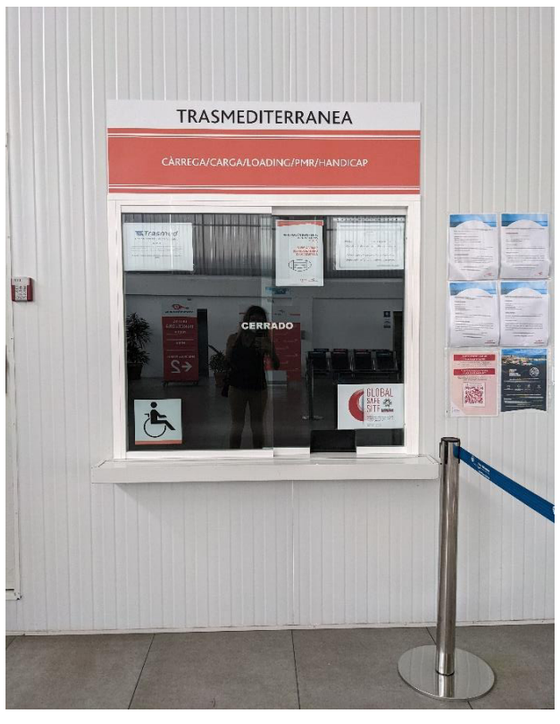

E17 5

ASIENTO

PUERTO	MAÓ	**ÁMBITO**	EDIFICACIÓN
ZONA	07-ESTACIÓN MARÍTIMA CÓS NOU		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En circunstancias dónde los tiempos de espera aumentan considerablemente y las instalaciones deben dar respuesta a las necesidades de descanso de los usuarios. Los asientos deben garantizar comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas. En este apartado se estudiarán los asientos de la Corporación de Prácticos de Maó.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
	Número total en función de la concurrencia del espacio			
NO	Número. Al menos uno de ellos por cada agrupación será accesible, y al menos uno de cada cinco asientos o fracción.			
SÍ	Zona de asientos comunicado con el itinerario accesible sin invadirlo			
SÍ	Se permitirá la estancia de perros guía debajo de lo asientos	Ficha U.17		
NO	Con reposabrazos, respaldo y espacio libre inferior, bajo el asiento	Ficha U.17		Ningún asiento con reposabrazos
	Dimensiones			
-	En las salas de proyección, salones de actos, o similares se reservarán 2 plazas para sillas de ruedas por cada 100 o fracción	2 de 100		
-	Las plazas de sillas de ruedas estarán conectadas a los accesos por un itinerario accesible	ancho ≥1,50 m		
-	Medidas plazas silla de ruedas	90 cm x 120 cm (ancho x profundidad)		
-	zonas para personas con discapacidad visual y/o auditiva, en la zona delantera, próximas a los sistemas de sonido y sistemas de inducción.	Ficha C.3		
SÍ	Altura del plano del asiento:	40 cm - 45 cm.	45 cm	
NO	Profundidad del plano de asiento:	40 cm - 45 cm.	45 cm	
NO	Altura de apoyabrazos respecto al plano del asiento:	18 cm - 24 cm.		No hay apoyabrazos
SÍ	Altura del plano de respaldo medidos desde el suelo:	≥80 cm.	90 cm	
SÍ	Angulo máximo entre respaldo-vertical:	15°	Cumple	
SÍ	En su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos que no invadirá el itinerario peatonal accesible	≥60 cm.	≥60 cm.	
SÍ	Área libre anexa al menos a un lado.	Ø ≥150 cm	Ø ≥150 cm	
	Acabados			
SÍ	Tendrán en cuenta lo recogido en la Ficha U.17	Ficha U.17		

CONCLUSIONES

Por cada agrupación de cinco asiento una unidad debe ser accesible. Los asientos accesible deberán tener respaldo a ambos lados.

IMÁGENES

4. PUERTO DE EIVISSA

E2 1			
PUERTAS DE ACCESO			
PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

El acceso a la edificación es el punto de conexión entre el espacio exterior y edificado. En esta ficha se trata de especificar la identificación y localización de la puerta deacceso al edificio de oficinas de la APB.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Mínimo un acceso accesible en cada edificios, a ser posible a coincidir con el acceso principal.			2 escalón en acceso de H 32 cm y CH de 19 cm sin alternativa accesible.
-	Si hay accesos no accesibles, el recorrido hasta el acceso accesible más próximo deberá estar señalizado según las condiciones del Bloque 5			No hay
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			automático
SÍ	Puertas abatibles o correderas. No admisibles giratorias. No recomendadas puertas batientes automáticas.			Puertas correderas
-	Puertas batientes situadas en acceso a ser posible con barra de accionamiento horizontal en ambas caras.y resorte o dispositivo de cierre automático.			Sin barra de accionamiento horizontal
SÍ	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente sobre máquinas.(Directiva 98/37/CE)			
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura			Sin zócalo de seguridad
	Dimensionado			
SÍ	Discontinuidades umbral ≤2 cm, achaflanadas a 45°.			No hay discontinuidades
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm		Escalones en acceso
SÍ	Altura libre	≥210 cm	210 cm	
NO	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja. Recomendable 90 cm	≥80 cm	68 cm	
-	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		Puerta automática
-	Altura barra de accionamiento puertas baitentes	80 cm ± 5 cm,		No hay
-	D mecnaismo apertura hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	≥40 cm	
SÍ	F apertura puerta salida ≤25 N (≤65 N cuando sean resistentes al fuego)			
NO	Señalización en puertas de vidrio, franjas	Altura1: 120 cm Altura2: 170 cm		No hay señalización por franjas
	Acabados			
NO	Itinerario Ficha E.1	E.1		
NO	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8	C7-C8		
SÍ	Banda diferenciada cromáticamente en el contorno hueco			
-	Puertas de vidrio y fachadas de vidrio diferenciadas entre sí			

CONCLUSIONES

Se debería asegurar que al menos una de sus hojas tenga un ancho de paso mínimo de 80 cm. Se deberá proporcionar un espacio horizontal por el interior del edificio contiguo a las puertas correderas libre de obstáculos de 150 cm

IMÁGENES

E2 2			
PUERTAS DE ACCESO			
PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	CAPITANÍA MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

El acceso a la edificación es el punto de conexión entre el espacio exterior y edificado. En esta ficha se trata de especificar la identificación y localización de la puerta de acceso a Capitanía Marítima.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Mínimo un acceso accesible en cada edificios, a ser posible a coincidir con el acceso principal.			No existe un espacio horizontal de 150 cm de diámetro anterio y posterior al acceso.
-	Si hay accesos no accesibles, el recorrido hasta el acceso accesible más próximo deberá estar señalizado según las condiciones del Bloque 5			No hay
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.		a 106 cm	Maneta por el interior
SÍ	Puertas abatibles o correderas. No admisibles giratorias. No recomendadas puertas batientes automáticas.			Puerta abatible
-	Puertas batientes situadas en acceso a ser posible con barra de accionamiento horizontal en ambas caras.y resorte o dispositivo de cierre automático.			Sin barra de accionamiento horizontal
-	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente sobre máquinas.(Directiva 98/37/CE)			
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura			Sin zócalo de seguridad
	Dimensionado			
SÍ	Discontinuidades umbral ≤2 cm, achaflanadas a 45°.			No hay discontinuidades
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm		rampa en acceso
SÍ	Altura libre	≥210 cm	218 cm	
NO	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja. Recomendable 90 cm	≥80 cm	88 cm	
-	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		Puerta automática
-	Altura barra de accionamiento puertas baitentes	80 cm ± 5 cm,		No hay
-	D mecnaismo apertura hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	≥40 cm	
SÍ	F apertura puerta salida ≤25 N (≤65 N cuando sean resistentes al fuego)			
NO	Señalización en puertas de vidrio, franjas	Altura1: 120 cm Altura2: 170 cm		No hay señalización por franjas
	Acabados			
NO	Itinerario Ficha E.1	E.1		
NO	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8	C7-C8		
NO	Banda diferenciada cromáticamente en el contorno hueco			
-	Puertas de vidrio y fachadas de vidrio diferenciadas entre sí			

CONCLUSIONES

se plantea utilizar el acceso de las oficinas de la APB, al que habremos colocado una plataforma salvaescaleras, para acceder a las dependencias de capitanía marítima. Existe una puerta de paso que conecta ambos espacios que se encuentra permanentemente cerrada, deberá permanecer abierta para conectar los espacios.

IMÁGENES

E5 1			
PUERTAS DE PASO			
PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las puertas junto con las áreas de conexión horizontal, son los dos elementos que garantizan una circulación accesible entre diferentes espacios al mismo nivel.
Un diseño inadecuado de las puertas, de alguna de las partes que las conforman o de los huecos de paso puede impedir que todas las personas utilicen el edificio en condiciones de seguridad e igualdad.
En esta ficha estudiaremos la puerta de paso a la zona privada del mostrador de atención de las oficinas de la APB

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
-	No se recomienda usar puertas de vaivén			
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			a presión
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura.			Sin zócalo de seguridad
-	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente.			
	Dimensiones			
NO	Espacio de aproximación	Ø ≥120 cm	Ø ≥120 cm	Espacio interior invadido por el barrido de la puerta
-	Parte transparente o traslucida en puertas de vaivén	mín. de 70 cm a 150 cm		
-	Si pasillos A <250 cm puertas abatibles retranqueadas			
SÍ	Ángulo en p abatibles	≥90°		
-	Espacio p. corredera hoja-marco	≥5 cm		
SÍ	Hueco admisible en carril	≤1,5 cm.No admite resalte	Sin carril o resalte	
SÍ	Altura libre	≥210 cm	200 cm	
NO	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja	≥80 cm	72 cm	
SÍ	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		
SÍ	D hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	40 cm	
SÍ	F apertura puerta	25 N .≤65 N resist fuego	≤25	
NO	Señalización en puertas de vidrio. Franjas.	Altura1:120 cm Altura2:170cm		Sin señalización por franjas
	Acabados			
NO	Itinerario Ficha E.1			
-	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8			
-	Puertas de aseos adaptados Ficha E.24			
SÍ	Puerta contrastada en hoja o en marco			

CONCLUSIONES

Se colocará un zócalo inferior de protección de 40 cm de altura.

IMÁGENES

E5 2

PUERTAS DE PASO

PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las puertas junto con las áreas de conexión horizontal, son los dos elementos que garantizan una circulación accesible entre diferentes espacios al mismo nivel.
Un diseño inadecuado de las puertas, de alguna de las partes que las conforman o de los huecos de paso puede impedir que todas las personas utilicen el edificio en condiciones de seguridad e igualdad.
En esta ficha estudiaremos la puerta de paso a la zona privada del mostrador de atención de las oficinas de la APB

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
-	No se recomienda usar puertas de vaivén			
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			automático
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura.			Sin zócalo de seguridad
SÍ	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente.			
	Dimensiones			
NO	Espacio de aproximación	Ø ≥120 cm	Ø ≥120 cm	invadido por la rampa
-	Parte transparente o traslucida en puertas de vaivén	mín. de 70 cm a 150 cm		
-	Si pasillos A <250 cm puertas abatibles retranqueadas			
-	Ángulo en p abatibles	≥90°		
-	Espacio p. corredera hoja-marco	≥5 cm		
SÍ	Hueco admisible en carril	≤1,5 cm.No admite resalte	Sin carril o resalte	
SÍ	Altura libre	≥210 cm	210 cm	
NO	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja	≥80 cm	72 cm	
-	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		puerta corredera automática
-	D hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	40 cm	
SÍ	F apertura puerta	25 N .≤65 N resist fuego	≤25	
NO	Señalización en puertas de vidrio. Franjas.	Altura1:120 cm Altura2:170cm		Sin señalización por franjas
	Acabados			
NO	Itinerario Ficha E.1			
-	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8			
-	Puertas de aseos adaptados Ficha E.24			
SÍ	Puerta contrastada en hoja o en marco			

CONCLUSIONES

Se colocará un zócalo inferior de protección de 40 cm de altura.

IMÁGENES

E5 3

PUERTAS DE PASO

PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las puertas junto con las áreas de conexión horizontal, son los dos elementos que garantizan una circulación accesible entre diferentes espacios al mismo nivel.
Un diseño inadecuado de las puertas, de alguna de las partes que las conforman o de los huecos de paso puede impedir que todas las personas utilicen el edificio en condiciones de seguridad e igualdad.
En esta ficha estudiaremos la puerta de paso a la zona privada de las oficinas de la policía.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
-	No se recomienda usar puertas de vaivén			
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			automático
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura.			Sin zócalo de seguridad
SÍ	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente.			
	Dimensiones			
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥120 cm	Ø ≥120 cm	
-	Parte transparente o traslucida en puertas de vaivén	mín. de 70 cm a 150 cm		
-	Si pasillos A <250 cm puertas abatibles retranqueadas			
-	Ángulo en p abatibles	≥90°		
-	Espacio p. corredera hoja-marco	≥5 cm		
SÍ	Hueco admisible en carril	≤1,5 cm.No admite resalte	Sin carril o resalte	
SÍ	Altura libre	≥210 cm	240 cm	
NO	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja	≥80 cm	90 cm	
-	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		puerta corredera automática
-	D hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	40 cm	
SÍ	F apertura puerta	25 N .≤65 N resist fuego	≤25	
NO	Señalización en puertas de vidrio. Franjas.	Altura1:120 cm Altura2:170cm		Sin señalización por franjas
	Acabados			
NO	Itinerario Ficha E.1			
-	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8			
-	Puertas de aseos adaptados Ficha E.24			
SÍ	Puerta contrastada en hoja o en marco			

CONCLUSIONES

Se colocará un zócalo inferior de protección de 40 cm de altura. Y se colocará señalización con dos franjas visualmente contrastada en toda la longitud de la puerta de acceso a la zona privada situadas a 120 cm y 170 cm.

IMÁGENES

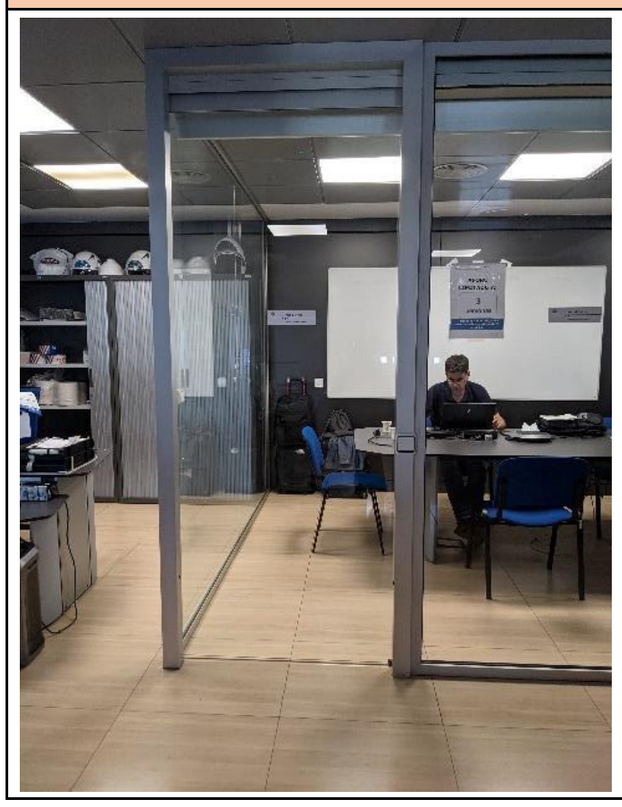

E7 1			
ESCALERAS FIJAS INTERIORES			
PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se analizan las escaleras fijas de uso habitual existentes en el edificio de las oficinas de la APB

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Con alternativa Accesible próxima y señalizada	Rampas Ficha E.8 Ascensores Ficha E.10		ascensores sin señalizr
SÍ	Directriz recta o ligeramente curva		Directriz recta	
NO	Contrahuella obligatoria. No admisible: solapes ni bocel. Escalones dimensiones iguales.			existe bocel
	Dimensiones			
SÍ	Tramos	Mín 3 esc. Máx 10 esc		
SÍ	Anchura	≥120 cm	163 cm	
SÍ	Altura espacio inferior escalera	<220 cm protegidos		cerrada
SÍ	Relación, proporciones.	54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm	67 cm	
SÍ	Huella	30 cm ≤ H ≤ 36 cm	30cm	
NO	Contrahuella o tabica	13 cm ≤ C ≤ 16 cm	19 cm	
NO	Ángulo entre H y C	90°		Bocel saliente
SÍ	Rellanos: A =A de escalera y Profundidad ≥A de escalera.	120 cm en recto recomendable 150 cm cambios dirección	170x179 cm	
NO	Inicio y final de la escalera, espacio de A =A escalera y Profundidad	≥150 cm		Invadido por el itinerario peatonal
	Acabados			
NO	Señalización en el ancho del escalón, tira antideslizante contrastada (textura y color)	de 5 cm a 3 cm del borde		existe señalización pero no cumple las medidas normativas
NO	En Inicio y final situar franja de pavimento táctil de acanaladura contrastado			No hay franja de pavimento táctil
-	Altura pavimento táctil	3 mm ± 1 mm		
-	anchura líneas de franja	≥25 mm y < 30 mm		
-	separación entre ejes de franjas	≥60 mm y < 65 mm		
-	A franja de pavimento táctil=A escalera y Profundidad ≥120 cm	Ficha U.9		
SÍ	Escalera: Pavimento accesible	clase 2. Ficha E.4		
NO	Pasamanos y barreras de protección accesibles	Ficha E.9	h barandilla 117 cm	Pasamano discontinuo en un solo lado

CONCLUSIONES

Modificar la escalera existente para que cumpla todos los parámetros de accesibilidad normativos lleva consigo una gran dificultad técnica y económica. Se plantea realizar el mayor número de mejoras posibles sin substituir la escalera existente.
Se situarán pasamanos dobles en ambos lados de la escalera, estos serán continuos en todo su recorrido, incluidas las mesetas. Tendrán una configuración accesible siguiendo los parámetros explicados en el apartado Pasamanos y barandillas.
En cuanto a la señalización, cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura encastrada y enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. Estas tiras permiten por un lado localizar visualmente el borde del escalón y por otro sirven de elemento de freno al pie durante el desplazamiento, mejorando la adherencia. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil de ancho igual a la escalera con la acanaladura en dirección perpendicular a la marcha, de 3 mm ± 1 mm de altura y anchura de entre 25 mm y 30 mm, la separación entre ejes de las franjas será de 60 – 65 mm, así se permite a las personas detectar claramente la presencia de la escalera y el comienzo y el final del cambio de nivel, aumentando su orientación y seguridad.
Toda la escalera tendrá un nivel de iluminación constante y sin reflejos de al menos 200 lux medidos en el suelo.

IMÁGENES

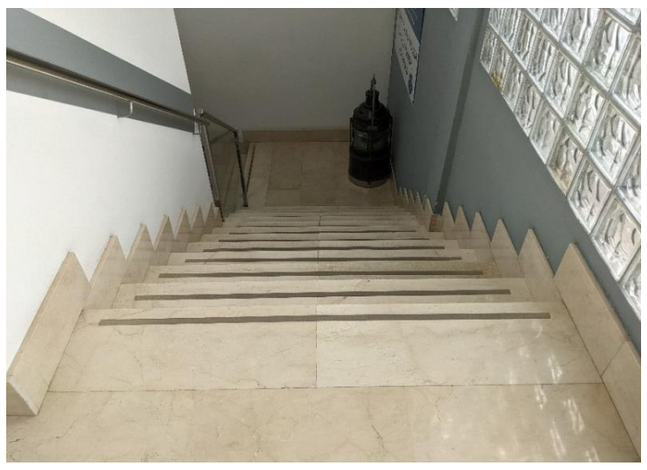

E7 2			
ESCALERAS FIJAS INTERIORES			
PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se analizan las escaleras fijas de uso habitual existentes en el edificio de las oficinas de la APB que unen la planta baja con las oficinas de capitanía marítima.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Con alternativa Accesible próxima y señalizada	Rampas Ficha E.8 Ascensores Ficha E.10		
SÍ	Directriz recta o ligeramente curva			
NO	Contrahuella obligatoria. No admisible: solapes ni bocel. Escalones dimensiones iguales.			existe bocel
	Dimensiones			
SÍ	Tramos	Mín 3 esc. Máx 10 esc		
NO	Anchura	≥120 cm	110	
NO	Altura espacio inferior escalera	<220 cm protegidos		
SÍ	Relación, proporciones.	54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm		
SÍ	Huella	30 cm ≤ H ≤ 36 cm	30cm	
NO	Contrahuella o tabica	13 cm ≤ C ≤ 16 cm	18,5 cm	
NO	Ángulo entre H y C	90°		Bocel saliente
NO	Rellanos: A =A de escalera y Profundidad ≥A de escalera.	120 cm en recto recomendable 150 cm cambios dirección		
NO	Inicio y final de la escalera, espacio de A =A escalera y Profundidad	≥150 cm		Invadido por barrido puerta
	Acabados			
NO	Señalización en el ancho del escalón, tira antideslizante contrastada (textura y color)	de 5 cm a 3 cm del borde		
NO	En Inicio y final situar franja de pavimento táctil de acanaladura contrastado			No hay franja de pavimento táctil
-	Altura pavimento táctil	3 mm ± 1 mm		
-	anchura líneas de franja	≥25 mm y < 30 mm		
-	separación entre ejes de franjas	≥60 mm y < 65 mm		
-	A franja de pavimento táctil=A escalera y Profundidad ≥120 cm	Ficha U.9		
SÍ	Escalera: Pavimento accesible	clase 2. Ficha E.4		
NO	Pasamanos y barreras de protección accesibles	Ficha E.9		Barandilla escalable

CONCLUSIONES

Se situarán pasamanos dobles a ambos lados de la escalera, continuos en todo su recorrido, incluidas las mesetas.
En cuanto a la señalización, cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura encastrada y enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil de ancho igual a la escalera que permite a las personas detectar claramente la presencia de la escalera y el comienzo y el final del cambio de nivel, aumentando su orientación y seguridad. La zona bajo escalera con una altura de 220 cm de altura estará cerrada, o protegida con algún elemento de mobiliario, decoración o jardinería, para evitar golpes.
Toda la escalera tendrá un nivel de iluminación constante y sin reflejos de al menos 200 lux medidos en el suelo.
En caso de colocar un ascensor en el edificio se debería colocar pasamanos a ambos las de la escalera.

IMÁGENES

E9 1			
PASAMANOS Y BARANDILLAS			
PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las barandillas, los pasamanos y los zócalos son elementos de apoyo y protección para las personas. Sirven para proteger los cambios de nivel y mejorar la deambulación en los itinerarios verticales. En esta ficha estudiaremos la barandilla situado en el edifico de oficinas de la APB.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Pasamanos continúo a ambos lados a doble altura.			Pasamanos en un solo lado a una altura.
-	Pasamanos prolongados en los embarques en 30 cm.	30 cm		Sin prolongar
NO	Pasamanos rematados de forma curva o hacia abajo.			
SÍ	En los lados abiertos de escaleras y rampas, colocar barandillas para evitar caídas junto a desniveles con diferencia de cota ≥55 cm.	≠ de cota ≥55 cm		
NO	Todos los elementos son continuos, estables y sin cantos vivos			Pasamanos no es continuo debido a los elementos de sujeción con la barandilla.
SÍ	Dimensiones			
-	Altura zócalos rampas	≥10 cm		
SÍ	Sección pasamanos	3,5 - 5 cm	4 cm	
NO	Separación pasamanos al paramento	5 cm	3,5 cm	
-	Si separación >5 cm, debe aumentarse el ancho de la escalera o rampa.			
NO	Pasamanos dobles	H1 =90 cm - 95 cm. H2 =70 cm - 75 m.		
-	rampa o escalera fija con pasamanos doble central	ancho ≥4 m		
SÍ	Altura Barandillas-barreras de protección	≥90 cm desniveles ≤6 m__ ≥110 cm desnivel >6 m	100 cm	
SÍ	Barandillas no escalables:	no admisible apoyo entre 20- 70 cm de altura		
-	Aberturas en barandillas	≤10 cm		
SÍ	Barandillas deben soporta una fuerza concentrada en la posición más desfavorable	≥1,5 kN	≥1,5 kN	
SÍ	Color contrastado en pasamanos y zócalos			
SÍ	Control de la inercia térmica de los materiales ext			

CONCLUSIONES

Disponer de pasamanos a ambos lados a prolongados en los embarques en 30 cm para guiar el recorrido y servir como elemento de apoyo y agarre durante la circulación. Los pasamanos deberán quedar rematados de forma curva o hacia abajo de modo que se eviten colisiones o enganches en los extremos.Se deberá unificar la barandilla y el pasamanos existente creando un único pasamanos continuo de modo que el recorrido de la mano no se vea interrumpido en todo su recorrido.

IMÁGENES

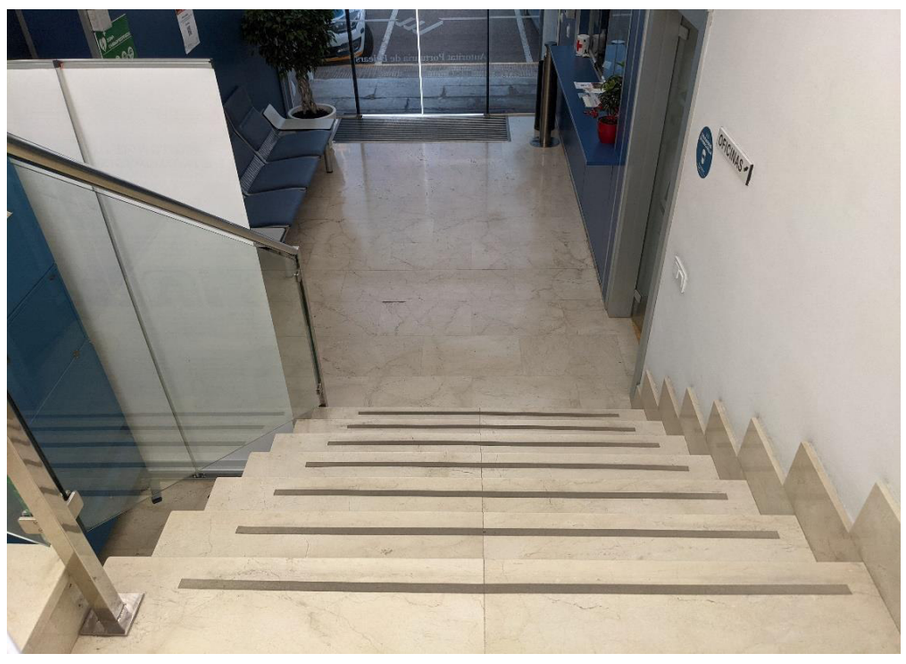

E9 2

PASAMANOS Y BARANDILLAS

PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las barandillas, los pasamanos y los zócalos son elementos de apoyo y protección para las personas. Sirven para proteger los cambios de nivel y mejorar la deambulación en los itinerarios verticales. En esta ficha estudiaremos la barandilla situado en el edifico de oficinas de la APB, en la escalera de conexión con los espacios reservados a capitanía marítima situada en la segunda planta.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Pasamanos continúo a ambos lados a doble altura.			Pasamanos en un solo lado a una altura.
-	Pasamanos prolongados en los embarques en 30 cm.	30 cm		Sin prolongar
NO	Pasamanos rematados de forma curva o hacia abajo.			
SÍ	En los lados abiertos de escaleras y rampas, colocar barandillas para evitar caídas junto a desniveles con diferencia de cota ≥55 cm.	≠ de cota ≥55 cm		
NO	Todos los elementos son continuos, estables y sin cantos vivos			Pasamanos no continuo
SÍ	Dimensiones			
-	Altura zócalos rampas	≥10 cm		
NO	Sección pasamanos	3,5 - 5 cm		
NO	Separación pasamanos al paramento	5 cm		
-	Si separación >5 cm, debe aumentarse el ancho de la escalera o rampa.			
NO	Pasamanos dobles	H1 =90 cm - 95 cm. H2 =70 cm - 75 m.		
-	rampa o escalera fija con pasamanos doble central	ancho ≥4 m		
SÍ	Altura Barandillas-barreras de protección	≥90 cm desniveles ≤6 m__ ≥110 cm desnivel >6 m	100 cm	
NO	Barandillas no escalables:	no admisible apoyo entre 20- 70 cm de altura		
-	Aberturas en barandillas	≤10 cm		
SÍ	Barandillas deben soporta una fuerza concentrada en la posición más desfavorable	≥1,5 kN	≥1,5 kN	
NO	Color contrastado en pasamanos y zócalos			
SÍ	Control de la inercia térmica de los materiales ext			

CONCLUSIONES

Se propone substituir la barandilla existente y colocar una barandilla continua que no impida el paso de la mano en todo el recorrido.
La barandilla tendrá un diseño no escalable por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 20 cm y 70 cm de altura. Las aberturas y espacios libres entre elementos (barrotes, parapetos…) no deben superarán los 10 cm. Se asegurará que la barandilla sea estable, rígida y esté fuertemente fijada y sea capaz de soportar, como mínimo, una fuerza de 1,5 kN concentrada en la posición más desfavorable sin doblarse ni desprenderse.
Se colocarán pasamanos a ambos lados de la escalera. Los pasamanos se colocarán a doble altura, a una altura de 90-95 cm para el pasamanos superior y de 70-75 cm para el inferior y estarán prolongados en los extremos 30 cm. Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 3,5 cm y 5 cm de diámetro sin cantos vivos. Estarán separados del paramento vertical al menos 5 cm, su sistema de sujeción será firme y no interferirá en el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. Deberán quedar rematados de forma curva o hacia abajo de modo que se eviten colisiones o enganches en los extremos. El color de los pasamanos deberá contrastar con el paramento y entorno en el que se instalen.

IMÁGENES

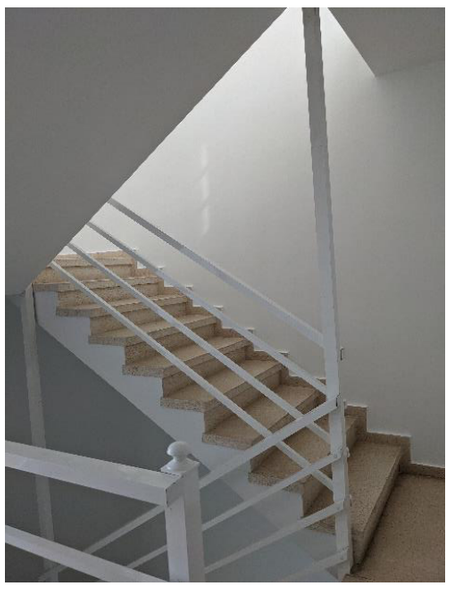

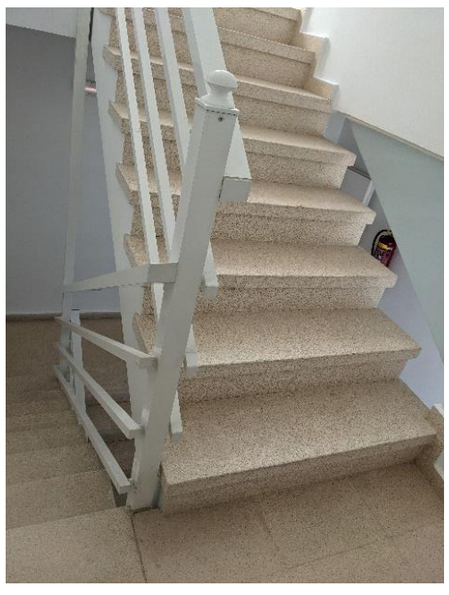

E14 1

MOSTRADORES DE VENTA DE BILLETES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los espacios y equipamientos donde se produce la Atención al Cliente, deben estar diseñados para facilitar la labor a los trabajadores, así como permitir la máxima comodidad y prestaciones para los viajeros. En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en la oficinas de la APB

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Fácil localización desde el acceso			no hay señalización mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m
SÍ	Sin aristas vivas y sin elementos volados más de 15 cm por debajo de 220 cm o bien con proyección vertical	a -220 cm no + de 15cm de volado o proy.vertical		Plano trabajo en la zona del usuario volado
NO	Mostrador de información dotado con bucle de inducción con señalización normalizada (almenos 1 taquilla)			sin bucle de inducción (sin señalización que lo indique)
NO	Personal de atención al público con conocimientos para atender a personas con diferentes capacidades y básicos de lengua de signos.			
NO	Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos.			No se dispone de sistema de comunicación de lengua de signos
	Dimensiones			
NO	Entre entrada y mostrador franja guía	A 40 cm		No existe franja guía
SÍ	Mostrador plano de trabajo	Anchura ≥100 cm	Anchura ≥100 cm	
NO	Mostrador plano de trabajo altura:	h ≤85 cm	usuarios: 97 cm trabajadores: 82 cm	
NO	Mostrador, Espacio libre inferior	≥70 cm x 100 cm x 60 cm (h x a x p)		Espacio inferior cerrado en el espacio reservado al usuario
NO	Iluminación	≥300 lux		
	Acabados			
NO	Información relevante en diferentes soportes como visual, táctil y acústico, apoyándose en la tecnología y en varios idiomas	Bloque 5		

CONCLUSIONES

Las oficinas deberán contar con una unidad de mostrador accesible. Deberá ser de fácil localización desde el acceso, para ello el itinerario accesible hasta él se señalizará mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m. El mobiliario no interferirá con las zonas de circulación de paso y maniobra que contará con un espacio libre de al menos 150 cm.
El mostrador de información estará dotado con bucle de inducción con su señalización normalizada. El personal de atención al público contará con conocimientos sobre cómo tratar con personas con diferentes capacidades y conocimientos básicos de lengua de signos. Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos, a través de un intérprete presencial o con video interpretación a distancia para facilitar la información a personas sordas.
El nivel de iluminación en los puntos de atención al público será de 300 lux.

IMÁGENES

E17 1

ASIENTO

PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En circunstancias dónde los tiempos de espera aumentan considerablemente y las instalaciones deben dar respuesta a las necesidades de descanso de los usuarios. Los asientos deben garantizar comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
	Número total en función de la concurrencia del espacio			
NO	Número. Al menos uno de ellos por cada agrupación será accesible, y al menos uno de cada cinco asientos o fracción.			
NO	Zona de asientos comunicado con el itinerario accesible sin invadirlo			
SÍ	Se permitirá la estancia de perros guía debajo de lo asientos	Ficha U.17		
NO	Con reposabrazos, respaldo y espacio libre inferior, bajo el asiento	Ficha U.17		sin reposabrazos
	Dimensiones			
-	En las salas de proyección, salones de actos, o similares se reservarán 2 plazas para sillas de ruedas por cada 100 o fracción	2 de 100		
-	Las plazas de sillas de ruedas estarán conectadas a los accesos por un itinerario accesible	ancho ≥1,50 m		No hay plazas para sillas de ruedas
-	Medidas plazas silla de ruedas	90 cm x 120 cm (ancho x profundidad)		
-	zonas para personas con discapacidad visual y/o auditiva, en la zona delantera, próximas a los sistemas de sonido y sistemas de inducción.	Ficha C.3		No hay sistemas de sonido e inducción
SÍ	Altura del plano del asiento:	40 cm - 45 cm.	43 cm	
NO	Profundidad del plano de asiento:	40 cm - 45 cm.	47 cm	
-	Altura de apoyabrazos respecto al plano del asiento:	18 cm - 24 cm.	18 cm - 24 cm.	
SÍ	Altura del plano de respaldo medidos desde el suelo:	≥80 cm.	87 cm	
SÍ	Angulo máximo entre respaldo-vertical:	15°	Cumple	
NO	En su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos que no invadirá el itinerario peatonal accesible	≥60 cm.	≥60 cm.	
NO	Área libre anexa al menos a un lado.	Ø ≥150 cm	Ocupada por mobiliario	
	Acabados			
NO	Tendrán en cuenta lo recogido en la Ficha U.17	Ficha U.17		

CONCLUSIONES

Por cada agrupación de cinco asiento una unidad debe ser accesible. Para cumplir con la condición de asiento accesible deberán tener respaldo a ambos lados hecho que no se cumple en el diseño de estos asientos por lo que se debe incorporar. Al menos, a un lado de la zona de asientos se dispondrá de un área libre de obstáculos donde se inscriba una circunferencia de Ø ≥150 cm hecho que permite que puedan ubicarse junto a los asientos los carritos de los bebés o personas que utilicen silla de ruedas.

IMÁGENES

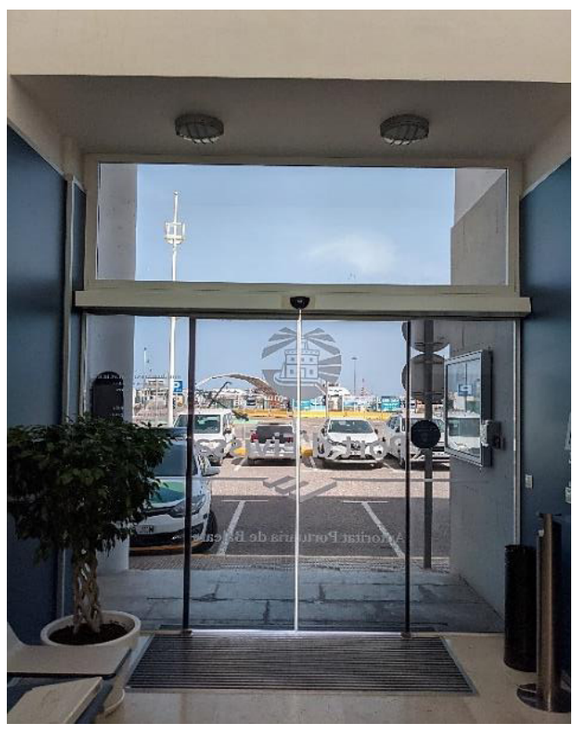

E6 2			
PASILLOS Y ÁREAS DE CONEXIÓN			
PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	ESTACIÓN MARÍTIMA DE IBIZA-FORMENTERA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

En esta ficha se estudian los pasillos, pasarelas y áreas de conexión existentes entre los diferentes ámbitos del edificio de la estación marítima de Ibiza- Formentera

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Entre áreas al menos un pasillo accesible que las conecte			Espacio de entrada invadido por el espacio de los mostradores y la formación de colas
-	En pasillos no accesibles, el accesible más próximo deberá estar señalizado			
	Dimensiones			
SÍ	Anchura libre	Ø ≥120 cm		
-	Estrechamientos admisibles	A ≥100 cm a lo largo de 50 cm		
-	Si se prevé cruce de dos personas usuarias de silla de ruedas	A ≥180 cm		
-	Cambios de dirección, cada 10,00 m máximo	Ø =150 cm		
SÍ	Altura	≥220 cm		
NO	Elementos volados altura <220 cm deben contar con en su proyección vertical de elementos de altura ≥25 cm medidos desde el suelo.	elemento perimetral de A ≥25 cm		los mostradores de venta de billetes están conformados por pequeños elementos volados
-	Iluminación	≥100 lux		
SÍ	Se recomienda que la frecuencia de las luces intermitentes sea inferior a 5 Hz	5 Hz		
	Acabados			
SÍ	Pavimento accesible	Ficha E.4		
NO	Señalización	Bloque 5		Sin señalización
-	La señalización tendrá el tamaño adecuado en funciónde la distancia	Ficha C.7		

CONCLUSIONES

Al realizar el cambio en la situación del acceso y resituar la puerta de paso a la cabina de aseos accesibles conseguiremos crear pasillos accesibles que conecten las distintas áreas de ancho libre de paso de 120 cm y en los cambios de dirección podremos inscribir un cilindro de 150 cm de diámetro. Existirá señalización que indique los espacios accesibles. La iluminación general será de al menos 100 lux. Por último, se recomienda que la frecuencia de las luces intermitentes sea inferior a 5 Hz.

IMÁGENES

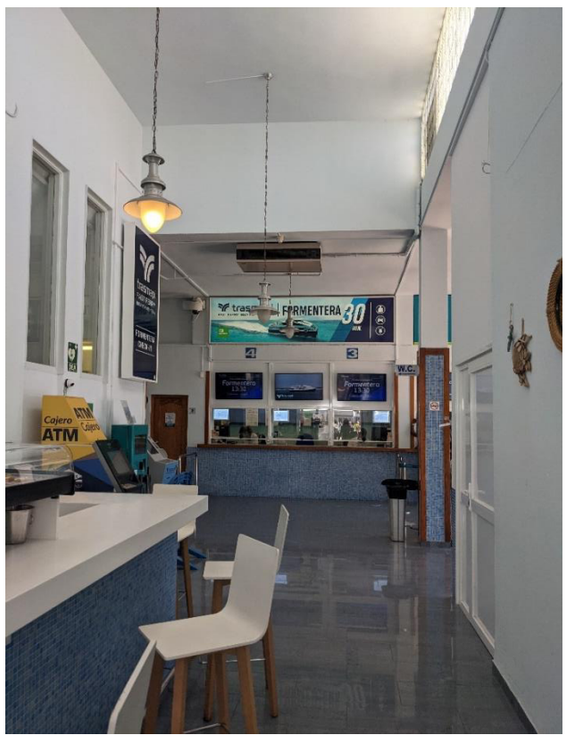

E14 2

MOSTRADORES DE VENTA DE BILLETES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO

PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	TERMINAL MARÍTIMA IBIZA-FORMENTERA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los espacios y equipamientos donde se produce la Atención al Cliente, deben estar diseñados para facilitar la labor a los trabajadores, así como permitir la máxima comodidad y prestaciones para los viajeros. En esta ficha se estudian los mostradores de información presentes en la terminal marítima de Ibiza-Formentera.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Fácil localización desde el acceso			Desde el acceso no hay franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m
NO	Sin aristas vivas y sin elementos volados más de 15 cm por debajo de 220 cm o bien con proyección vertical	a -220 cm no + de 15cm de volado o proy.vertical		Plano trabajo en la zona del usuario volado
NO	Mostrador de información dotado con bucle de inducción con señalización normalizada (almenos 1 taquilla)			Sin sistema dotado con bucle de inducción
NO	Personal de atención al público con conocimientos para atender a personas con diferentes capacidades y básicos de lengua de signos.			
NO	Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos.			
	Dimensiones			
NO	Entre entrada y mostrador franja guía	A 40 cm		No existe franja guía
NO	Mostrador plano de trabajo	Anchura ≥100 cm	Anchura ≥100 cm	
SÍ	Mostrador plano de trabajo altura:	h ≤85 cm	75 cm	
NO	Mostrador, Espacio libre inferior	≥70 cm x 100 cm x 60 cm (h x a x p)	73 cm x 145 cm x 78 cm	Espacio libre inferior situado solamente en el lado del trabajador
NO	Iluminación	≥300 lux		
	Acabados			
NO	Información relevante en diferentes soportes como visual, táctil y acústico, apoyándose en la tecnología y en varios idiomas	Bloque 5		

CONCLUSIONES

Los mostradores se deben señalizar desde el acceso mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m. Se debe dotar a los mostradores de información con bucle de inducción y con su pertinente señalización normalizada. El personal de atención al público debe contar con conocimientos sobre cómo tratar con personas con diferentes capacidades y conocimientos básicos de lengua de signos. Se deben dotar a los mostradores de un espacio libre inferior de 70 cm de altrua x100 cm de ancho y 60 cm de profundidad situado tanto el la zona del trabajador como del usuario. Por último se debe modificar la iluminación para que el nivel de iluminación en los puntos de atención al público sea de 300 lux.

IMÁGENES

E9 3			
PASAMANOS Y BARANDILLAS			
PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	11-EDIFICIO DEL MARTILLO		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las barandillas los pasamanos y los zócalos son elementos de apoyo y protección para las personas. Sirven para proteger los cambios de nivel y mejorar la deambulación en los itinerarios verticales. En esta ficha estudiaremos la barandilla situada en el edificio-mirador "el martillo", se trata de un espacio abierto.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Pasamanos continúo a ambos lados a doble altura.			Una sola altura
NO	Pasamanos prolongados en los embarques en 30 cm.	30 cm		No prolongado en sentido de subida.
NO	Pasamanos rematados de forma curva o hacia abajo.			
SÍ	En los lados abiertos de escaleras y rampas, colocar barandillas para evitar caídas junto a desniveles con diferencia de cota ≥55 cm.	≠ de cota ≥55 cm		
NO	Todos los elementos son continuos, estables y sin cantos vivos			Pasamanos con cantos vivos en los extemos
SÍ	Dimensiones			
-	Altura zócalos rampas	≥10 cm		No hay rampa
SÍ	Sección pasamanos	3,5 - 5 cm	3,5 - 5 cm	
SÍ	Separación pasamanos al paramento	5 cm		Pasamanos independiente de la barandilla
-	Si separación >5 cm, debe aumentarse el ancho de la escalera o rampa.			
NO	Pasamanos dobles	H1 =90 cm - 95 cm. H2 =70 cm - 75 m.		No hay pasamanos dobles
NO	rampa o escalera fija con pasamanos doble central	ancho ≥4 m		Barandilla en los extremos del edificio.
SÍ	Altura Barandillas-barreras de protección	≥90 cm desniveles ≤6 m__ ≥110 cm desnivel >6 m	91 cm	
SÍ	Barandillas no escalables:	no admisible apoyo entre 20- 70 cm de altura		
SÍ	Aberturas en barandillas	≤10 cm		
SÍ	Barandillas deben soporta una fuerza concentrada en la posición más desfavorable	≥1,5 kN		
SÍ	Color contrastado en pasamanos y zócalos			
SÍ	Control de la inercia térmica de los materiales ext			

CONCLUSIONES

Se deben prolongar los pasamanos en los embarques en 30 cm para guiar el recorrido y servir como elemento de apoyo y agarre durante la circulación. Los pasamanos deberán quedar rematados de forma curva o hacia abajo de modo que se eviten colisiones o enganches en los extremos. Los sistemas de fijación de los pasamanos no deben interferir en el paso continuo de la mano.

IMÁGENES

E12 1			
ASCENSORES			
PUERTO	EIVISSA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	09-OFICINAS DE LA APB		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los ascensores son el medio más adecuado para el transporte de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y personas con perros guía. Deben vincularse claramente como alternativa a escaleras fijas o mecánicas, mediante señalización y proximidad. En esta ficha estudiaremos el ascensor de las oficinias de la APB.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Puertas automáticas con sensor anti-aprisionamiento			
SÍ	No admisibles puertas batientes o ascensores sin puerta			Puertas correderas automáticas
NO	Se recomienda en uso público puertas transparentes			Puertas opacas
NO	Pasamanos continuo estable y ergonómico. Ver Ficha E.9.	Ficha E.9		Situar pasamanos en lados sin puertas rematados de forma curva hacia pared.
	Dimensiones			
NO	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm	inferior	
SÍ	Contará con mecanismo de auto-nivelado. El suelo de la cabina y el pavimento adyacente quedan enrasados			
NO	Entre suelo cabina y el pavimento exterior,distancia al forjado o GAP	≤2 cm	3,2 cm	
NO	Dimensiones mínimas de cabina 1 puerta	Ancho 110cm Prof. 140 cm	Ancho100cm Prof.120cm	
-	Dimensiones mínimas de cabina 2 puerta enfrentadas	Ancho 110cm Prof. 140 cm		
-	Dimensiones mínimas de cabina 2 puerta en ángulo	Ancho 140cm Prof. 140 cm		
SÍ	Altura libre en cabina	Mín 210 cm	218 cm	
SÍ	Ancho puertas	≥100 cm	80 cm	
SÍ	Altura puertas	≥2,00 m	200 cm	
NO	Pasamanos	Ø =4 cm - 5 cm separado ≥4,5 cm	Ø =4 cm - 5 cm separado ≥4,5 cm	sección 3,5 cm separado 3 cm
SÍ	Altura pasamanos	90 cm	92 cm	
SÍ	Espacio libre junto a botoneras	≥20 cm	≥20 cm	
SÍ	Botoneras	90 cm - 120 cm	90 cm - 120 cm	
SÍ	Botones de emergencia y parada en la parte inferior del tablero y altura	>100 cm	120 cm	
SÍ	Disposición de botones conforme:	UNE EN 81-70:2004		
NO	Embarque de ascensor Pavimento táctil acanaladura transversal	120 x 120 cm		No existe pavimento táctil
SÍ	Iluminación de cabina	200 lux	≥200 lux	
SÍ	Cumplirán requisitos para en el diseño y fabricación de ascensores y componentes de seguridad del Real Decreto 1314/1997 y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores	RD 1314/1997 Consejo 95/16/CE		
SÍ	cumplir especificaciones de accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad	UNE EN 81-70:2004		
	Acabados			
NO	Si cabina <110 cm x 140 cm. dónde un usuario de silla de ruedas no puede girar se incluirá espejo	<110 cm x 140 cm		Incluye espejo pero no en la pared opuesta a la entrada
SÍ	Espejos de seguridad y evitando confusión óptica.			
SÍ	Pavimento firme, estable, no deslizante y sin discontinuidades			
SÍ	Marco exterior contrastado			
NO	Pavimento táctil acanaladura transversal conforme a Ficha U.9	Ficha U.9		No existe pavimeto como guía de dirección
NO	Indicador sonoro y visual de parada y nº de planta. Botones contrastados y con información visual, braille y alto relieven. Situados en la jamba izq. sentido salida.	120 cm de altura	indicador visual entre 145- 187 cm	No hay señalización en braille y alto relieve
NO	En uso público: bucle de inducción magnética	Según RD 1314/1997		

CONCLUSIONES

Para que el ascensor fuera accesible se debería substituir y colocar uno nuevo.
Se proponer realizar el mayor número de mejoras para mejorar la accesibilidad del ascensor. Se colocarán pasamanos en las paredes de la cabina donde no existan puertas. La zona de asimiento de los pasamanos tendrá una sección transversal de dimensiones entre 4 cm y 5 cm, sin cantos vivos. El espacio libre entre la pared y la zona asir debe será de al menos 4,5 cm. La altura del borde superior de la zona a asir será 90 cm medidos desde el suelo de la cabina. Para evitar la obstrucción de botones, el pasamanos se interrumpirá al llegar a la botonera a una distancia de al menos 20 cm y en sus extremos estará cerrado y girado hacia la pared.
Para mejorar la localización visual del ascensor el marco exterior del mismo se realizará en un color contrastado con el resto de la pared y con las puertas del ascensor. En el exterior de la cabina, frente a las puertas del ascensor, se dispondrán franjas de pavimento táctil de acanaladura colocadas en sentido transversal a la marcha, cromáticamente contrastadas. Este pavimento táctil que se colocará en todas las plantas tendrá un ancho total de 120 cm y una profundidad de 120 cm. La iluminación de cabina tendrá un nivel mínimo al nivel del suelo de 200 lux.

IMÁGENES



5. PUERTO DE LA SAVINA

E2 1

PUERTAS DE ACCESO

PUERTO	SAVINA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

El acceso a la edificación es el punto de conexión entre el espacio exterior y edificado.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Mínimo un acceso accesible en cada edificios, a ser posible a coincidir con el acceso principal.			Todos los accesos son accesibles.
-	Si hay accesos no accesibles, el recorrido hasta el acceso accesible más próximo deberá estar señalizado según las condiciones del Bloque 5			No existe itinerario no accesible
SÍ	Mecanismos de apertura y cierre funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o automáticos.			automático
SÍ	Puertas abatibles o correderas. No admisibles giratorias. No recomendadas puertas batientes automáticas.			Puertas correderas
-	Puertas batientes situadas en acceso a ser posible con barra de accionamiento horizontal en ambas caras.y resorte o dispositivo de cierre automático.			
SÍ	Puertas automáticas contarán con mecanismos de ralentización y seguridad y cumplirán con la legislación vigente sobre máquinas.(Directiva 98/37/CE)			
NO	Puertas de vidrio de seguridad y con zócalo inferior de protección de 40 cm de altura			
	Dimensionado			
SÍ	Discontinuidades umbral ≤2 cm, achaflanadas a 45°.			
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm		
SÍ	Altura libre	≥210 cm	220cm	
SÍ	Anchura libre de paso medida en el marco y aportada por no más de una hoja. Recomendable 90 cm	≥80 cm	≥80 cm	
-	Altura Mecanismos de apertura y cierre	80 cm - 120 cm		
-	Altura barra de accionamiento puertas baitentes	80 cm ± 5 cm,		
SÍ	D mecnaismo apertura hasta el encuentro en rincón	≥40 cm	≥40 cm	
SÍ	F apertura puerta salida ≤25 N (≤65 N cuando sean resistentes al fuego)			
SÍ	Señalización en puertas de vidrio, franjas	Altura1: 120 cm Altura2: 170 cm		No existe señalización por franjas pero sí existe señalización cromáticamente contrastada con forma de circunferencia
	Acabados			
SÍ	Itinerario Ficha E.1	E.1		
NO	Señalización Ficha C.7 y Ficha C.8	C7-C8		
NO	Banda diferenciada cromáticamente en el contorno hueco			
NO	Puertas de vidrio y fachadas de vidrio diferenciadas entre sí			

CONCLUSIONES

En aquellos accesos situados en fachadas acristaladas se deberán diferenciar la parte fija de la parte móvil. Las grandes superficies se señalizarán mediante franjas visualmente contrastadas situadas a 120 y 170 cm.

IMÁGENES

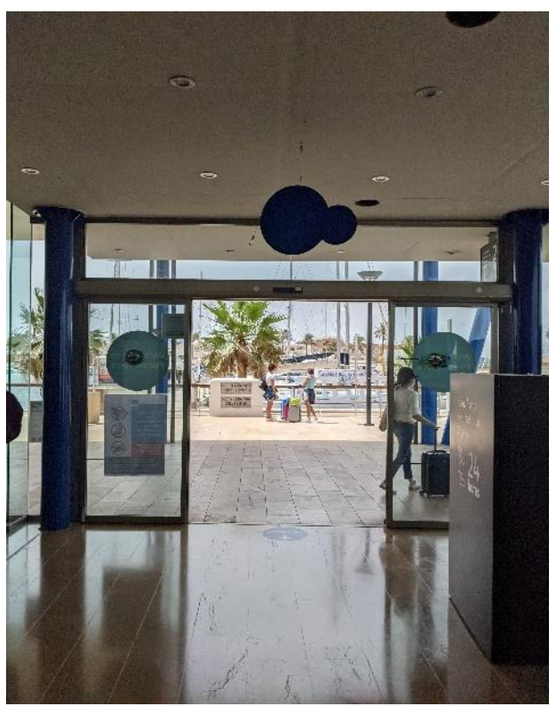

E7 1			
ESCALERAS FIJAS INTERIORES			
PUERTO	SAVINA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Se analizan las escaleras fijas de uso habitual existentes en el edificio de la casa del mar

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Con alternativa Accesible próxima y señalizada	Rampas Ficha E.8 Ascensores Ficha E.10		ascensores señalizados
SÍ	Directriz recta o ligeramente curva		Directriz recta	
SÍ	Contrahuella obligatoria. No admisible: solapes ni bocel. Escalones dimensiones iguales.			
	Dimensiones			
NO	Tramos	Mín 3 esc. Máx 10 esc		Tramos de más de 10 esc.
SÍ	Anchura	≥120 cm	≥120 cm	
SÍ	Altura espacio inferior escalera	<220 cm protegidos		Protegida
SÍ	Relación, proporciones.	54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm		
SÍ	Huella	30 cm ≤ H ≤ 36 cm	30cm	
NO	Contrahuella o tabica	13 cm ≤ C ≤ 16 cm	17,5 cm	
SÍ	Ángulo entre H y C	90°		
SÍ	Rellanos: A =A de escalera y Profundidad ≥A de escalera.	120 cm en recto recomendable 150 cm cambios dirección	Prof. 120 cm	
SÍ	Inicio y final de la escalera, espacio de A =A escalera y Profundidad	≥150 cm		
	Acabados			
NO	Señalización en el ancho del escalón, tira antideslizante contrastada (textura y color)	de 5 cm a 3 cm del borde		
NO	En Inicio y final situar franja de pavimento táctil de acanaladura contrastado			No hay franja de pavimento táctil
-	Altura pavimento táctil	3 mm ± 1 mm		
-	anchura líneas de franja	≥25 mm y < 30 mm		
-	separación entre ejes de franjas	≥60 mm y < 65 mm		
NO	A franja de pavimento táctil=A escalera y Profundidad ≥120 cm	Ficha U.9		
SÍ	Escalera: Pavimento accesible	clase 2. Ficha E.4		
NO	Pasamanos y barreras de protección accesibles	Ficha E.9	h barandilla 112-117 cm	A una sola altura sin pasamanos continuo.

CONCLUSIONES

La escalera tiene un diseño no accesible ya que la altura de la huella es superior a 16 cm y presenta pasamanos no accesibles. Para que fuera accesible se debería modificar toda la escalera. Ante la dificultad económica y técnica de llevar a cabo esta actuación se propone mejorar la accesibilidad de la escalera existente en todos aquellos aspectos que sea posible. Se colocarán pasamanos dobles continuos a ambos lados de la escalera. Se colocará pavimento táctil en embarque y desembarque y señalización en los escalones.

IMÁGENES

LA BOCANA
LA BOCANA
LA BOCANA
LA BOCANA

AQUA

E9 1			
PASAMANOS Y BARANDILLAS			
PUERTO	SAVINA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Las barandillas, los pasamanos y los zócalos son elementos de apoyo y protección para las personas. Sirven para proteger los cambios de nivel y mejorar la deambulación en los itinerarios verticales.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
NO	Pasamanos continúo a ambos lados a doble altura.			Pasamanos a una altura.
NO	Pasamanos prolongados en los embarques en 30 cm.	30 cm		Sin prolongar
NO	Pasamanos rematados de forma curva o hacia abajo.			
SÍ	En los lados abiertos de escaleras y rampas, colocar barandillas para evitar caídas junto a desniveles con diferencia de cota ≥55 cm.	≠ de cota ≥55 cm		
NO	Todos los elementos son continuos, estables y sin cantos vivos			Pasamanos no es continuo
SÍ	Dimensiones			
-	Altura zócalos rampas	≥10 cm		
SÍ	Sección pasamanos	3,5 - 5 cm	5 cm	
-	Separación pasamanos al paramento	5 cm		encatrado en la barandilla
-	Si separación >5 cm, debe aumentarse el ancho de la escalera o rampa.			
NO	Pasamanos dobles	H1 =90 cm - 95 cm. H2 =70 cm - 75 m.		
-	rampa o escalera fija con pasamanos doble central	ancho ≥4 m		
SÍ	Altura Barandillas-barreras de protección	≥90 cm desniveles ≤6 m__ ≥110 cm desnivel >6 m	112-117 cm	
SÍ	Barandillas no escalables:	no admisible apoyo entre 20- 70 cm de altura		
SÍ	Aberturas en barandillas	≤10 cm		
SÍ	Barandillas deben soporta una fuerza concentrada en la posición más desfavorable	≥1,5 kN	≥1,5 kN	
SÍ	Color contrastado en pasamanos y zócalos			
SÍ	Control de la inercia térmica de los materiales ext			

CONCLUSIONES

Disponer de pasamanos dobles (altura 75-95 cm) a ambos lados prolongados en los embarques en 30 cm para guiar el recorrido y servir como elemento de apoyo y agarre durante la circulación. Los pasamanos deberán quedar rematados de forma curva o hacia abajo de modo que se eviten colisiones o enganches en los extremos. Los pasamanos deben quedar separados del paramento vertical al menos 5 cm.

IMÁGENES

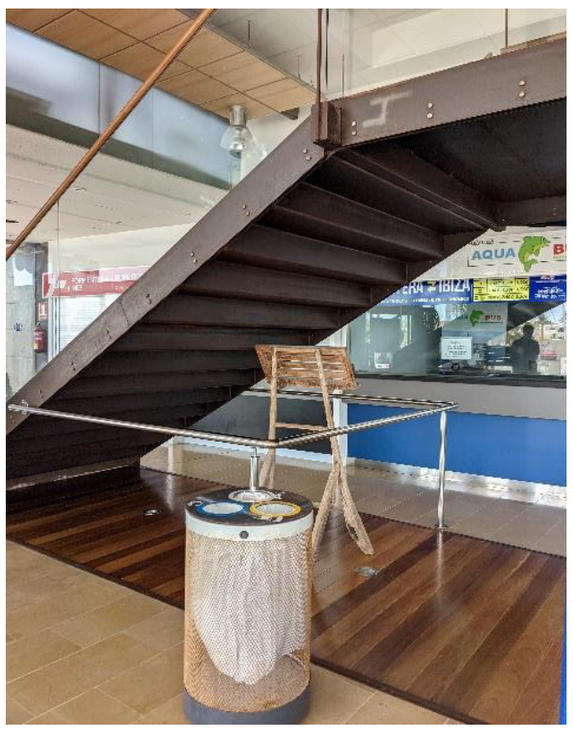

E12 1			
ASCENSORES			
PUERTO	SAVINA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los ascensores son el medio más adecuado para el transporte de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y personas con perros guía. Deben vincularse claramente como alternativa a escaleras fijas o mecánicas, mediante señalización y proximidad.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Puertas automáticas con sensor anti-aprisionamiento			
SÍ	No admisibles puertas batientes o ascensores sin puerta			Puertas correderas automáticas
NO	Se recomienda en uso público puertas transparentes			Puertas opacas
NO	Pasamanos continuo estable y ergonómico. Ver Ficha E.9.	Ficha E.9		Colocar pasamanos en todos los lados dónde no haya puertas rematados de forma curva hacia la pared.
	Dimensiones			
SÍ	Espacio de aproximación	Ø ≥150 cm		
SÍ	Contará con mecanismo de auto-nivelado. El suelo de la cabina y el pavimento adyacente quedan enrasados			
NO	Entre suelo cabina y el pavimento exterior,distancia al forjado o GAP	≤2 cm	4 cm	
-	Dimensiones mínimas de cabina 1 puerta	Ancho 110cm Profundidad 140 cm		
SÍ	Dimensiones mínimas de cabina 2 puerta enfrentadas	Ancho 110cm Profundidad 140 cm	110 x 140 cm	
-	Dimensiones mínimas de cabina 2 puerta en ángulo	Ancho 140cm Profundidad 140 cm		
SÍ	Altura libre en cabina	Mín 210 cm		
NO	Ancho puertas	≥100 cm	80 cm	
SÍ	Altura puertas	≥2,00 m	200 cm	
NO	Pasamanos	Ø =4 cm - 5 cm separado ≥4,5 cm	Ø =4 cm - 5 cm separado ≥4,5 cm	sección elipse 3 x 7 cm
SÍ	Altura pasamanos	90 cm		
SÍ	Espacio libre junto a botoneras	≥20 cm	≥20 cm	
SÍ	Botoneras	90 cm - 120 cm	90 cm - 120 cm	
SÍ	Botones de emergencia y parada en la parte inferior del tablero y altura	>100 cm		
SÍ	Disposición de botones conforme:	UNE EN 81-70:2004		
NO	Embarque de ascensor Pavimento táctil acanaladura transversal	120 x 120 cm		No existe pavimento táctil
NO	Iluminación de cabina	200 lux		
SÍ	Cumplirán requisitos para en el diseño y fabricación de ascensores y componentes de seguridad del Real Decreto 1314/1997 y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores	Real Decreto 1314/1997 Consejo 95/16/CE		
SÍ	cumplir especificaciones de accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad	UNE EN 81-70:2004		
	Acabados			
SÍ	Si cabina <110 cm x 140 cm. dónde un usuario de silla de ruedas no puede girar se incluirá espejo	<110 cm x 140 cm	110 cm x 140 cm	
SÍ	Espejos de seguridad y evitando confusión óptica.			
SÍ	Pavimento firme, estable, no deslizante y sin discontinuidades			
NO	Marco exterior contrastado			
NO	Pavimento táctil acanaladura transversal conforme a Ficha U.9	Ficha U.9		No existe pavimeto como guía de dirección
NO	Indicador sonoro y visual de parada y nº de planta. Botones contrastados y con información visual, braille y alto relieven. Situados en la jamba izq. sentido salida.	120 cm de altura		indicador de parada a una altura superior a 120 cm
NO	En uso público: bucle de inducción magnética	Según Real Decreto 1314/1997		

CONCLUSIONES

Situar puerta con anchura de paso mayor a 100 cm. En el exterior de las cabinas disponer franjas de pavimento táctil de acanaladura colocadas en sentido transversal a la marcha frente a la puerta del ascensor, en todos los niveles, de 120 cm de ancho por 120 cm de fondo, cromáticamente contrastadas. Se deben colocar pasamanos con un diseño ergonómico en las paredes de la cabina donde no existan puertas, la altura del borde superior de la zona a asir será 90 cm medidos desde el suelo de la cabina. Por último, al ser un ascensor de uso público, también deberá disponer de bucle de inducción magnética.

IMÁGENES

P0
P1
Eat & Shop
La Bocana
Pop us Shops

E14 1			
MOSTRADORES DE VENTA DE BILLETES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO			
PUERTO	SAVINA	ÁMBITO	EDIFICACIÓN
ZONA	12-ESTACIÓN MARÍTIMA		

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

Los espacios y equipamientos donde se produce la Atención al Cliente, deben estar diseñados para facilitar la labor a los trabajadores, así como permitir la máxima comodidad y prestaciones para los viajeros.

CUMPLIMIENTO NECESIDADES

CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN NORMATIVA	VALOR NORMATIVO	VALOR TOMADO	OBSERVACIONES
SÍ	Fácil localización desde el acceso			no hay señalización mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m
SÍ	Sin aristas vivas y sin elementos volados más de 15 cm por debajo de 220 cm o bien con proyección vertical	a -220 cm no + de 15cm de volado o proy.vertical		
NO	Mostrador de información dotado con bucle de inducción con señalización normalizada (almenos 1 taquilla)			sin bucle de inducción (sin señalización que lo indique)
NO	Personal de atención al público con conocimientos para atender a personas con diferentes capacidades y básicos de lengua de signos.			
NO	Se recomienda disponer de un sistema de comunicación en lengua de signos.			No se dispone de sistema de comunicación de lengua de signos
	Dimensiones			
NO	Entre entrada y mostrador franja guía	A 40 cm		No existe franja guía
SÍ	Mostrador plano de trabajo	Anchura ≥100 cm	Anchura ≥100 cm	
NO	Mostrador plano de trabajo altura:	h ≤85 cm	> 85 cm en zona del usuario	
NO	Mostrador, Espacio libre inferior	≥70 cm x 100 cm x 60 cm (h x a x p)		Espacio inferior cerrado
NO	Iluminación	≥300 lux		
	Acabados			
NO	Información relevante en diferentes soportes como visual, táctil y acústico, apoyándose en la tecnología y en varios idiomas	Bloque 5		Soporte visual y acústico.

CONCLUSIONES

Los mostradores deben estar comunicados con un itinerario accesile. Se deben señalizar desde el acceso mediante franjas de pavimento de bandas contrastadas paralelas a la dirección de la marcha y anchura de 0,40 m. Se debe dotar a los mostradores de información con bucle de inducción y con su pertinente señalización normalizada. El personal de atención al público debe contar con conocimientos sobre cómo tratar con personas con diferentes capacidades y conocimientos básicos de lengua de signos. Se deben dotar a los mostradores de un espacio libre inferior de 70 cm de altrua x100 cm de ancho y 60 cm de profundidad situado tanto el la zona del trabajador como del usuario. Por último se debe modificar la iluminación para que el nivel de iluminación en los puntos de atención al público sea de 300 lux.

IMÁGENES

ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

IDOM

ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS EN EL PERIODO DE 2023 Y 2024

Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

P.O.74.24

Anejo 3. Plan de Obra

Julio de 2024

Encargo P/103731

TABLA DE REVISIONES

Edición	Fecha	Redactado	Revisado	Destinatario
1	10/10/2022	ACA	CTF	APB – Autoridad Portuaria de Baleares
2	10/03/2024	ACA	CTF	APB – Autoridad Portuaria de Baleares
3	24/07/2024	AGA	CTF	APB – Autoridad Portuaria de Baleares

ÍNDICE

1. PLAN DE OBRA 3

2. FLUJO DE CAJA 4

1. PLAN DE OBRA

La obra tiene una duración estimada de SEIS (6) meses

PLAN DE OBRA

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
PUERTO ALCUDIA						
OFICINAS APB						
ESTACIÓN MARÍTIMA						
LONJA						
PUERTO EIVISSA						
APB						
ESTACIÓN MARÍTIMA						
EDIFICIO MARTILLO						
PUERTO MAÓ						
EM CRUCEROS						
EM COS NOU						
PUERTO LA SAVINA						
ESTACIÓN MARÍTIMA						
SEGURIDAD Y SALUD						

2. FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
PUERTO ALCUDIA	**49.588,29 €**	**62.941,80 €**					**112.530,09 €**
OFICINAS APB	18.445,22 €						18.445,22 €
ESTACIÓN MARÍTIMA	31.143,07 €						31.143,07 €
LONJA		62.941,80 €					62.941,80 €
PUERTO EIVISSA			**41.693,35 €**	**36.022,28 €**			**77.715,63 €**
APB			41.693,35 €				41.693,35 €
ESTACIÓN MARÍTIMA				15.372,00 €			15.372,00 €
EDIFICIO MARTILLO				20.650,28 €			20.650,28 €
PUERTO MAÓ				**11.301,99 €**	**11.301,99 €**	**6.279,40 €**	**28.883,38 €**
EM CRUCEROS				11.301,99 €	11.301,99 €		22.603,98 €
EM COS NOU						6.279,40 €	6.279,40 €
PUERTO LA SAVINA					**32.631,21 €**		**32.631,21 €**
ESTACIÓN MARÍTIMA					32.631,21 €		32.631,21 €
SEGURIDAD Y SALUD	**875,00 €**	**875,00 €**	**875,00 €**	**875,00 €**	**875,00 €**	**875,00 €**	**5.250,00 €**
TOTAL MES (PEM)	50.463,29 €	63.816,80 €	42.568,35 €	48.199,27 €	44.808,20 €	7.154,40 €	**257.010,31 €**

ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

IDOM

ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS EN EL PERIODO DE 2023 Y 2024

Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

P.O.74.24

Anejo 4. Justificación de precios

Julio de 2024

Encargo P/103731

TABLA DE REVISIONES

Edición	Fecha	Redactado	Revisado	Destinatario
1	01/10/2023	ACA	CTF	APB – Autoridad Portuaria de Baleares
2	11/03/2024	ACA	CTF	APB – Autoridad Portuaria de Baleares
3	24/07/2024	AGA	CTF	APB – Autoridad Portuaria de Baleares

ÍNDICE

1. OBJETO 3

2. JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS 3

2.1. Mano de obra 3

2.2. Maquinaria 4

3. MATERIALES 4

4. COSTES INDIRECTOS 4

4.1. Personal técnico y administrativo adscrito a las obras 4

4.2. Instalaciones de obra 5

4.3. Cálculo de coeficiente "K" de los costes indirectos 5

5. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 6

6. MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 6

6.1. Materiales, mano de obra y maquinaria 6

6.1.1. Mano de obra 6

6.1.2. Salario base 7

6.1.3. Abonos retenidos por días no trabajados 8

6.1.4. Seguridad social y accidentes + Fundación laboral de la construcción 10

6.1.5. Indemnización por cese fijo de obra 11

6.1.6. Indemnizaciones y pluses 13

6.1.7. Tabla salarial 2024 13

6.1.1. Coste mano de obra 14

6.1.2. Materiales 14

6.1.3. Maquinaria 15

6.2. Otros 15

7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 16

1. OBJETO

El presente anejo incluye tiene por objeto la definición y justificación de los precios de la mano de obra, maquinaria y materiales básicos. A partir de estos precios unitarios se construyen los precios de las unidades de obra que se integran en el Presupuesto del presente Proyecto.

Asimismo, en este Anejo se justifica el porcentaje de costes indirectos que se incluyen en la descomposición de cada unidad de obra.

2. JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS

2.1. Mano de obra

Para la deducción de los costes de la mano de obra aplicar en el presente proyecto se ha tenido en cuenta cuanto se dice en la O.M. de 27 de abril de 1971 y modificación de 21 de mayo de 1979.

El coste horario de la mano de obra viene definido por la fórmula:

C = (1 + K) A + B

en la que:

C = Coste horario en euros hora.

K = Coeficiente medio en tanto por uno que recoge los siguientes conceptos:

- Jornales percibidos y no trabajados: ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y Julio, justificación de los beneficios de la empresa cuanto éstos constituyen remuneración directa con carácter de salario.
- Indemnización por despido y muerte natural.
- Seguridad Social, Formación profesional cuota sindical y seguro de accidentes.
- Aquellos otros conceptos que con posterioridad a esta orden tengan carácter de coste y que a juicio de la Comisión de Revisión de Precios del Ministerio deberán incluirse, modificaciones e incluso suprimirse por razón de disposiciones que así lo estipulen.

A = En euros/hora en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social y Formación profesional vigente.

B = En euros/hora es la cantidad que completa el coste horario y recoge los pluses de Convenio Colectivo, Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses de gratificación voluntaria no comprendido en el coeficiente K, incluidas en sus repercusiones.

2.2. Maquinaria

El plazo de ejecución de las obras, y la magnitud del presupuesto, parecen aconsejar que, en principio, se deseche por antieconómica, la adquisición de maquinaria destinada exclusivamente a la ejecución de las obras que comprende el presente Proyecto.

De acuerdo con esta idea, se ha solicitado información de las diferentes casas que, en las proximidades del lugar de ubicación de las obras, se dedican al alquiler de maquinaria de las características necesarias para estos trabajos. El resultado de esta información ha confirmado los supuestos, ya que los precios ofrecidos son más bajos que los que en este servicio se conocen y se han deducido para obras similares en el caso de utilización de maquinaria propiedad del Contratista. Una vez recogido de entre todos ellos el más ventajoso para la obra, éste es el que se adopta para la composición de los precios unitarios, reflejándose su valor en el cuadro que se inserta a continuación.

El coste por hora de trabajo incluye la parte proporcional del tiempo en que la máquina debe estar parada por exigencias en la organización de éstos mismos. Por tanto, en la composición de los precios unitarios ni se tienen presentes, ni se valoran los tiempos en que la respectiva máquina está parada.

3. MATERIALES

Puesto que los costes obtenidos de los materiales a pie de obra son de uso común en la zona, se inserta a continuación un Cuadro-Resumen de dichos costes, al amparo de lo establecido en la O.M. de Obras Públicas de 14 de Marzo de 1969, en su apartado 1.2.

El precio a pie de obra de cada material es el resultante de sumar al coste en almacén suministrador, el importe correspondiente a Carga, Descarga y Transporte.

4. COSTES INDIRECTOS

De acuerdo con el Plan de Obra, la duración prevista de los trabajos es de 120 días naturales.

4.1. Personal técnico y administrativo adscrito a las obras

Personal que no interviene de forma directa en la ejecución de las unidades de obra, realizando exclusivamente funciones de control, organización, distribución de trabajos, vigilancia, etc., y que se enumeran en la tabla que se muestra a continuación.

La dedicación de personal prevista, por categorías, junto con su coste mensual es la siguiente:

Tabla 1. Coste de personal técnico y administrativo adscrito a las obras.

Personal	Coste mensual (€/mes)	Rendimiento (Dedicación/mes)	Nº meses	Subtotal (€)
Jefe de Obra	10.332,79 €	0,10	6	6.199,67 €
Encargado General	6.352,36 €	0,075	6	2.873,81 €
Subtotal				**9.073,48 €**

4.2. Instalaciones de obra

Para una obra de las características de este proyecto, las instalaciones mínimas de que hay que dotarla son las siguientes, junto con su coste aproximado:

Tabla 2. Coste de instalaciones de obra

Instalaciones	Superficie (m^2)	Coste mensual (€)	Nº meses	Subtotal (€)
Almacén	15	150	6	900,00 €
Oficina de Obra	25	200	6	1.200,00 €
Aseos	15	150	6	900,00 €
Subtotal				**3.000,00 €**

4.3. Cálculo de coeficiente “K” de los costes indirectos

Siendo el presupuesto de costes directos en torno a los 241.590 € aproximadamente, el cociente entre los costes indirectos señalados y el presupuesto anterior es:

(12.073 / 241.590) *100 = 5 %

El porcentaje de imprevistos se toma del 1% y el coeficiente K de costes indirectos será:

K = 5,00% + 1% = 6,00%

Se adopta **K = 6%**, como coeficiente de costes indirectos.

A continuación, se calcula el presupuesto de costes directos.

Este cálculo se hace tomando los precios descompuestos, que se adjuntan más adelante, antes de aplicarles el tanto por ciento de indirectos.

5. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

La determinación de los costes de ejecución de las diferentes unidades de obra del presente Proyecto se ajusta a las prescripciones de la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968.

El cálculo de todos y cada uno de los precios se basa en la obtención de los “Costes directos” e “indirectos” precisos por aplicación de la fórmula establecida.

Pn = (1 + K/100) x Cn

Pn = Precio de ejecución material de la unidad

K = Porcentaje de costes indirectos

Cn = Coste directo de la unidad

6. MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA

6.1. Materiales, mano de obra y maquinaria

6.1.1. Mano de obra

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo del sector de la Construcción de las Illes Balears en el que se aprueban las tablas salariales para los años 2019, 2020 y 2021 y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de convenio 07000335011981).

Resolución de 23 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo general del sector de la construcción.

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears del Convenio colectivo autonómico de Neteja d'Edificis i Locals de les Illes Balears y su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (07100875012022).

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal de jardinería 2021-2024, (código de convenio 99002995011981).

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se dispone la inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de las Illes Balears del Convenio colectivo del sector del metal de las Illes Balears y su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (código de convenio 07000755011981).

6.1.2. Salario base

Partimos de los datos vigentes que aparecen en el Convenio Colectivo del sector de la Construcción de les Illes Balears, publicado en el BOIB del 27 de enero de 2023, y actualizados, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo general del sector de la Construcción, en un 2,75% en 2024, que son:

	ANEXO I	TABLA SALARIAL 2024			
GRUPOS PROFESIONALES	**NIVELES RETRIBUTIVOS**	**CATEGORIA PROFESIONAL**	**SALARIO BASE MENSUAL**	**GRATIFICACIONES Y VACACIONES**	**SALARIO ANUAL**
		A) PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR			
7	**II**	Arquitecto e Ingeniero superiores	4.157,44 €	4.236,12 €	58.440,18 €
		B) PERSONAL TÉCNICO MEDIO			
		Arquitecto e ingenieros técnicos, técnico titulado de Topografía	3.230,03 €	3.291,15 €	45.403,84 €
		C) PERSONAL TÉCNICO NO TITULADO			
5	**IV**	Encargado General	2.545,59 €	2.593,83 €	35.782,90 €
		F) ADMINISTRATIVOS DE OBRA	**DIARIO**		
3	**IX**	Auxiliar, Técnico, Administrativo de obra	51,18 €	1.563,72 €	21.834,31 €
		G) OPERARIOS			
4	**VIII**	Oficial de 1ª	57,08 €	1.744,65 €	24.353,41 €
3	**IX**	Oficial de 2ª	50,57 €	1.545,68 €	21.578,08 €
2	**X**	Ayudante	48,99 €	1.498,42 €	20.904,75 €
2	**XI**	Peón especialista	47,37 €	1.447,72 €	20.213,67 €
1	**XII**	Peón	45,76 €	1.398,58 €	19.527,25 €
2	**X**	Vigilante	48,86 €	1.499,45 €	20.866,69 €

Plus extrasalarial: 2,68 €
Plus herramientas: 7,19 €
Plus prendas trabajo (3 a 6 meses de antigüedad): 31,81 €
Plus prendas trabajo (más de 6 meses de antigüedad): 63,73 €
Dieta: 30,08 €
½ Dieta: 10,00 €

Partimos de los datos vigentes que aparecen en el Convenio colectivo del sector de la limpieza de edificios y locales de les Illes Balears, publicado en el BOIB del 27 de septiembre de 2022 para 2024, que son:

CATEGORIA PROFESIONAL	SALARIO BASE MENSUAL (2024)
Oficial Oficios Varios	1.188,53 €
Ayudante Oficios Varios	1.079,86 €

Partimos de los datos vigentes que aparecen en el Convenio colectivo del sector de jardinería, publicado en el BOE el 27 de junio de 2022 para 2024, que son:

CATEGORIA PROFESIONAL	SALARIO BASE MENSUAL (2024)
Oficial Jardinero	1.304,98 €
Peón	1.240,55 €

Partimos de los datos vigentes que aparecen en el Convenio colectivo del sector del metal de las Illes Balears, publicado en el BOIB del 11 de octubre de 2023 para 2024, que son:

GRUPOS PROFESIONALES	CATEGORIA PROFESIONAL	SALARIO BASE MENSUAL/DIA (2024)	COMPLEMENTO SALARIAL	SALARIO ANUAL
5	5.2 Oficial 1ª, Chofer camión	46,49 €	3,94 €	20.730,79 €
	5.4 Oficial 2ª, Chofer turismo	44,31 €	3,77 €	19.757,76 €
6	6.2 Oficial 3ª, Ayudante	42,03 €	3,53 €	18.731,36 €
	6.3 Especialista	40,65 €	3,47 €	18.131,20 €
7	7.2 Chofer moto, peón	39,65 €	3,42 €	17.690,11 €

De las tablas, utilizaremos los valores del SALARIO BASE MENSUAL Y DIARIO.

6.1.3. Abonos retenidos por días no trabajados

Para obtener este valor hay que tener en cuenta el calendario laboral de 2024

ANEXO III

CALENDARIO LABORAL 2024

ENERO

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

FEBRERO

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

MARZO

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ABRIL

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

MAYO

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

JUNIO

L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

JULIO

L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

AGOSTO

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

SEPTIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

OCTUBRE

L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

NOVIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

DICIEMBRE

L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

- Los días que son sábado y domingo al año (50 sábados y 52 domingos), que no serán trabajados y sí pagados,

- Los días que son fiesta abonable, para 2024:

- 11 días no laborables

- 2 festivos locales

- 12 festivos nacionales y autonómicos que suponen un total de 25 fiestas abonables.

- Las vacaciones de 1 mes = 30 días menos sábados y domingos (8 días) = 22 días

- Se consideran 4 días perdidos por inclemencias del tiempo, 4 por licencias varias y representación de trabajadores y 15 días por enfermedad y/o accidente.

- Vacaciones de navidad y verano, que serán los 2 meses de paga extra = 60 días

Por tanto:

	Días perdidos	Días abonados	Porcentajes
D	52	52	26,80%
S	50	50	25,77%
F	25	25	12,89%
V	22	22	11,34%
I	4	4	2,06%
L	4	4	2,06%
E	15	15	7,73%
NyV		60	30,93%
			119,59%
	172	232	
Días efectivos año	194	días	
Días abonados año	426	días	

Días efectivos trabajados al año = 366-172 = 194 días

Días abonados al año = 194+232 = 426 días

Con esto, se obtiene un porcentaje que hay que aplicar al SALARIO BASE (119,59 %) para tener en cuenta los abonos retenidos por días no trabajados:

ABONOS RETENIDOS POR DÍAS NO TRABAJADOS = SALARIO BASE x 1,1959

A partir de aquí, los porcentajes correspondientes a SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIDENTES, GASTOS GENERALES EMP. NO FACTURABLES E INDEMNIZACION POR CESE FIJO DE OBRA, se calcularán tomando como base la suma entre el SALARIO BASE + ABONOS RETENIDOS POR DÍAS NO TRABAJADOS.

6.1.4. Seguridad social y accidentes + Fundación laboral de la construcción

Contingencias Comunes	23,600%
Desempleo	6,700%
Fondo de garantía salarial	0,200%
Formación profesional	0,600%
Incapacidad laboral transitoria	4,100%
Incapacidad permanente y muerte	3,500%
	38,700%
Fundación Laboral de la Construcción	0,350%
	39,050%

La Fundación Laboral de la Construcción es una fundación privada sin ánimo de lucro creada en 1992 por las entidades más representativas del sector de la construcción. Entre sus finalidades se encuentra el fomento de la formación profesional, la mejora de la salud laboral y seguridad en el trabajo, el fomento del empleo y expedición de una cartilla profesional. En la actualidad la FLC está constituida en 17 Comisiones Territoriales, que cubren todo el territorio nacional, a excepción de Asturias que cuenta con su propia Fundación.

La Fundación es, por tanto, el instrumento que el sector ha creado para la mejora de la formación, la seguridad y salud laboral y el empleo y pretende garantizar que cualquier empresa o trabajador del sector de la construcción tenga próximo a

su domicilio o lugar de trabajo la asistencia de la Fundación.

El IV Convenio General del Sector de la Construcción (BOE 17.08.2007) refuerza la labor de la Fundación Laboral y le encomienda nuevas funciones, como la implantación en España de la nueva Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).

Por ello, el mismo Convenio establece aumentar la dotación económica de la entidad, incrementando progresivamente el porcentaje de la cuota empresarial.

El VI Convenio General del Sector de la Construcción (BOE 26.09.2017) establece que el porcentaje para el cálculo de las cuotas a pagar a la Fundación Laboral de la Construcción se mantiene en el 0,35%

6.1.5. Indemnización por cese fijo de obra

Según el Artículo 24: Contrato fijo de obra, del Convenio General del Sector de la Construcción:

1 – La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Ley de la Subcontratación en el Sector de la Construcción otorga a la negociación colectiva de ámbito estatal la facultad de adaptar al sector de la construcción el contrato de obra o servicio determinado regulado con carácter general en el artículo 15 del E.T.

De acuerdo con ello la indicada adaptación se realiza mediante el presente contrato que, además de los restantes caracteres que contiene, regula de forma específica el artículo 15.1.a) y 5 y el artículo 49.c) del E.T. para el sector de la construcción.

2 – Este contrato se concierta con carácter general para una sola obra, con independencia de su duración, y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y categoría del trabajador en dicha obra. Su formalización se hará siempre por escrito.

Por ello y con independencia de su duración, no será de aplicación lo establecido en el párrafo primero del artículo 15.1 a) del E.T., continuando manteniendo los trabajadores la condición de «fijos de obra», tanto en estos casos como en los supuestos de sucesión empresarial del 44 del E.T. o de subrogación regulado en el artículo 27 del presente Convenio General.

3 – Sin embargo, manteniéndose el carácter de único contrato, el personal fijo de obra, sin perder dicha condición de fijo de obra, podrá prestar servicios a una misma empresa en distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un periodo máximo de 3 años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última obra se prolonguen más allá de dicho término, suscribiendo a tal efecto el correspondiente documento según el modelo que figura en el Anexo II y devengando los conceptos compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.

En este supuesto y con independencia de la duración total de la prestación, tampoco será de aplicación lo establecido tanto en el apartado 1.a) párrafo primero del artículo 15 del E.T. como en el apartado 5, continuando manteniendo los trabajadores, como se ha indicado, la condición de «fijos de obra».

4 – Teniendo en cuenta la especial configuración del sector de la construcción y sus necesidades, sobre todo en cuanto a la flexibilidad en la contratación y la estabilidad en el empleo del sector mejorando la

seguridad y salud en el trabajo así como la formación de los trabajadores, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores no se producirá sucesión de contratos por la concertación de diversos contratos fijos de obra para diferentes puestos de trabajo en el sector, teniendo en cuenta la definición de puesto de trabajo dada en el artículo 22 del presente Convenio, y por tanto no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 5.º del artículo 15 del E.T.

5 – Por lo tanto, la contratación, con o sin solución de continuidad, para diferente puesto de trabajo mediante dos o más contratos fijos de obra con la misma empresa o grupo de empresas en el periodo y durante el plazo establecido en el artículo 15.5 del E.T., no comportará la adquisición de la condición establecida en dicho precepto.

A tal efecto nos encontramos ante puestos de trabajo diferentes cuando se produce la modificación en alguno de los factores determinados en el artículo 22 del presente Convenio.

La indicada adquisición de condición tampoco operará en el supuesto de producirse bien la sucesión empresarial establecida en el artículo 44 del E.T. o la subrogación recogida en el artículo 27 del presente Convenio.

6 – El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de las correspondientes unidades de obra, hagan innecesario el número de los contratados para su ejecución, debiendo reducirse este de acuerdo con la disminución real del volumen de obra realizada. Este cese deberá comunicarse por escrito al trabajador con una antelación de 15 días naturales. No obstante, el empresario podrá sustituir este preaviso por una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicable, todo ello sin perjuicio de la notificación escrita del cese. La citada indemnización deberá incluirse en el recibo de salario con la liquidación correspondiente al cese.

7 – Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para el empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la Comisión Paritaria Provincial, operarán la terminación de obra y cese previsto en el apartado precedente, a excepción del preaviso. La representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la Comisión Paritaria Provincial, dispondrá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana para su constatación a contar desde la notificación.

El empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al trabajador cuando las causas de paralización de la obra hubieran desaparecido. Dicha obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se convierta, en definitiva. Previo acuerdo entre las partes, el personal afectado por esta terminación de obra podrá acogerse a lo regulado en el apartado 3 de este artículo.

Este supuesto no será de aplicación en el caso de paralización por conflicto laboral.

8 – En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 49.1.c) del E.T., se establece una indemnización por cese del 7 por ciento calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicables devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el citado artículo 49.1 c) del E.T.

Por tanto, tendremos la BASE (obtenida al sumar el Salario Base+ abonos retenidos por días no trabajados) a la que habrá que sumar el porcentaje de SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIDENTES +

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN (39,05%), y el porcentaje de INDEMNIZACIÓN POR CESE FIJO DE OBRA (7%).

BASE + (0,3905 x BASE) + (0,07 x BASE)

6.1.6. Indemnizaciones y pluses

Según datos publicados en el Convenio, los valores que hay que añadir a la suma anterior son los siguientes:

- Plus extrasalarial: 2,68 €, (valor por día)
- Plus herramientas: 7,19 €, compensación por el importe de las herramientas manuales que aporta el trabajador, aplicable únicamente al Oficial 1ª, Oficial 2ª y Ayudante (valor por mes de trabajo, o en su caso, la parte proporcional en función de los días trabajados durante el mes). Cabe comentar que en el Convenio de la Construcción de les Illes Balears no especifica a qué categorías profesionales hay que añadir el plus de herramientas, pero en la mayoría de Convenios de otras provincias los asigna únicamente a las 3 categorías citadas anteriormente, por lo que se ha extrapolado dicho criterio.
- Plus prendas trabajo (3 a 6 meses): 31,81 €.
- Plus prendas trabajo (desde 6 meses): 63,73 € (valor anual, hay que dividirlo entre 366 días)
- Dieta: 30,08 €.
- ½ Dieta: 10,00 €.

La suma total del valor obtenido anteriormente + (plus extrasalarial*12 meses/366) + (plus herramientas*12/231) + (plus prendas trabajo/366) nos da la cantidad que cobra cada trabajador por jornada, dividiendo esta cantidad entre 8 horas obtenemos el valor buscado.

6.1.7. Tabla salarial 2024

NIVEL PROFESIONAL	V	VII	V	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
DENOMINACIÓN	JEFE DE OBRA	TÉC. MEDIO	ENCARGADO	OFICIAL 1(*)	OFICIAL 2(*)	AYUDANTE (*)	PEÓN ESPEC.(*)	PEÓN ORDIN.(*)	VIGILANTE	ADMINISTRATIVO
1. SALARIO BASE										
1.1 Día	138,58 €	107,67 €	84,85 €	57,08 €	50,57 €	48,99 €	47,37 €	45,76 €	48,86 €	51,18 €
2. ABONOS RETENIDOS POR DÍAS NO TRABAJADOS	165,73 €	128,76 €	101,48 €	68,26 €	60,47 €	58,58 €	56,66 €	54,73 €	58,43 €	61,20 €
Suma y sigue	304,31 €	236,43 €	186,33 €	125,33 €	111,04 €	107,57 €	104,03 €	100,49 €	107,29 €	112,38 €
3. SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIDENTES + FLC	118,83 €	92,33 €	72,76 €	48,94 €	43,36 €	42,01 €	40,62 €	39,24 €	41,89 €	43,89 €
4. INDEMNIZACIÓN POR CESE FIJO DE OBRA	21,30 €	16,55 €	13,04 €	8,77 €	7,77 €	7,53 €	7,28 €	7,03 €	7,51 €	7,87 €
Suma	444,45 €	345,30 €	272,13 €	183,05 €	162,18 €	157,11 €	151,94 €	146,76 €	156,69 €	164,14 €
5. PLUS EXTRASALARIAL	2,68 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €	2,68 €
5.1 Atrasos										
6. PRENDAS DE TRABAJO	63,73 €	63,73 €	63,73 €	63,73 €	63,73 €	63,73 €	63,73 €	63,73 €	63,73 €	63,73 €
6.1 Atrasos										
Año = 366 días	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €
7. DESGASTE DE HERRAMIENTAS				7,19 €	7,19 €	7,19 €	7,19 €	7,19 €		
7.1 Atrasos										
Año = 12 meses/230 días				0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €		
Suma total	447,31 €	348,16 €	274,99 €	186,28 €	165,41 €	160,34 €	155,17 €	150,00 €	159,55 €	167,00 €
Incremento sobre la base del convenio del 5%	22,37 €	17,41 €	13,75 €	9,31 €	8,27 €	8,02 €	7,76 €	7,50 €	7,98 €	8,35 €
8. A FACTURAR										
8.1 Por jornada	469,67 €	365,57 €	288,74 €	195,60 €	173,68 €	168,36 €	162,93 €	157,49 €	167,53 €	175,35 €
8.2 Por hora	58,71 €	45,70 €	36,09 €	**24,45 €**	**21,71 €**	**21,05 €**	**20,37 €**	**19,69 €**	20,94 €	21,92 €
8.3 Por mes	**10.332,79 €**	**8.042,59 €**	**6.352,36 €**						**3.685,65 €**	**3.857,66 €**

(*) Únicamente para los oficios de Encofrador, Carpintero de madera y Albañilería

DENOMINACIÓN	OFICIAL LIMPIEZA	AYUDANTE LIMPIEZA	OFICIAL JARDINERO	PEÓN JARDINERÍA	OFICIAL 1 (*)	OFICIAL 2 (*)	AYUDANTE (*)	ESPECIALISTA (*)	PEÓN ORDINARIO (*)
1. SALARIO BASE									
1.1 Día	39,62 €	36,00 €	43,50 €	41,35 €	46,49 €	44,31 €	42,03 €	40,65 €	39,65 €
2. ABONOS RETENIDOS POR DÍAS NO TRABAJADOS	47,38 €	43,05 €	52,02 €	49,45 €	55,60 €	52,99 €	50,26 €	48,61 €	47,42 €
Suma y sigue	87,00 €	79,04 €	95,52 €	90,80 €	102,09 €	97,30 €	92,29 €	89,26 €	87,07 €
3. SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIDENTES + FLC	33,97 €	30,87 €	37,30 €	35,46 €	39,87 €	38,00 €	36,04 €	34,86 €	34,00 €
4. INDEMNIZACIÓN POR CESE FIJO DE OBRA	6,09 €	5,53 €	6,69 €	6,36 €	7,15 €	6,81 €	6,46 €	6,25 €	6,09 €
Suma	127,06 €	115,44 €	139,51 €	132,62 €	149,10 €	142,11 €	134,79 €	130,37 €	127,16 €
5. PLUS EXTRASALARIAL					3,94 €	3,77 €	3,53 €	3,47 €	3,42 €
5.1 Atrasos									
6. PRENDAS DE TRABAJO					63,73 €	63,73 €	63,73 €	63,73 €	63,73 €
6.1 Atrasos									
Año = 366 días					0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €
7. DESGASTE DE HERRAMIENTAS					7,19 €	7,19 €	7,19 €	7,19 €	7,19 €
7.1 Atrasos									
Año = 12 meses/230 días					0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €	0,37 €
Suma total	127,06 €	115,44 €	139,51 €	132,62 €	153,60 €	146,43 €	138,88 €	134,39 €	131,14 €
Incremento sobre la base del convenio del 5%	6,35 €	5,77 €	6,98 €	6,63 €	7,68 €	7,32 €	6,94 €	6,72 €	6,56 €
8. A FACTURAR									
8.1 Por jornada	133,41 €	121,21 €	146,48 €	139,25 €	161,28 €	153,76 €	145,82 €	141,11 €	137,69 €
8.2 Por hora	**16,68 €**	**15,15 €**	**18,31 €**	**17,41 €**	**20,16 €**	**19,22 €**	**18,23 €**	**17,64 €**	**17,21 €**

(*) Para todos los oficios, salvo para los de Encofrador, Carpintero de madera y Albañilería

6.1.1. Coste mano de obra

A0120000	Oficial/a 1a	h	24,45
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	h	24,45
A0123000	Oficial/a 1a encofrador	h	24,45
A0127000	Oficial/a 1a colocador/a	h	20,16
A012A000	Oficial/a 1a carpintero	h	24,45
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	h	20,16
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	h	20,16
A0133000	Ayudante encofrador	h	21,05
A0137000	Ayudante colocador/a	h	18,23
A013A000	Ayudante carpintero	h	21,05
A013F000	Ayudante cerrajero/a	h	18,23
A013M000	Ayudante montador/a	h	18,23
A0140000	Peón/a	h	19,69
A0150000	Peón/a especialista	h	20,37

6.1.2. Materiales

B0111000	Agua	m3	2,04
B013C000	Unidad de 4 asientos	u	625,00
B0312020	Arena piedra granit.p/morte.	t	27,50
B0512401	Cemento pórtland+caliza CEM II/B-L 32,5R, sacos	t	181,58
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	ud	0,94
B05A2103	Lechada p/cerámica,CG1(UNE-EN 13888),color	kg	0,34
B064300C	Hormigón HM-25/B/20/X0	m3	169,04
B0711010	Mort.adhesivo,C1(UNE-EN 12004)	kg	0,36
B0A31000	Clavo acero	kg	1,44
B0D31000	Lata madera pino	m3	264,74
B0D71130	Tablero pino,e=22mm,10 usos	m2	1,59
B0D75000	Tablero aglomerado hidr.2caras plast.,e=10mm,1 uso	m2	9,50
B0DZA000	Desencofrante	l	3,29
B0FHZ002	Gres extruido sin esmaltar, antideslizante (resistencia al deslizamiento clase 3)	m2	52,50
B1000100	Unidad de mostrador de atención al público accesible	u	812,50
B21VVA021	Material auxiliar para la colocación de vidrios	m	1,13
B21VVA025	Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio	u	1,58
B7J50010	Masilla sella.,silicona neut. monocomp.	dm3	18,31
B7J50090	Masilla sella.,poliuretano monocomp.	dm3	17,83
B9E1S000	Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat.	m2	17,28
B9E1Z012	Loseta similar a la existente	m2	15,00
B9VZU501	Tira de carborúndum antideslizante autoadhesiva para pavimentos	m	23,13
BAF1Z001	Puerta abatible, 135x220 cm	u	1.062,50
BAN3Z001	Premarco de madera	u	65,08
BAP32165	Marco ascensor	m	22,50
BAQDR4AA	Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio	u	3.125,00

BAQDZ101	Puerta interior de madera de dimensiones para el hueco existente	u	375,00
BASA91D2	Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120 una hoja batiente para una luz de 100x205 cm	u	600,00
BASA91D3	Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120 de dos hojas batientes para una luz de x196 cm	u	812,50
BAZGZ101	Herrajes p/puerta	u	75,00
BB15Z002	Barandilla formada por montantes planos de acero inox y de 50x5mm	m	575,00
BB15Z056	Pasamanos AISI 316 acabado pulido	m	293,75
BBA11000	Plástico en frío 2 comp. color blanco, p/marcas viales	kg	3,88
BBA11001	Microesferas de vidrio.	kg	2,03
BBA1Z101	Baldosa con franja podotactiles del mismo material que las de las aceras existentes, a=1200 mm	m2	47,29
BBBAD004	Señal de vinilo adhesivo	u	37,50
BBM1Z010	Placa orien.o sit. p/señ.tráf.,acero galv.+pint. 55x70cm, acabada con lám. retrorrefl. cl. RA1	u	130,11
BBMZZ012	Soporte,tubo acero galv.,p/señal.vert.	m	12,81
BC17Z001	Vidrio 4+4 KSIF PLUS/12/4+4	m2	133,75
EP7E1501	Bucle de inducción magnética	u	375,00

6.1.3. Maquinaria

C1101200	Compresor+dos martillos neumáticos	h	20,73
C1311120	Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW	h	58,99
C1315020	Retroexcavadora mediana	h	75,48
C1501800	Camión transp.12 t	h	37,54
C1503500	Camión grúa 5t	h	48,26
C1701100	Camión bomba hormigonar	h	233,44
C1705600	Hormigonera 165l	h	2,14
C1B02A00	Máquina p/pintar banda vial autopropulsada	h	33,24
C2007000	Pulidora	h	2,88
C414Z001	Barcaza o pontona	h	234,38
D060Z015	Hormigón 150kg/m3,1:4:8, cemento pórtland+caliza CEM II/B-L 32,5R+piedra calc. 20mm, elab.en obra,hormigonera 250l	m3	110,40

6.2. Otros

B2RAZ005	Canon de transporte de escombro limpio a vertedero (Mallorca)	t	43,35
B2RAZ055	Canon de transporte de escombro limpio a vertedero (Ibiza)	t	11,50
B2RAZ066	Canon de transporte de escombro limpio a vertedero (Mahón)	t	11,50

7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

El contratista no puede, bajo ningún concepto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna en los precios señalados en esta Justificación de Precios.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01	**PUERTO ALCUDIA**					
01.01	**OFICINAS APB**					
01.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
01.01.01.01	**Demolición de mostrador**		**u**			
	Demolición de estructura del mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	0,200	h	24,45	4,89	
A0150000	Peón/a especialista	0,200	h	20,37	4,07	
C1101200	Compresor+dos martillos neumáticos	0,180	h	20,73	3,73	
%0200	Medios auxiliares	0,127	%	2,00	0,25	
	Suma la partida					12,94
	Costes indirectos			6%		0,78
	TOTAL PARTIDA					**13,72**
01.01.01.02	**Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio**		**u**			
	Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	3,500	h	20,16	70,56	
A013M000	Ayudante montador/a	3,500	h	18,23	63,81	
%0200	Medios auxiliares	1,344	%	2,00	2,69	
	Suma la partida					137,06
	Costes indirectos			6%		8,22
	TOTAL PARTIDA					**145,28**
01.01.01.03	**Desmontaje de mostradores no accesibles**		**m**			
	Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	1,500	h	20,16	30,24	
A013M000	Ayudante montador/a	1,500	h	18,23	27,35	
%0200	Medios auxiliares	0,576	%	2,00	1,15	
	Suma la partida					58,74
	Costes indirectos			6%		3,52
	TOTAL PARTIDA					**62,26**

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.01.04	**Carga y transporte a vertedero**		**m3**			
	Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
C1311120	Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW	0,050	h	58,99	2,95	
C1501800	Camión transp.12 t	0,150	h	37,54	5,63	
B2RAZ005	Canon de transporte de escombro limpio a vertedero (Mallorca)	2,400	t	43,35	104,04	
%0200	Medios auxiliares	1,126	%	2,00	2,25	
	Suma la partida					114,87
	Costes indirectos			6%		6,89
	TOTAL PARTIDA					**121,76**
01.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
01.01.02.01	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**		**m**			
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,500	h	20,16	10,08	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,250	h	18,23	4,56	
BB15Z056	Pasamanos AISI 316 acabado pulido	1,000	m	293,75	293,75	
%0200	Medios auxiliares	3,084	%	2,00	6,17	
	Suma la partida					314,56
	Costes indirectos			6%		18,87
	TOTAL PARTIDA					**333,43**
01.01.02.02	**Suministro y colocación de barandilla**		**m**			
	Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,400	h	18,23	7,29	
A0140000	Peón/a	0,200	h	19,69	3,94	
BB15Z002	Barandilla formada por montantes planos de acero inox y de 50x5mm	1,000	m	575,00	575,00	
%0200	Medios auxiliares	5,983	%	2,00	11,97	
	Suma la partida					610,30
	Costes indirectos			6%		36,62
	TOTAL PARTIDA					**646,92**
01.01.02.03	**Puerta abatible exterior**		**u**			
	Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según					

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,700	h	20,16	14,11	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
BAN3Z001	Premarco de madera	1,000	u	65,08	65,08	
BAF1Z001	Puerta abatible, 135x220 cm	1,000	u	1.062,50	1.062,50	
B7J50010	Masilla sella.,silicona neut. monocomp.	0,060	dm3	18,31	1,10	
B7J50090	Masilla sella.,poliuretano monocomp.	0,200	dm3	17,83	3,57	
BC17Z001	Vidrio 4+4 KSIF PLUS/12/4+4	1,400	m2	133,75	187,25	
%0200	Medios auxiliares	13,363	%	2,00	26,73	
	Suma la partida					1.363,07
	Costes indirectos			6%		81,78
	TOTAL PARTIDA					**1.444,85**
01.01.02.04	**Puerta interior de madera**		**u**			
	Suministro y colocación de puerta interior de madera para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, acabado a definir por el Director Facultativo, incluso herrajes de cierre y de colgar. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012A000	Oficial/a 1a carpintero	2,000	h	24,45	48,90	
A013A000	Ayudante carpintero	1,000	h	21,05	21,05	
BAQDZ101	Puerta interior de madera de dimensiones para el hueco existente	1,000	u	375,00	375,00	
BAZGZ101	Herrajes p/puerta	1,000	u	75,00	75,00	
%0200	Medios auxiliares	5,200	%	2,00	10,40	
	Suma la partida					530,35
	Costes indirectos			6%		31,82
	TOTAL PARTIDA					**562,17**
01.01.02.05	**Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**		**m**			
	Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0120000	Oficial/a 1a	0,150	h	24,45	3,67	
A0140000	Peón/a	0,100	h	19,69	1,97	
B9VZU501	Tira de carborúndum antideslizante autoadhesiva para pavimentos	1,050	m	23,13	24,29	
C2007000	Pulidora	0,050	h	2,88	0,14	
%0200	Medios auxiliares	0,301	%	2,00	0,60	
	Suma la partida					30,67
	Costes indirectos			6%		1,84
	TOTAL PARTIDA					**32,51**
01.01.02.06	**Pavimento de piezas igual a las existentes**		**m2**			
	Suministro y colocación pavimento de loseta, de dimensiones y características similares a las existentes, sentada con mortero de cemento de 3 cm de espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación,					

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	enlechado y limpieza, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	0,400	h	24,45	9,78	
A0140000	Peón/a	0,600	h	19,69	11,81	
B9E1Z012	Loseta similar a la existente	1,000	m2	15,00	15,00	
B0512401	Cemento pórtland+caliza CEM II/B-L 32,5R,sacos	0,022	t	181,58	3,99	
B051Z001	Lechada cemento 1/3 cem ii/b-p 32,5 n	0,001	m3	106,59	0,11	
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	1,000	ud	0,94	0,94	
%0200	Medios auxiliares	0,416	%	2,00	0,83	
	Suma la partida					42,46
	Costes indirectos			6%		2,55
	TOTAL PARTIDA					**45,01**
01.01.02.07	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**		**m2**			
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,000	h	24,45	48,90	
A0140000	Peón/a	3,000	h	19,69	59,07	
B0111000	Agua	0,010	m3	2,04	0,02	
BBA1Z101	Baldosa con franja podotactiles del mismo material que las de las aceras existentes, a=1200 mm	0,750	m2	47,29	35,47	
B9E1S000	Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat.	0,350 x1,02	m2	17,28	6,17	
D0391311	Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caliza, horm.165l	0,030 x1,02	m3	101,12	3,09	
B051Z001	Lechada cemento 1/3 cem ii/b-p 32,5 n	0,001 x1,02	m3	106,59	0,11	
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	1,000	ud	0,94	0,94	
%0200	Medios auxiliares	1,538	%	2,00	3,08	
	Suma la partida					156,85
	Costes indirectos			6%		9,41
	TOTAL PARTIDA					**166,26**
01.01.02.08	**Vinilo adhesivo para señalización**		**u**			
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,300	h	19,69	5,91	
BBBAD004	Señal de vinilo adhesivo	1,000	u	37,50	37,50	
%0200	Medios auxiliares	0,434	%	2,00	0,87	
	Suma la partida					44,28
	Costes indirectos			6%		2,66
	TOTAL PARTIDA					**46,94**

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.01.02.09	**Colocación placa de señalización de orientación**		**u**			
	Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,700	h	19,69	13,78	
A013M000	Ayudante montador/a	0,700	h	18,23	12,76	
BBM1Z010	Placa orien.o sit. p/señ.tráf.,acero galv.+pint. 55x70cm, acabada con lám. retrorrefl. cl. RA1	1,000	u	130,11	130,11	
%0200	Medios auxiliares	1,567	%	2,00	3,13	
	Suma la partida					159,78
	Costes indirectos			6%		9,59
	TOTAL PARTIDA					**169,37**
01.01.02.10	**Instalación de bucle de inducción magnética**		**u**			
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
EP7E1501	Bucle de inducción magnética	1,000	u	375,00	375,00	
%0200	Medios auxiliares	3,898	%	2,00	7,80	
	Suma la partida					397,63
	Costes indirectos			6%		23,86
	TOTAL PARTIDA					**421,49**
01.01.02.11	**Mostrador de atención al público accesible**		**u**			
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,500	h	24,45	61,13	
A0140000	Peón/a	2,500	h	19,69	49,23	
B1000100	Unidad de mostrador de atención al público accesible	1,000	u	812,50	812,50	
%0200	Medios auxiliares	9,229	%	2,00	18,46	
	Suma la partida					941,32
	Costes indirectos			6%		56,48
	TOTAL PARTIDA					**997,80**
01.01.02.12	**Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera**		**u**			
	Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
B013C000	Unidad de 4 asientos	1,000	u	625,00	625,00	
%0200	Medios auxiliares	6,398	%	2,00	12,80	
				Suma la partida		652,63
				Costes indirectos	6%	39,16
				TOTAL PARTIDA		**691,79**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.02	**ESTACIÓN MARÍTIMA**					
01.02.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
01.02.01.01	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m**			
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	1,500	h	20,16	30,24	
A013M000	Ayudante montador/a	1,500	h	18,23	27,35	
%0200	Medios auxiliares	0,576	%	2,00	1,15	
				Suma la partida.....		58,74
				Costes indirectos	6%	3,52
				TOTAL PARTIDA		**62,26**
01.02.01.02	**Carga y transporte a vertedero** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m3**			
C1311120	Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW	0,050	h	58,99	2,95	
C1501800	Camión transp.12 t	0,150	h	37,54	5,63	
B2RAZ005	Canon de transporte de escombro limpio a vertedero (Mallorca)	2,400	t	43,35	104,04	
%0200	Medios auxiliares	1,126	%	2,00	2,25	
				Suma la partida.....		114,87
				Costes indirectos	6%	6,89
				TOTAL PARTIDA		**121,76**
01.02.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
01.02.02.01	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m**			
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,500	h	20,16	10,08	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,250	h	18,23	4,56	
BB15Z056	Pasamanos AISI 316 acabado pulido	1,000	m	293,75	293,75	
%0200	Medios auxiliares	3,084	%	2,00	6,17	
				Suma la partida.....		314,56
				Costes indirectos	6%	18,87
				TOTAL PARTIDA		**333,43**
01.02.02.02	**Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.		**m**			

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0120000	Oficial/a 1a	0,150	h	24,45	3,67	
A0140000	Peón/a	0,100	h	19,69	1,97	
B9VZU501	Tira de carborúndum antideslizante autoadhesiva para pavimentos	1,050	m	23,13	24,29	
C2007000	Pulidora	0,050	h	2,88	0,14	
%0200	Medios auxiliares	0,301	%	2,00	0,60	
	Suma la partida					30,67
	Costes indirectos			6%		1,84
	TOTAL PARTIDA					**32,51**
01.02.02.03	**Vinilo adhesivo para señalización**		**u**			
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,300	h	19,69	5,91	
BBBAD004	Señal de vinilo adhesivo	1,000	u	37,50	37,50	
%0200	Medios auxiliares	0,434	%	2,00	0,87	
	Suma la partida					44,28
	Costes indirectos			6%		2,66
	TOTAL PARTIDA					**46,94**
01.02.02.04	**Mostrador de atención al público accesible**		**u**			
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,500	h	24,45	61,13	
A0140000	Peón/a	2,500	h	19,69	49,23	
B1000100	Unidad de mostrador de atención al público accesible	1,000	u	812,50	812,50	
%0200	Medios auxiliares	9,229	%	2,00	18,46	
	Suma la partida					941,32
	Costes indirectos			6%		56,48
	TOTAL PARTIDA					**997,80**
01.02.02.05	**Recolocación de señal**		**u**			
	Desmontaje, traslado y posterior montaje de señal existente. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,750	h	20,16	15,12	
A013M000	Ayudante montador/a	0,750	h	18,23	13,67	
%0200	Medios auxiliares	0,288	%	2,00	0,58	

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Suma la partida.....		29,37
				Costes indirectos	6%	1,76
				TOTAL PARTIDA		**31,13**
01.02.02.06	**Instalación de bucle de inducción magnética**		**u**			
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
EP7E1501	Bucle de inducción magnética	1,000	u	375,00	375,00	
%0200	Medios auxiliares	3,898	%	2,00	7,80	
				Suma la partida.....		397,63
				Costes indirectos	6%	23,86
				TOTAL PARTIDA		**421,49**

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03	**LONJA**					
01.03.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
01.03.01.01	**Repicado de rampa existente** Repicado de superficie de hormigón, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m3**			
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	3,000	h	24,45	73,35	
A0150000	Peón/a especialista	3,000	h	20,37	61,11	
C1101200	Compresor+dos martillos neumáticos	1,000	h	20,73	20,73	
C1315020	Retroexcavadora mediana	0,100	h	75,48	7,55	
%0200	Medios auxiliares	1,627	%	2,00	3,25	
	Suma la partida					165,99
	Costes indirectos			6%		9,96
	TOTAL PARTIDA					**175,95**
01.03.01.02	**Carga y transporte a vertedero** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m3**			
C1311120	Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW	0,050	h	58,99	2,95	
C1501800	Camión transp.12 t	0,150	h	37,54	5,63	
B2RAZ005	Canón de transporte de escombro limpio a vertedero (Mallorca)	2,400	t	43,35	104,04	
%0200	Medios auxiliares	1,126	%	2,00	2,25	
	Suma la partida					114,87
	Costes indirectos			6%		6,89
	TOTAL PARTIDA					**121,76**
01.03.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
01.03.02.01	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m**			
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,500	h	20,16	10,08	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,250	h	18,23	4,56	
BB15Z056	Pasamanos AISI 316 acabado pulido	1,000	m	293,75	293,75	
%0200	Medios auxiliares	3,084	%	2,00	6,17	
	Suma la partida					314,56
	Costes indirectos			6%		18,87
	TOTAL PARTIDA					**333,43**
01.03.02.02	**Suministro y colocación de barandilla**		**m**			

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,400	h	18,23	7,29	
A0140000	Peón/a	0,200	h	19,69	3,94	
BB15Z002	Barandilla formada por montantes planos de acero inox y de 50x5mm	1,000	m	575,00	575,00	
%0200	Medios auxiliares	5,983	%	2,00	11,97	
	Suma la partida					610,30
	Costes indirectos			6%		36,62
	TOTAL PARTIDA					**646,92**
01.03.02.03	**Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, de dos hojas batientes**		**u**			
	Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, dos hojas batientes, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,250	h	20,16	5,04	
BASA91D3	Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120 de dos hojas batientes para una luz de x196 cm	1,000	u	812,50	812,50	
%0200	Medios auxiliares	8,175	%	2,00	16,35	
	Suma la partida					833,89
	Costes indirectos			6%		50,03
	TOTAL PARTIDA					**883,92**
01.03.02.04	**Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente**		**u**			
	Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,250	h	20,16	5,04	
BASA91D2	Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120 una hoja batiente para una luz de 100x205 cm	1,000	u	600,00	600,00	
%0200	Medios auxiliares	6,050	%	2,00	12,10	
	Suma la partida					617,14
	Costes indirectos			6%		37,03
	TOTAL PARTIDA					**654,17**
01.03.02.05	**Puerta abatible exterior**		**u**			
	Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4					

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,700	h	20,16	14,11	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
BAN3Z001	Premarco de madera	1,000	u	65,08	65,08	
BAF1Z001	Puerta abatible, 135x220 cm	1,000	u	1.062,50	1.062,50	
B7J50010	Masilla sella.,silicona neut. monocomp.	0,060	dm3	18,31	1,10	
B7J50090	Masilla sella.,poliuretano monocomp.	0,200	dm3	17,83	3,57	
BC17Z001	Vidrio 4+4 KSIF PLUS/12/4+4	1,400	m2	133,75	187,25	
%0200	Medios auxiliares	13,363	%	2,00	26,73	
	Suma la partida					1.363,07
	Costes indirectos			6%		81,78
	TOTAL PARTIDA					**1.444,85**
01.03.02.06	**Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio** Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de dimensiones adecuadas para el hueco de obra, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales para su instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**u**			
A012A000	Oficial/a 1a carpintero	1,500	h	24,45	36,68	
A013A000	Ayudante carpintero	0,100	h	21,05	2,11	
BAQDR4AA	Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio	1,000	u	3.125,00	3.125,00	
B21VVA021	Material auxiliar para la colocación de vidrios	1,240	m	1,13	1,40	
B21VVA025	Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio	1,000	u	1,58	1,58	
%0200	Medios auxiliares	31,668	%	2,00	63,34	
	Suma la partida					3.230,11
	Costes indirectos			6%		193,81
	TOTAL PARTIDA					**3.423,92**
01.03.02.07	**Colocación señal vertical, hormigonado** Colocación de tubo de acero galvanizado de señal vertical, colocado en tierra hormigonado. Incluye placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 55x70 cm, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**u**			
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	0,300	h	24,45	7,34	
A0140000	Peón/a	0,400	h	19,69	7,88	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A013M000	Ayudante montador/a	0,500	h	18,23	9,12	
BBMZZ012	Soporte,tubo acero galv.,p/señal.vert.	3,000	m	12,81	38,43	
D060Z015	Hormigón 150kg/m3,1:4:8,cemento pórtland+caliza CEM II/B-L 32,5R+piedra calc. 20mm,elab.en obra,hormigonera 250l	0,100	m3	110,40	11,04	
BBM1Z010	Placa orien.o sit. p/señ.tráf.,acero galv.+pint. 55x70cm, acabada con lám. retrorrefl. cl. RA1	1,000	u	130,11	130,11	
C1503500	Camión grúa 5t	0,050	h	48,26	2,41	
%0200	Medios auxiliares	2,063	%	2,00	4,13	
	Suma la partida					210,46
	Costes indirectos			6%		12,63
	TOTAL PARTIDA					**223,09**

01.03.02.08 **Formación de rampa accesible** **m2**

Formación de rampa compuesta por recrecido de hormigón de 15 cm de espesor medio y suministro y colocación de pavimento cerámico, recibido con mortero adhesivo, previa preparación de la superficie a la colocación. El solado incluye rejuntado, devastado, pulido y abrillantado. Incluye encofrado y parte proporcional de junta de acero inoxidable en cambio de pavimentos. Totalmente terminado y ejecutado conforme a especificaciones del CTE.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

A0123000	Oficial/a 1a encofrador	0,600	h	24,45	14,67	
A0133000	Ayudante encofrador	0,600	h	21,05	12,63	
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	0,400	h	24,45	9,78	
A0140000	Peón/a	0,400	h	19,69	7,88	
A0127000	Oficial/a 1a colocador/a	0,900	h	20,16	18,14	
A0137000	Ayudante colocador/a	0,900	h	18,23	16,41	
B064300C	Hormigón HM-25/B/20/X0	0,200 x1,03	m3	169,04	34,82	
B0A31000	Clavo acero	0,053	kg	1,44	0,08	
B0D31000	Lata madera pino	0,001	m3	264,74	0,26	
B0D71130	Tablero pino,e=22mm,10 usos	1,000	m2	1,59	1,59	
B0D75000	Tablero aglomerado hidr.2caras plast.,e=10mm,1 uso	1,000	m2	9,50	9,50	
B0DZA000	Desencofrante	0,060	l	3,29	0,20	
B05A2103	Lechada p/cerámica,CG1(UNE-EN 13888),color	0,067	kg	0,34	0,02	
B0711010	Mort.adhesivo,C1(UNE-EN 12004)	0,500	kg	0,36	0,18	
B0FHZ002	Gres extruido sin esmaltar, antideslizante (resistencia al deslizamiento clase 3)	1,000	m2	52,50	52,50	
C1701100	Camión bomba hormigonar	0,020	h	233,44	4,67	
%0200	Medios auxiliares	1,833	%	2,00	3,67	
	Suma la partida					187,00
	Costes indirectos			6%		11,22
	TOTAL PARTIDA					**198,22**

01.03.02.09 **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** **m**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

A0120000	Oficial/a 1a	0,150	h	24,45	3,67	
A0140000	Peón/a	0,100	h	19,69	1,97	
B9VZU501	Tira de carborúndum antideslizante autoadhesiva para pavimentos	1,050	m	23,13	24,29	
C2007000	Pulidora	0,050	h	2,88	0,14	
C2007000	Pulidora	0,050	h	2,88	0,14	
%0200	Medios auxiliares	0,301	%	2,00	0,60	
	Suma la partida					30,67
	Costes indirectos			6%		1,84
	TOTAL PARTIDA					**32,51**

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03.02.10	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**		**m2**			
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,000	h	24,45	48,90	
A0140000	Peón/a	3,000	h	19,69	59,07	
B0111000	Agua	0,010	m3	2,04	0,02	
BBA1Z101	Baldosa con franja podotactiles del mismo material que las de las aceras existentes, a=1200 mm	0,750	m2	47,29	35,47	
B9E1S000	Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat.	0,350 x1,02	m2	17,28	6,17	
D0391311	Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caliza, horm.165l	0,030 x1,02	m3	101,12	3,09	
B051Z001	Lechada cemento 1/3 cem ii/b-p 32,5 n	0,001 x1,02	m3	106,59	0,11	
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	1,000	ud	0,94	0,94	
%0200	Medios auxiliares	1,538	%	2,00	3,08	
				Suma la partida		156,85
				Costes indirectos	6%	9,41
				TOTAL PARTIDA		**166,26**
01.03.02.11	**Marca vial itinerario peatonal reflectante, blanca**		**m2**			
	Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	0,400	h	24,45	9,78	
A0140000	Peón/a	0,400	h	19,69	7,88	
BBA11000	Plástico en frío 2 comp. color blanco, p/marcas viales	1,000	kg	3,88	3,88	
BBA11001	Microesferas de vidrio.	0,500	kg	2,03	1,02	
C1B02A00	Máquina p/pintar banda vial autopropulsada	0,080	h	33,24	2,66	
%0200	Medios auxiliares	0,252	%	2,00	0,50	
				Suma la partida		25,72
				Costes indirectos	6%	1,54
				TOTAL PARTIDA		**27,26**
01.03.02.12	**Colocación placa de señalización de orientación**		**u**			
	Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,700	h	19,69	13,78	
A013M000	Ayudante montador/a	0,700	h	18,23	12,76	
BBM1Z010	Placa orien.o sit. p/señ.tráf.,acero galv.+pint. 55x70cm, acabada con lám. retrorrefl. cl. RA1	1,000	u	130,11	130,11	
%0200	Medios auxiliares	1,567	%	2,00	3,13	
				Suma la partida		159,78
				Costes indirectos	6%	9,59
				TOTAL PARTIDA		**169,37**

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02	**PUERTO MAÓ**					
02.01	**EM CRUCEROS**					
02.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
02.01.01.01	**Desmontaje de mostradores no accesibles**		**m**			
	Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".					
	En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	1,500	h	20,16	30,24	
A013M000	Ayudante montador/a	1,500	h	18,23	27,35	
%0200	Medios auxiliares	0,576	%	2,00	1,15	
	Suma la partida					58,74
	Costes indirectos			6%		3,52
	TOTAL PARTIDA					**62,26**
02.01.01.02	**Carga y transporte a vertedero (Mahón)**		**m3**			
	Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.					
	En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
C1311120	Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW	0,050	h	58,99	2,95	
C1501800	Camión transp.12 t	0,150	h	37,54	5,63	
B2RAZ066	Canón de transporte de escombro limpio a vertedero (Mahón)	2,400	t	11,50	27,60	
%0200	Medios auxiliares	0,362	%	2,00	0,72	
	Suma la partida					36,90
	Costes indirectos			6%		2,21
	TOTAL PARTIDA					**39,11**
02.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
02.01.02.01	**Suministro y colocación de barandilla**		**m**			
	Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,400	h	18,23	7,29	
A0140000	Peón/a	0,200	h	19,69	3,94	
BB15Z002	Barandilla formada por montantes planos de acero inox y de 50x5mm	1,000	m	575,00	575,00	
%0200	Medios auxiliares	5,983	%	2,00	11,97	
	Suma la partida					610,30
	Costes indirectos			6%		36,62
	TOTAL PARTIDA					**646,92**

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.02.02	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**		**m2**			
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,000	h	24,45	48,90	
A0140000	Peón/a	3,000	h	19,69	59,07	
B0111000	Agua	0,010	m3	2,04	0,02	
BBA1Z101	Baldosa con franja podotactiles del mismo material que las de las aceras existentes, a=1200 mm	0,750	m2	47,29	35,47	
B9E1S000	Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat.	0,350 x1,02	m2	17,28	6,17	
D0391311	Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caliza, horm.165l	0,030 x1,02	m3	101,12	3,09	
B051Z001	Lechada cemento 1/3 cem ii/b-p 32,5 n	0,001 x1,02	m3	106,59	0,11	
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	1,000	ud	0,94	0,94	
%0200	Medios auxiliares	1,538	%	2,00	3,08	
	Suma la partida					156,85
	Costes indirectos			6%		9,41
	TOTAL PARTIDA					**166,26**
02.01.02.03	**Instalación de bucle de inducción magnética**		**u**			
	Instalación de bucle de inducción magnética					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
EP7E1501	Bucle de inducción magnética	1,000	u	375,00	375,00	
%0200	Medios auxiliares	3,898	%	2,00	7,80	
	Suma la partida					397,63
	Costes indirectos			6%		23,86
	TOTAL PARTIDA					**421,49**
02.01.02.04	**Mostrador de atención al público accesible**		**u**			
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,500	h	24,45	61,13	
A0140000	Peón/a	2,500	h	19,69	49,23	
B1000100	Unidad de mostrador de atención al público accesible	1,000	u	812,50	812,50	
%0200	Medios auxiliares	9,229	%	2,00	18,46	
	Suma la partida					941,32
	Costes indirectos			6%		56,48
	TOTAL PARTIDA					**997,80**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.02.05	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m**			
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,500	h	20,16	10,08	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,250	h	18,23	4,56	
BB15Z056	Pasamanos AISI 316 acabado pulido	1,000	m	293,75	293,75	
%0200	Medios auxiliares	3,084	%	2,00	6,17	
	Suma la partida					314,56
	Costes indirectos			6%		18,87
	TOTAL PARTIDA					**333,43**
02.01.02.06	**Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m**			
A0120000	Oficial/a 1a	0,150	h	24,45	3,67	
A0140000	Peón/a	0,100	h	19,69	1,97	
B9VZU501	Tira de carborúndum antideslizante autoadhesiva para pavimentos	1,050	m	23,13	24,29	
C2007000	Pulidora	0,050	h	2,88	0,14	
%0200	Medios auxiliares	0,301	%	2,00	0,60	
	Suma la partida					30,67
	Costes indirectos			6%		1,84
	TOTAL PARTIDA					**32,51**
02.01.02.07	**Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**u**			
A0140000	Peón/a	0,300	h	19,69	5,91	
BBBAD004	Señal de vinilo adhesivo	1,000	u	37,50	37,50	
%0200	Medios auxiliares	0,434	%	2,00	0,87	
	Suma la partida					44,28
	Costes indirectos			6%		2,66
	TOTAL PARTIDA					**46,94**
02.01.02.08	**Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera** Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**u**			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
B013C000	Unidad de 4 asientos	1,000	u	625,00	625,00	
%0200	Medios auxiliares	6,398	%	2,00	12,80	
					Suma la partida.....	652,63
					Costes indirectos 6%	39,16
					TOTAL PARTIDA	**691,79**

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.02	**EM COS NOU**					
02.02.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
02.02.01.01	**Desmontaje de mostradores no accesibles**		**m**			
	Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".					
	En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	1,500	h	20,16	30,24	
A013M000	Ayudante montador/a	1,500	h	18,23	27,35	
%0200	Medios auxiliares	0,576	%	2,00	1,15	
	Suma la partida					58,74
	Costes indirectos			6%		3,52
	TOTAL PARTIDA					**62,26**
02.02.01.02	**Carga y transporte a vertedero (Mahón)**		**m3**			
	Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.					
	En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
C1311120	Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW	0,050	h	58,99	2,95	
C1501800	Camión transp.12 t	0,150	h	37,54	5,63	
B2RAZ066	Canón de transporte de escombro limpio a vertedero (Mahón)	2,400	t	11,50	27,60	
%0200	Medios auxiliares	0,362	%	2,00	0,72	
	Suma la partida					36,90
	Costes indirectos			6%		2,21
	TOTAL PARTIDA					**39,11**
02.02.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
02.02.02.01	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**		**m2**			
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,000	h	24,45	48,90	
A0140000	Peón/a	3,000	h	19,69	59,07	
B0111000	Agua	0,010	m3	2,04	0,02	
BBA1Z101	Baldosa con franja podotactiles del mismo material que las de las aceras existentes, a=1200 mm	0,750	m2	47,29	35,47	
B9E1S000	Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat.	0,350 x1,02	m2	17,28	6,17	
D0391311	Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caliza,horm.165l	0,030 x1,02	m3	101,12	3,09	
B051Z001	Lechada cemento 1/3 cem ii/b-p 32,5 n	0,001 x1,02	m3	106,59	0,11	
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	1,000	ud	0,94	0,94	
%0200	Medios auxiliares	1,538	%	2,00	3,08	

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Suma la partida.....		156,85
				Costes indirectos	6%	9,41
				TOTAL PARTIDA		**166,26**
02.02.02.02	**Instalación de bucle de inducción magnética**		**u**			
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
EP7E1501	Bucle de inducción magnética	1,000	u	375,00	375,00	
%0200	Medios auxiliares	3,898	%	2,00	7,80	
				Suma la partida.....		397,63
				Costes indirectos	6%	23,86
				TOTAL PARTIDA		**421,49**
02.02.02.03	**Mostrador de atención al público accesible**		**u**			
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,500	h	24,45	61,13	
A0140000	Peón/a	2,500	h	19,69	49,23	
B1000100	Unidad de mostrador de atención al público accesible	1,000	u	812,50	812,50	
%0200	Medios auxiliares	9,229	%	2,00	18,46	
				Suma la partida.....		941,32
				Costes indirectos	6%	56,48
				TOTAL PARTIDA		**997,80**
02.02.02.04	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**		**m**			
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo.En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,500	h	20,16	10,08	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,250	h	18,23	4,56	
BB15Z056	Pasamanos AISI 316 acabado pulido	1,000	m	293,75	293,75	
%0200	Medios auxiliares	3,084	%	2,00	6,17	
				Suma la partida.....		314,56
				Costes indirectos	6%	18,87
				TOTAL PARTIDA		**333,43**
02.02.02.05	**Vinilo adhesivo para señalización**		**u**			
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra					

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,300	h	19,69	5,91	
BBBAD004	Señal de vinilo adhesivo	1,000	u	37,50	37,50	
%0200	Medios auxiliares	0,434	%	2,00	0,87	
	Suma la partida.....					44,28
	Costes indirectos			6%		2,66
	TOTAL PARTIDA					**46,94**

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03	**PUERTO EIVISSA**					
03.01	**APB**					
03.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
03.01.01.01	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m**			
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	1,500	h	20,16	30,24	
A013M000	Ayudante montador/a	1,500	h	18,23	27,35	
%0200	Medios auxiliares	0,576	%	2,00	1,15	
	Suma la partida					58,74
	Costes indirectos			6%		3,52
	TOTAL PARTIDA					**62,26**
03.01.01.02	**Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio** Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**u**			
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	3,500	h	20,16	70,56	
A013M000	Ayudante montador/a	3,500	h	18,23	63,81	
%0200	Medios auxiliares	1,344	%	2,00	2,69	
	Suma la partida					137,06
	Costes indirectos			6%		8,22
	TOTAL PARTIDA					**145,28**
03.01.01.03	**Carga y transporte a vertedero (Ibiza)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m3**			
C1311120	Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW	0,050	h	58,99	2,95	
C1501800	Camión transp.12 t	0,150	h	37,54	5,63	
B2RAZ055	Canon de transporte de escombro limpio a vertedero (Ibiza)	2,400	t	11,50	27,60	
%0200	Medios auxiliares	0,362	%	2,00	0,72	
	Suma la partida					36,90
	Costes indirectos			6%		2,21
	TOTAL PARTIDA					**39,11**

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
03.01.02.01	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**		**m**			
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,500	h	20,16	10,08	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,250	h	18,23	4,56	
BB15Z056	Pasamanos AISI 316 acabado pulido	1,000	m	293,75	293,75	
%0200	Medios auxiliares	3,084	%	2,00	6,17	
	Suma la partida					314,56
	Costes indirectos			6%		18,87
	TOTAL PARTIDA					**333,43**
03.01.02.02	**Suministro y colocación de barandilla**		**m**			
	Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,400	h	18,23	7,29	
A0140000	Peón/a	0,200	h	19,69	3,94	
BB15Z002	Barandilla formada por montantes planos de acero inox y de 50x5mm	1,000	m	575,00	575,00	
%0200	Medios auxiliares	5,983	%	2,00	11,97	
	Suma la partida					610,30
	Costes indirectos			6%		36,62
	TOTAL PARTIDA					**646,92**
03.01.02.03	**Puerta abatible exterior**		**u**			
	Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,700	h	20,16	14,11	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
BAN3Z001	Premarco de madera	1,000	u	65,08	65,08	
BAF1Z001	Puerta abatible, 135x220 cm	1,000	u	1.062,50	1.062,50	
B7J50010	Masilla sella.,silicona neut. monocomp.	0,060	dm3	18,31	1,10	
B7J50090	Masilla sella.,poliuretano monocomp.	0,200	dm3	17,83	3,57	
BC17Z001	Vidrio 4+4 KSIF PLUS/12/4+4	1,400	m2	133,75	187,25	
%0200	Medios auxiliares	13,363	%	2,00	26,73	

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Suma la partida.....		1.363,07
				Costes indirectos	6%	81,78
				TOTAL PARTIDA		**1.444,85**
03.01.02.04	**Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**		**m**			
	Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0120000	Oficial/a 1a	0,150	h	24,45	3,67	
A0140000	Peón/a	0,100	h	19,69	1,97	
B9VZU501	Tira de carborúndum antideslizante autoadhesiva para pavimentos	1,050	m	23,13	24,29	
C2007000	Pulidora	0,050	h	2,88	0,14	
%0200	Medios auxiliares	0,301	%	2,00	0,60	
				Suma la partida.....		30,67
				Costes indirectos	6%	1,84
				TOTAL PARTIDA		**32,51**
03.01.02.05	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**		**m2**			
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,000	h	24,45	48,90	
A0140000	Peón/a	3,000	h	19,69	59,07	
B0111000	Agua	0,010	m3	2,04	0,02	
BBA1Z101	Baldosa con franja podotactiles del mismo material que las de las aceras existentes, a=1200 mm	0,750	m2	47,29	35,47	
B9E1S000	Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat.	0,350 x1,02	m2	17,28	6,17	
D0391311	Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caliza,horm.165l	0,030 x1,02	m3	101,12	3,09	
B051Z001	Lechada cemento 1/3 cem ii/b-p 32,5 n	0,001 x1,02	m3	106,59	0,11	
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	1,000	ud	0,94	0,94	
%0200	Medios auxiliares	1,538	%	2,00	3,08	
				Suma la partida.....		156,85
				Costes indirectos	6%	9,41
				TOTAL PARTIDA		**166,26**
03.01.02.06	**Vinilo adhesivo para señalización**		**u**			
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,300	h	19,69	5,91	
BBBAD004	Señal de vinilo adhesivo	1,000	u	37,50	37,50	
%0200	Medios auxiliares	0,434	%	2,00	0,87	
				Suma la partida.....		44,28
				Costes indirectos	6%	2,66

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	TOTAL PARTIDA					**46,94**
03.01.02.07	**Instalación de bucle de inducción magnética**		**u**			
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
EP7E1501	Bucle de inducción magnética	1,000	u	375,00	375,00	
%0200	Medios auxiliares	3,898	%	2,00	7,80	
%0200	Medios auxiliares	3,898	%	2,00	7,80	
	Suma la partida					397,63
	Costes indirectos			6%		23,86
	TOTAL PARTIDA					**421,49**
03.01.02.08	**Mostrador de atención al público accesible**		**u**			
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,500	h	24,45	61,13	
A0140000	Peón/a	2,500	h	19,69	49,23	
B1000100	Unidad de mostrador de atención al público accesible	1,000	u	812,50	812,50	
%0200	Medios auxiliares	9,229	%	2,00	18,46	
	Suma la partida					941,32
	Costes indirectos			6%		56,48
	TOTAL PARTIDA					**997,80**
03.01.02.09	**Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera**		**u**			
	Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
B013C000	Unidad de 4 asientos	1,000	u	625,00	625,00	
%0200	Medios auxiliares	6,398	%	2,00	12,80	
	Suma la partida					652,63
	Costes indirectos			6%		39,16
	TOTAL PARTIDA					**691,79**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02	**ESTACIÓN MARÍTIMA**					
03.02.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
03.02.01.01	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m**			
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	1,500	h	20,16	30,24	
A013M000	Ayudante montador/a	1,500	h	18,23	27,35	
%0200	Medios auxiliares	0,576	%	2,00	1,15	
	Suma la partida					58,74
	Costes indirectos			6%		3,52
	TOTAL PARTIDA					**62,26**
03.02.01.02	**Carga y transporte a vertedero (Ibiza)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m3**			
C1311120	Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW	0,050	h	58,99	2,95	
C1501800	Camión transp.12 t	0,150	h	37,54	5,63	
B2RAZ055	Canón de transporte de escombro limpio a vertedero (Ibiza)	2,400	t	11,50	27,60	
%0200	Medios auxiliares	0,362	%	2,00	0,72	
	Suma la partida					36,90
	Costes indirectos			6%		2,21
	TOTAL PARTIDA					**39,11**
03.02.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
03.02.02.01	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m2**			
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,000	h	24,45	48,90	
A0140000	Peón/a	3,000	h	19,69	59,07	
B0111000	Agua	0,010	m3	2,04	0,02	
BBA1Z101	Baldosa con franja podotactiles del mismo material que las de las aceras existentes, a=1200 mm	0,750	m2	47,29	35,47	
B9E1S000	Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat.	0,350 x1,02	m2	17,28	6,17	
D0391311	Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caliza,horm.165l	0,030 x1,02	m3	101,12	3,09	
B051Z001	Lechada cemento 1/3 cem ii/b-p 32,5 n	0,001 x1,02	m3	106,59	0,11	
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	1,000	ud	0,94	0,94	
%0200	Medios auxiliares	1,538	%	2,00	3,08	

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Suma la partida.....		156,85
				Costes indirectos	6%	9,41
				TOTAL PARTIDA		**166,26**
03.02.02.02	**Instalación de bucle de inducción magnética**		**u**			
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
EP7E1501	Bucle de inducción magnética	1,000	u	375,00	375,00	
%0200	Medios auxiliares	3,898	%	2,00	7,80	
				Suma la partida.....		397,63
				Costes indirectos	6%	23,86
				TOTAL PARTIDA		**421,49**
03.02.02.03	**Mostrador de atención al público accesible**		**u**			
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,500	h	24,45	61,13	
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,500	h	24,45	61,13	
A0140000	Peón/a	2,500	h	19,69	49,23	
B1000100	Unidad de mostrador de atención al público accesible	1,000	u	812,50	812,50	
%0200	Medios auxiliares	9,229	%	2,00	18,46	
				Suma la partida.....		941,32
				Costes indirectos	6%	56,48
				TOTAL PARTIDA		**997,80**
03.02.02.04	**Colocación placa de señalización de orientación**		**u**			
	Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,700	h	19,69	13,78	
A013M000	Ayudante montador/a	0,700	h	18,23	12,76	
BBM1Z010	Placa orien.o sit. p/señ.tráf.,acero galv.+pint. 55x70cm, acabada con lám. retrorrefl. cl. RA1	1,000	u	130,11	130,11	
%0200	Medios auxiliares	1,567	%	2,00	3,13	
				Suma la partida.....		159,78
				Costes indirectos	6%	9,59
				TOTAL PARTIDA		**169,37**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03	**EDIFICIO MARTILLO**					
03.03.01	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
03.03.01.01	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**		**m**			
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,500	h	20,16	10,08	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,250	h	18,23	4,56	
BB15Z056	Pasamanos AISI 316 acabado pulido	1,000	m	293,75	293,75	
%0200	Medios auxiliares	3,084	%	2,00	6,17	
	Suma la partida					314,56
	Costes indirectos			6%		18,87
	TOTAL PARTIDA					**333,43**
03.03.01.02	**Vinilo adhesivo para señalización**		**u**			
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,300	h	19,69	5,91	
BBBAD004	Señal de vinilo adhesivo	1,000	u	37,50	37,50	
%0200	Medios auxiliares	0,434	%	2,00	0,87	
	Suma la partida					44,28
	Costes indirectos			6%		2,66
	TOTAL PARTIDA					**46,94**
03.03.01.03	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**		**m2**			
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,000	h	24,45	48,90	
A0140000	Peón/a	3,000	h	19,69	59,07	
B0111000	Agua	0,010	m3	2,04	0,02	
BBA1Z101	Baldosa con franja podotactiles del mismo material que las de las aceras existentes, a=1200 mm	0,750	m2	47,29	35,47	
B9E1S000	Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat.	0,350 x1,02	m2	17,28	6,17	
D0391311	Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caliza,horm.165l	0,030 x1,02	m3	101,12	3,09	
B051Z001	Lechada cemento 1/3 cem ii/b-p 32,5 n	0,001 x1,02	m3	106,59	0,11	
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	1,000	ud	0,94	0,94	
%0200	Medios auxiliares	1,538	%	2,00	3,08	
	Suma la partida					156,85
	Costes indirectos			6%		9,41

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	TOTAL PARTIDA					**166,26**
03.03.01.04	**Marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor**		**m**			
	Suministro y colocación de marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,300	h	19,69	5,91	
BAP32165	Marco ascensor	1,000	m	22,50	22,50	
%0200	Medios auxiliares	0,284	%	2,00	0,57	
	Suma la partida					28,98
	Costes indirectos			6%		1,74
	TOTAL PARTIDA					**30,72**

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04	**PUERTO LA SAVINA**					
04.01	**ESTACIÓN MARÍTIMA**					
04.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
04.01.01.01	**Desmontaje de mostradores no accesibles**		**m**			
	Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	1,500	h	20,16	30,24	
A013M000	Ayudante montador/a	1,500	h	18,23	27,35	
%0200	Medios auxiliares	0,576	%	2,00	1,15	
	Suma la partida					58,74
	Costes indirectos			6%		3,52
	TOTAL PARTIDA					**62,26**
04.01.01.02	**Carga y transporte a vertedero (La Savina)**		**m3**			
	Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
C1311120	Pala cargadora s/,mediana,s/,neumáticos 117kW	0,050	h	58,99	2,95	
C1501800	Camión transp.12 t	0,150	h	37,54	5,63	
C414Z001	Barcaza o pontona	2,000	h	234,38	468,76	
B2RAZ055	Canon de transporte de escombro limpio a vertedero (Ibiza)	2,400	t	11,50	27,60	
%0200	Medios auxiliares	5,049	%	2,00	10,10	
	Suma la partida					515,04
	Costes indirectos			6%		30,90
	TOTAL PARTIDA					**545,94**
04.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
04.01.02.01	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**		**m**			
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,500	h	20,16	10,08	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,250	h	18,23	4,56	
BB15Z056	Pasamanos AISI 316 acabado pulido	1,000	m	293,75	293,75	
%0200	Medios auxiliares	3,084	%	2,00	6,17	
	Suma la partida					314,56
	Costes indirectos			6%		18,87
	TOTAL PARTIDA					**333,43**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.02.02	**Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m**			
A012F000	Oficial/a 1a cerrajero/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013F000	Ayudante cerrajero/a	0,400	h	18,23	7,29	
A0140000	Peón/a	0,200	h	19,69	3,94	
BB15Z002	Barandilla formada por montantes planos de acero inox y de 50x5mm	1,000	m	575,00	575,00	
%0200	Medios auxiliares	5,983	%	2,00	11,97	
	Suma la partida					610,30
	Costes indirectos			6%		36,62
	TOTAL PARTIDA					**646,92**
04.01.02.03	**Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m**			
A0120000	Oficial/a 1a	0,150	h	24,45	3,67	
A0140000	Peón/a	0,100	h	19,69	1,97	
B9VZU501	Tira de carborúndum antideslizante autoadhesiva para pavimentos	1,050	m	23,13	24,29	
C2007000	Pulidora	0,050	h	2,88	0,14	
%0200	Medios auxiliares	0,301	%	2,00	0,60	
	Suma la partida					30,67
	Costes indirectos			6%		1,84
	TOTAL PARTIDA					**32,51**
04.01.02.04	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.		**m2**			
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,000	h	24,45	48,90	
A0140000	Peón/a	3,000	h	19,69	59,07	
B0111000	Agua	0,010	m3	2,04	0,02	
BBA1Z101	Baldosa con franja podotactiles del mismo material que las de las aceras existentes, a=1200 mm	0,750	m2	47,29	35,47	
B9E1S000	Loseta color+tacos 20x20x4cm,p/paso peat.	0,350 x1,02	m2	17,28	6,17	
D0391311	Arena-cemento s/adit.,200kg/m3 pórtland+caliza,horm.165l	0,030 x1,02	m3	101,12	3,09	
B051Z001	Lechada cemento 1/3 cem ii/b-p 32,5 n	0,001 x1,02	m3	106,59	0,11	
B051Z090	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	1,000	ud	0,94	0,94	
%0200	Medios auxiliares	1,538	%	2,00	3,08	
	Suma la partida					156,85
	Costes indirectos			6%		9,41
	TOTAL PARTIDA					**166,26**

IDOM

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.02.05	**Vinilo adhesivo para señalización**		**u**			
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0140000	Peón/a	0,300	h	19,69	5,91	
A0140000	Peón/a	0,300	h	19,69	5,91	
BBBAD004	Señal de vinilo adhesivo	1,000	u	37,50	37,50	
%0200	Medios auxiliares	0,434	%	2,00	0,87	
	Suma la partida					44,28
	Costes indirectos			6%		2,66
	TOTAL PARTIDA					**46,94**
04.01.02.06	**Instalación de bucle de inducción magnética**		**u**			
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A012M000	Oficial/a 1a montador/a	0,600	h	20,16	12,10	
A013M000	Ayudante montador/a	0,150	h	18,23	2,73	
EP7E1501	Bucle de inducción magnética	1,000	u	375,00	375,00	
%0200	Medios auxiliares	3,898	%	2,00	7,80	
	Suma la partida					397,63
	Costes indirectos			6%		23,86
	TOTAL PARTIDA					**421,49**
04.01.02.07	**Mostrador de atención al público accesible**		**u**			
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
A0121000	Oficial/a 1a albañilería	2,500	h	24,45	61,13	
A0140000	Peón/a	2,500	h	19,69	49,23	
B1000100	Unidad de mostrador de atención al público accesible	1,000	u	812,50	812,50	
%0200	Medios auxiliares	9,229	%	2,00	18,46	
	Suma la partida					941,32
	Costes indirectos			6%		56,48
	TOTAL PARTIDA					**997,80**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05	**SEGURIDAD Y SALUD**					
05.01	**Partida de abono integro en Seguridad y Salud** Partida de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el documento adjunto correspondiente.		**u**			
				Sin descomposición		4.952,83
				Costes indirectos	6%	297,17
				TOTAL PARTIDA		**5.250,00**

ANEJO Nº 5: GESTIÓN DE RESIDUOS

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

IDOM

ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS EN EL PERIODO DE 2023 Y 2024

Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

P.O.74.24

Anejo 5. Gestión de residuos

Julio de 2024

Encargo P/103731

TABLA DE REVISIONES

Edición	Fecha	Redactado	Revisado	Destinatario
1	02/10/2023	ACA	CTF	APB – Autoridad Portuaria de Baleares
2	24/07/2024	AGA	CTF	APB – Autoridad Portuaria de Baleares

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES 3

2. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 3

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 3

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 3

4.1. Estimación de las cantidades totales 3

4.1.1. Residuos procedentes de la demolición 3

4.2. Estimación de las cantidades por tipo de RCD 4

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS 4

5.1.1. Medidas para la prevención de generación de residuos en obra 5

5.1.2. Medidas a adoptar para la prevención de RCD 5

6. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 6

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 7

8. PLIEGO DE CONDICIONES 7

8.1. Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008) 7

8.2. Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008) 8

8.3. Para el Director Facultativo 9

8.4. Para el Personal de obra 9

8.5. Para el Gestor de Residuos en general 9

8.6. Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización 10

8.7. Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ 10

8.8. Para el Tratamiento de residuos mediante plantas móviles en centros fijos de valorización o eliminación de residuos 11

8.9. Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 11

9. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN 12

9.1. Eliminación 12

1. ANTECEDENTES

El presente anejo tiene por objeto establecer los criterios para la gestión de los residuos de construcción y demolición generados por la ejecución del Proyecto de **"Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina" (P.O.74.24).**

En el presente anejo se incluye una estimación del volumen de residuos que se prevé generar en la obra, y servirá de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del constructor. En el citado plan se desarrollarán y completarán las previsiones contenidas en este Anejo.

Con la redacción del presente anejo se pretende velar por el cumplimiento de la normativa específica vigente, fomentando la prevención de residuos de obra, la reutilización, el reciclado y otras formas de valoración, asegurando un tratamiento adecuado con el objeto de alcanzar un desarrollo sostenible de la actividad de la construcción.

2. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO

El proyecto se redacta a petición de la Autoridad Portuaria de Balears, con N.I.F. Q0767004E, con domicilio social, Moll Vell, 3-5 CP 07012 de Palma de Mallorca.

Las obras se realizarán en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se han seguido las prescripciones de las siguientes normativas:

- Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

4.1. Estimación de las cantidades totales

4.1.1. Residuos procedentes de la demolición

Los residuos procedentes de demolición proceden de las siguientes actuaciones:

- Demolición de estructuras de hormigón
- Desmontaje de carpintería
- Desmontaje de puerta de vidrio

Se procede, a continuación, a evaluar las cantidades generadas de cada tipo de residuo:

Tipo de Residuo	Zona	Volumen real (m3)	Densidad (tn/m3)	Peso (tn)	Esponjamiento	Volumen total RCDs (m3)
Demolición de estructuras de hormigón (Pavimento, acera y mostradores)	*Puerto de Alcudia*	13,39	2,4	32,11	1,4	18,73
	Puerto de Maó	10,68		25,63		14,95
	Puerto de Eivissa	10,24		24,58		14,34
	Puerto de La Savina	7,20		17,28		10,08
Madera (carpinterías)	*Puerto de Alcudia*	1,60	0,8	1,28	1,4	2,24
	Puerto de Eivissa	0,16		0,13		0,22
Vidrio (puertas de acceso)	*Puerto de Alcudia*	0,02	2,5	0,04	1,4	0,02

4.2. Estimación de las cantidades por tipo de RCD

Codificados según el Listado Europeo de Residuos (LER) publicado por Ley 7/2022 del Ministerio de Medio Ambiente de 8 de abril, o sus modificaciones posteriores:

Código LER	Denominación de residuos	Zona	Volumen total RCDs (m3)	Peso total (tn)
Residuos de la construcción y demolición				
17.01.01	*Hormigón*	*Puerto de Alcudia*	18,73	32,11
		Puerto de Maó	14,95	25,63
		Puerto de Eivissa	14,34	24,58
		Puerto de La Savina	10,08	17,28
17.02.01	*Madera*	*Puerto de Alcudia*	2,24	1,28
		Puerto de Eivissa	0,22	0,13
10.11.11	*Vidrio*	*Puerto de Alcudia*	0,02	0,04

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista medioambiental como económico.

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la reciclabilidad de los productos, que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD.

5.1.1. Medidas para la prevención de generación de residuos en obra

El Contratista deberá minimizar los residuos generados durante la realización de los trabajos descritos en el presente expediente, haciendo una separación en origen de los diferentes residuos y gestionándolos adecuadamente. Se enumeran a continuación una lista no exhaustiva de actuaciones tendentes a minimizar la generación de residuos en la obra:

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por el Director Facultativo.
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar su vida útil
Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados

5.1.2. Medidas a adoptar para la prevención de RCD

A continuación, se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de los diferentes residuos de construcción y demolición que se prevé generar en la obra.

Madera

Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad.
Almacenar correctamente los materiales pata protegerlos de la intemperie y evitar su deterioro y transformación en residuo.
Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos elementos que tengan opciones de valorización.
Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado
Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños.
Para tratar la madera, elegir alternativas a los protectores químicos.

Plásticos, papel y cartón

Comprar evitando envoltorios innecesarios.
Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir la producción de residuos de envoltorios.
Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos.
Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización.

Productos líquidos

Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin.
Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y vertidos por vuelcos accidentales.
Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro

Reducir el uso de disolventes.
Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes.
Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura sobrante y, siempre que sea posible, reutilizarla

6. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS

El Real Decreto 105/2008 establece, en el artículo 5.5, la obligatoriedad de separación en origen de los residuos de construcción y demolición cuando, se superen de forma individualizada, las siguientes cantidades:

Hormigón	80 Tn
Ladrillos, tejas, cerámicos	40 Tn
Metal	2 Tn
Madera	1 Tn
Vidrio	1 Tn
Plástico	0,5 Tn
Papel y cartón	0,5 Tn
Residuos peligrosos	En todos los casos

Por razones de eficiencia, se podrán establecer criterios de separación, aún con cantidades inferiores, de diferentes fracciones.

Los posibles tratamientos de los residuos generados será de Separación (obligatoria para los residuos cuyas cantidades sobrepasen los pesos anteriormente señalados) o Ninguna (los residuos no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”.

El Contratista separará en obra los siguientes residuos, para lo cual tomará las medidas oportunas para garantizar su separación en origen mediante contenedores o sacas especiales. Las fracciones que no deban separarse se tratarán en gestor autorizado como “todo en uno”:

Código LER	Denominación de residuos	Zona	Peso total (tn)	Operación en la obra
17.01.01	*Hormigón*	*Puerto de Alcudia*	32,11	Separación
		Puerto de Maó	25,63	Separación
		Puerto de Eivissa	24,58	Separación
		Puerto de La Savina	17,28	Separación
17.02.01	*Madera*	*Puerto de Alcudia*	1,28	Separación
		Puerto de Eivissa	0,13	Separación
10.11.11	*Vidrio*	*Puerto de Alcudia*	0,04	Separación

Los residuos generados en la obra se acopiarán temporalmente, con medios apropiados para su acopio sin generar riesgos a los propios actores de la obra o a terceros, en una zona especialmente habilitada para ello y que estará perfectamente señalizada y balizada. Esta zona de vertido temporal tendrá, a su vez, varias zonas de vertido, una para cada fracción a separar.

Una vez a la semana, o con mayor periodicidad si así lo exige el ritmo de producción de residuos, se retirarán a vertedero o a gestor autorizado, según la naturaleza de los mismos.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS

Se definirán a continuación las operaciones que se llevarán a cabo y cuál va ser el destino de los RCDs que se produzcan en la obra.

Las operaciones más habituales de Valorización son el Reciclado (se elegirá "Reciclado") o la Utilización como combustible (se elegirá "Combustible"). Pero si se desconoce el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, se elegirá la opción genérica "Valorización en instalación autorizada".

Si el residuo va a ser eliminado directamente en vertedero, se marcará la opción "Tratamiento en vertedero autorizado". La Ley 7/2022 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización.

Código LER	Denominación de residuos	Zona	Volumen total RCDs (m3)	Peso total (tn)	Operación en la obra
17.01.01	*Hormigón*	*Puerto de Alcudia*	18,73	32,11	Tratamiento en gestor autorizado
		Puerto de Maó	14,95	25,63	Tratamiento en gestor autorizado
		Puerto de Eivissa	14,34	24,58	Tratamiento en gestor autorizado
		Puerto de La Savina	10,08	17,28	Tratamiento en gestor autorizado
17.02.01	*Madera*	*Puerto de Alcudia*	2,24	1,28	Tratamiento en gestor autorizado
		Puerto de Eivissa	0,22	0,13	Tratamiento en gestor autorizado
10.11.11	*Vidrio*	*Puerto de Alcudia*	0,02	0,04	Tratamiento en gestor autorizado

8. PLIEGO DE CONDICIONES

8.1. Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008)

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, el cual ha de contener como mínimo:

- Estimación de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Ley 7/2022
- Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto.
- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de los residuos que se generen, así como las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
- Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra.
- Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenaje, manejo, separación, y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra.
- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo independiente.
- En obras de demolición, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
- Disponer de la documentación, que acredite que los residuos realmente generados en la demolición han sido gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

- Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonómica y en los términos que ésta establezca, la fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia, en relación con los residuos generados en la demolición.

8.2. Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestión de los residuos.

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la demolición, todas las operaciones en relación a la gestión de los residuos que se generarán. El Plan, una vez aprobado por el Director Facultativo y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

- Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en obra, destinándose preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

- Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el derribo, en el que figuren al menos: la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, el número de licencia, la cantidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la Ley 7/2022 y la identificación del gestor de las operaciones de destino. Cuando dicho gestor, solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento anteriormente citado, deberá constar también la identificación del gestor de valorización o eliminación posterior al que se destinarán los residuos.

En cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relación a la cesión de los residuos del poseedor al gestor se regirá por lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de Abril.

- Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, que impida la posterior valorización o eliminación.

- Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en la normativa.

- Las obligaciones de separación previstas en la Ley 7/2022 serán exigibles en los términos indicados.

- Cuando por falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha operación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de residuos a un gestor, en una instalación de tratamiento externa a la obra, obteniendo del mismo la documentación acreditativa de dicha operación.
- Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados en las obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión. Deberá mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

8.3. Para el Director Facultativo

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos.
- Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el caso de que ésta se decida realizar in situ.

8.4. Para el Personal de obra

Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del contratista o poseedor de residuos. A continuación se indican las obligaciones, que entendemos deben ponerse en conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la misma.

- Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia práctica en la aplicación de dichas prescripciones para mejorarlas o proponer unas nuevas).
- Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así como su recorrido hasta el mismo.
- Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se mezclen con otros y resulten contaminados.
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se utilizarán, en función de las características de los residuos que se depositarán, cumpliendo unas mínimas pautas necesarias, para que el proceso sea lo más sencillo posible:
    - Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar en un determinado contenedor o recipiente. La información debe ser clara y concisa.
    - Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un material resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que quede garantizada una razonable durabilidad.
- No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serán transportados, dado que son más difíciles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caídas de residuos.
- Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de forma que quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir.
- Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de los residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes, de todos los movimiento que se realicen de cada tipo de residuos.
- No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que dicha acción puede provocar un accidente.

8.5. Para el Gestor de Residuos en general

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento de los mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la autorización por la legislación de residuo, llevar un registro en el que, como mínimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y metro cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de febrero, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como la cantidades , en toneladas y metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá llevar un registro, en el que como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados (expresada en m3 y Tn), el tipo de residuos codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Ley 7/2022, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una operación de gestión anterior, el método de gestión aplicado, así como las cantidades (expresadas en m3 y Tn), y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
- Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregarle (al poseedor o al gestor que le entregue los residuos) los certificados de la operación de valorización o de la eliminación subsiguiente a la que fueron destinados.

8.6. Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 7/2022, de 8 de Abril.
- La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se otorgará por un plazo determinado de tiempo, renovándose por periodos sucesivos.
- Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y nº de licencia de la obra de procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregar al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

8.7. Para el Gestor de Residuos en actividades de valorización in situ

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Las actividades de valorización de residuos “in situ” se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. En particular, el Director Facultativo deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.
- Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje ni los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación vigente.

8.8. Para el Tratamiento de residuos mediante plantas móviles en centros fijos de valorización o eliminación de residuos

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Para dicha actividad deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.

8.9. Para las Actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
- La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de construcción y demolición) en poblaciones aisladas que cumplan con lo contenido en el Real Decreto 646/2020, por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de los residuos generados únicamente en esa población aislada.

9. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN

9.1. Eliminación

Tipo de Residuo	Zona	Peso (tn)	Coste (€/tn)	Importe (€)
Hormigón	Puerto de Alcudia	32,11	43,35	1.392,06
	Puerto de Maó	25,63	11,50	294,77
	Puerto de Eivissa	24,58	11,50	282,68
	Puerto de La Savina	17,28	11,50	198,72
Madera	Puerto de Alcudia	1,28	43,35	55,49
	Puerto de Eivissa	0,13	11,50	1,47
Vidrio	Puerto de Alcudia	0,04	43,35	1,73

Presupuesto de Ejecución Material	**2.226,92 €**

En Palma de Mallorca, julio de 2024
El Autor del Proyecto

Carlos Torralba Feliu
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Nº Colegiado: 31913

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS

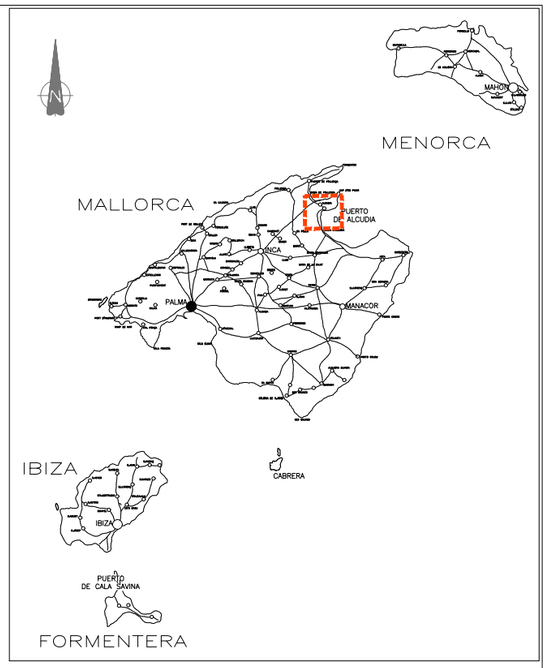

ÍNDICE DE PLANOS		
NÚM.	TÍTULO	HOJAS
001	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	4
002	ACTUACIONES	11
003	DETALLES	2
	TOTAL PLANOS	17

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 INDICADAS, A3 INDICADAS

PLANO Nº : 001

HOJA Nº : 1 de 4

DENOMINACION PLANO :

SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE. ALCUDIA

FECHA: JULIO 2024

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

VºBº
EL DIRECTOR

ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

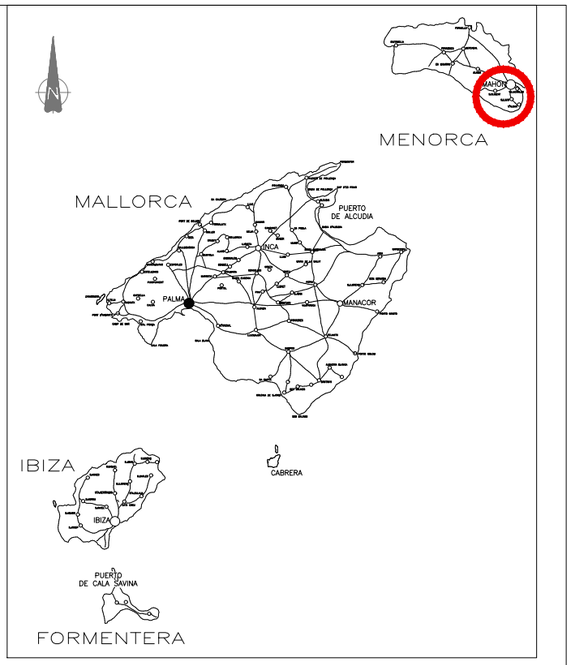

ÍNDICE DE PLANOS

NÚM.	TÍTULO	HOJAS
001	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	4
002	ACTUACIONES	11
003	DETALLES	2
	TOTAL PLANOS	17

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA

PO. : 74.24

ESCALAS:

A1 INDICADAS
A3 INDICADAS

PLANO Nº :

001

DENOMINACION PLANO :

SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE. MAÓ

FECHA

JULIO 2024

HOJA Nº :

2 de 4

DIBUJADO POR :

IDOM
Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR

ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

A1 E 1:10.000
A3 E 1:20.000

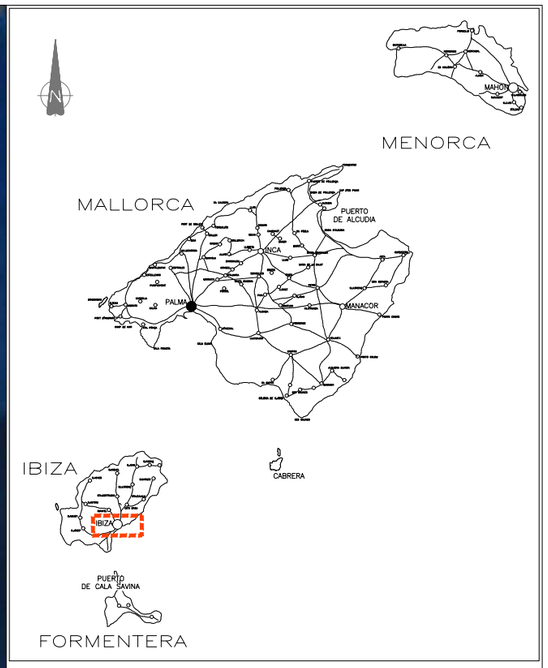

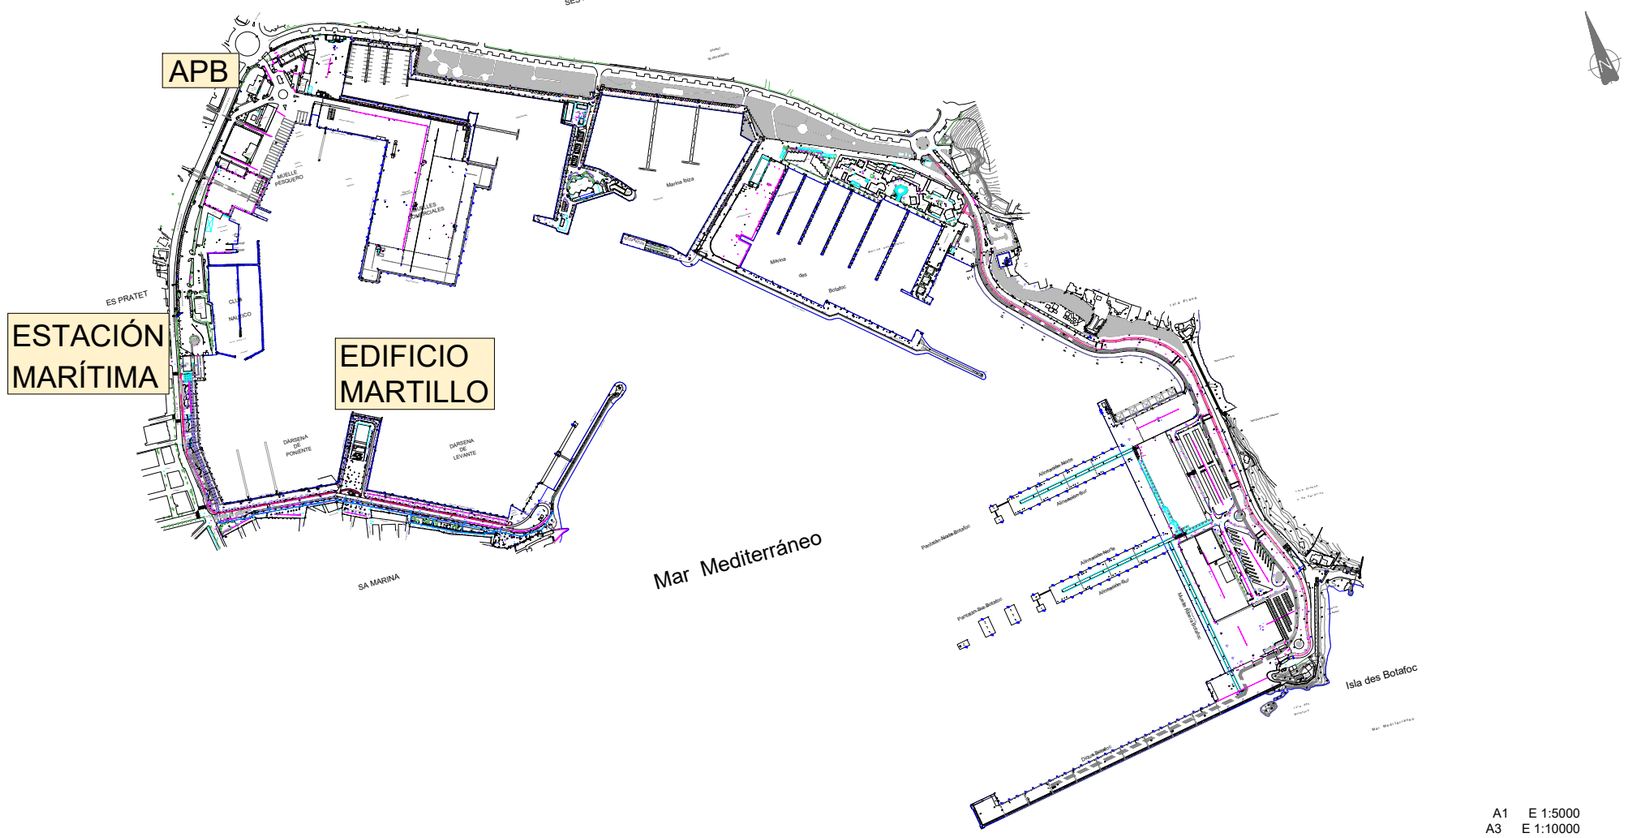

ÍNDICE DE PLANOS		
NÚM.	TÍTULO	HOJAS
001	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	4
002	ACTUACIONES	11
003	DETALLES	2
	TOTAL PLANOS	17

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 INDICADAS, A3 INDICADAS

PLANO Nº : 001

DENOMINACION PLANO : SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE. EIVISSA

HOJA Nº : 3 de 4

FECHA: JULIO 2024

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR

ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

A1 E 1:1500
A3 E 1:3000

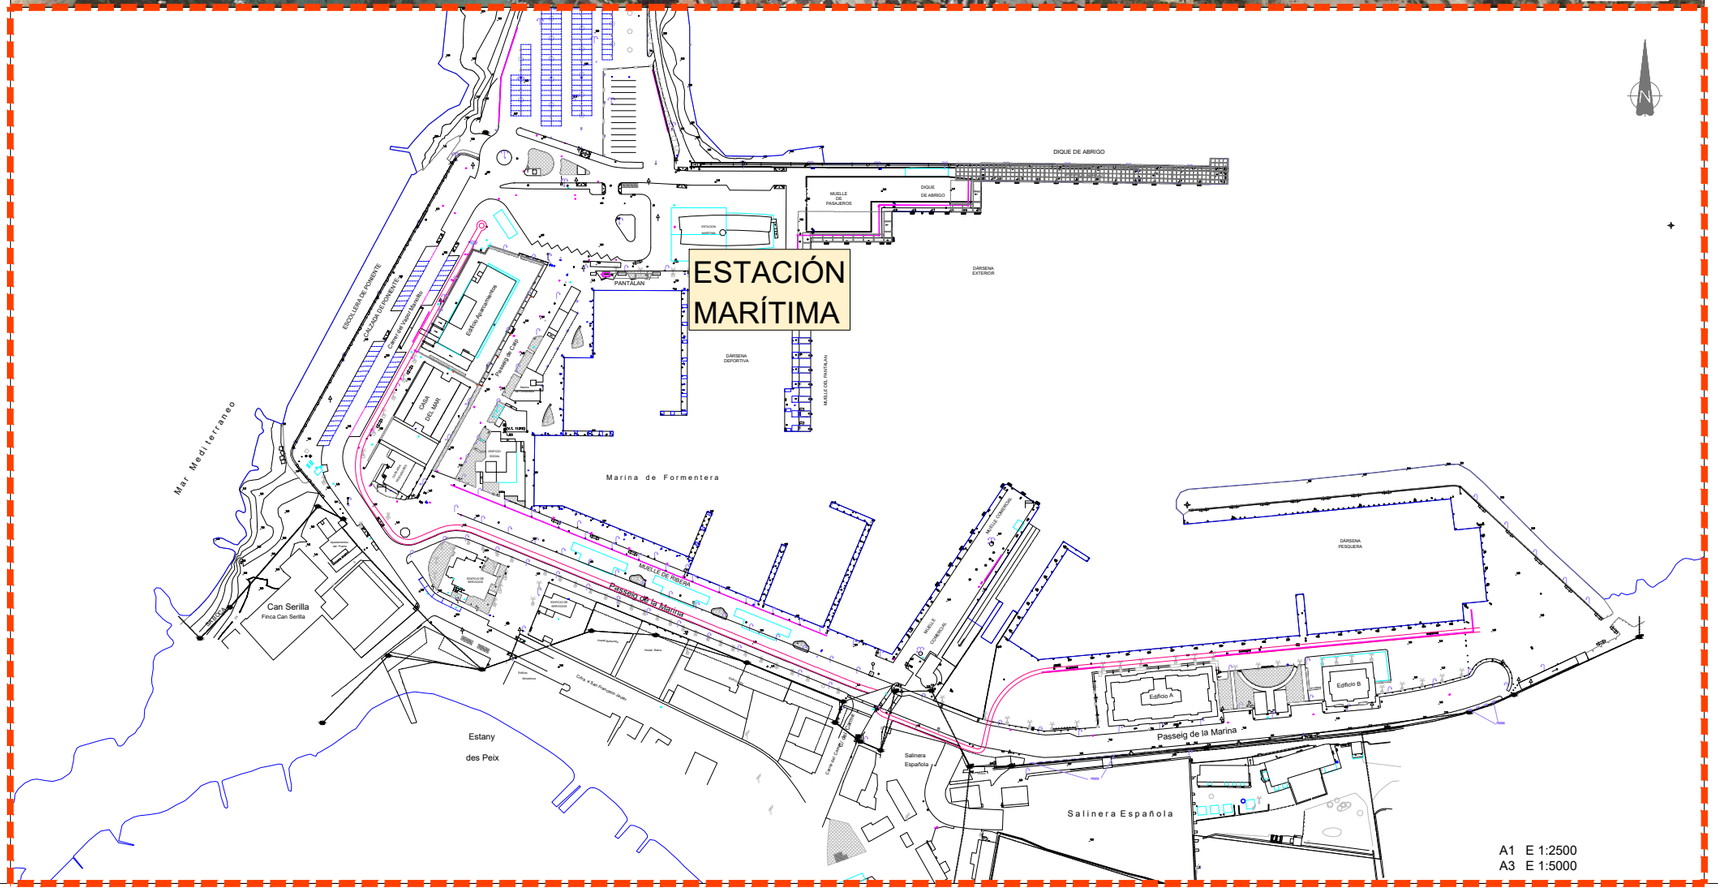

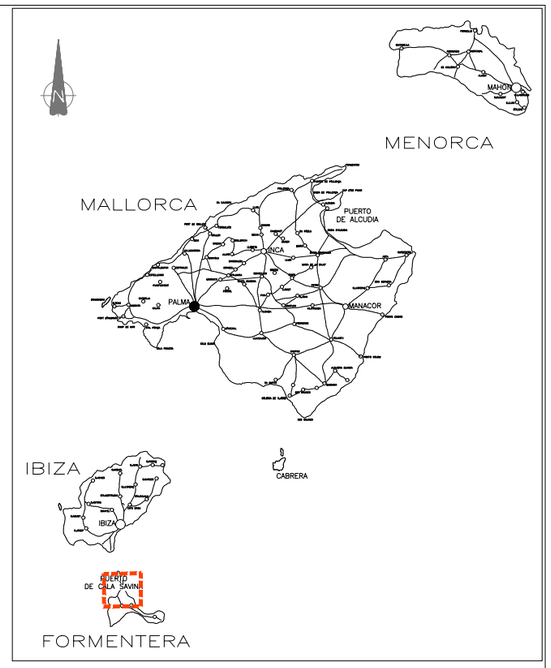

ÍNDICE DE PLANOS		
NÚM.	TÍTULO	HOJAS
001	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	4
002	ACTUACIONES	11
003	DETALLES	2
	TOTAL PLANOS	17

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 INDICADAS, A3 INDICADAS

PLANO Nº : 001

DENOMINACION PLANO : SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E ÍNDICE. SAVINA

FECHA: JULIO 2024

HOJA Nº : 4 de 4

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR

ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

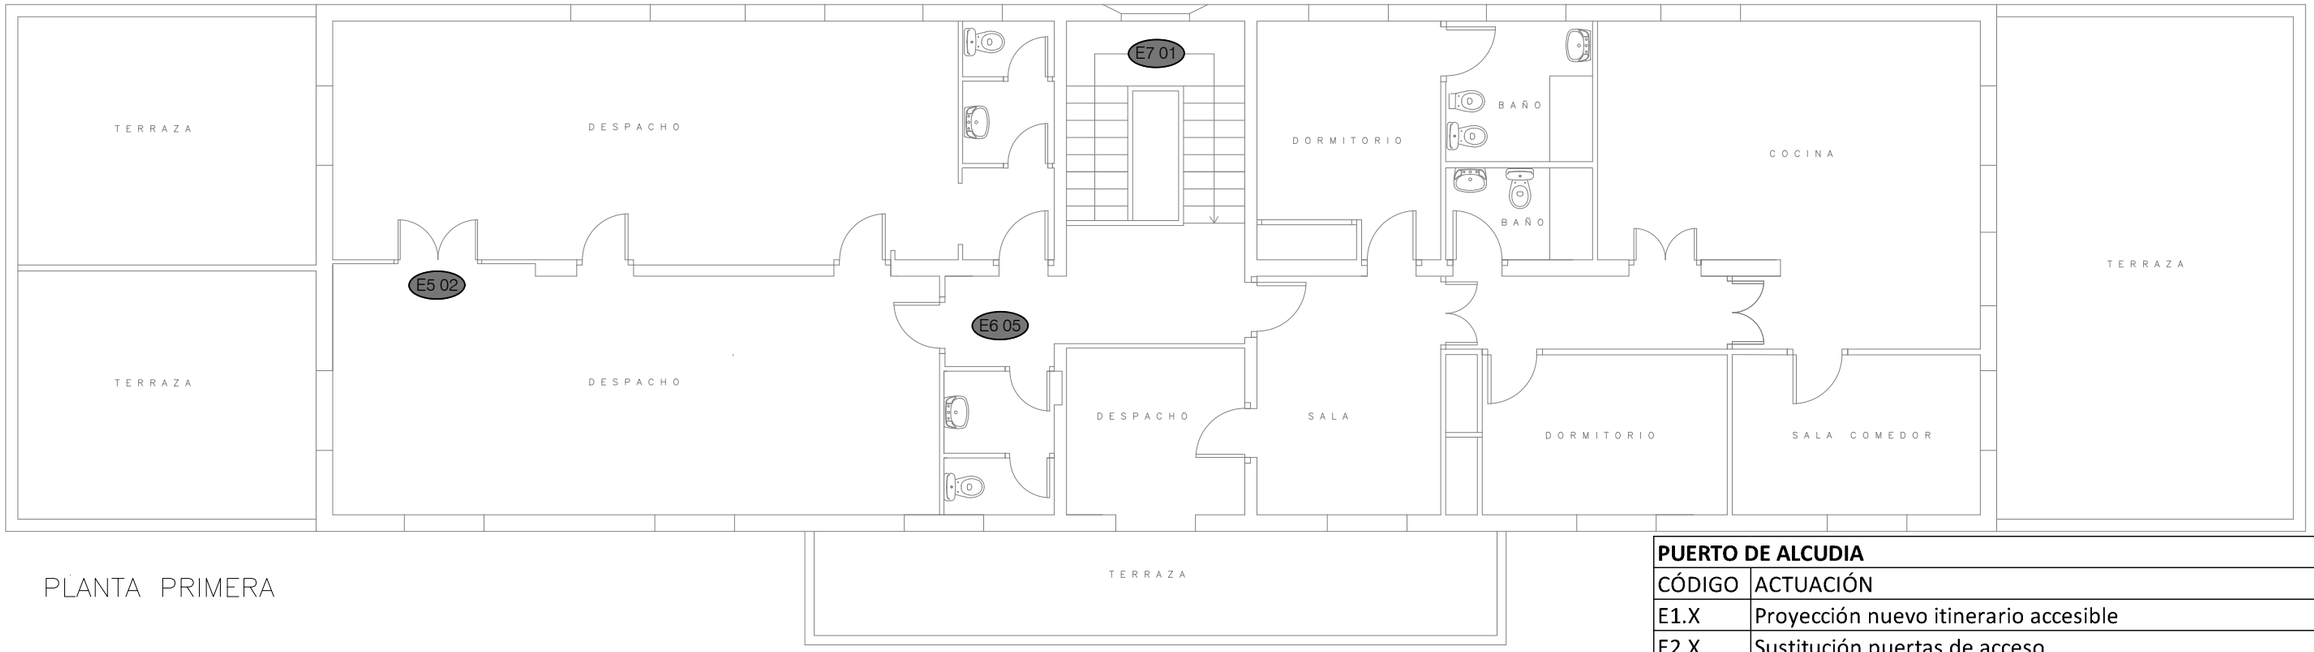

PLANTA PRIMERA

PUERTO DE ALCUDIA	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E1.X	Proyección nuevo itinerario accesible
E2.X	Sustitución puertas de acceso
E3.X	Adecuación escalón vestíbulo
E5.X	Adecuaciónde puertas de paso
E6.X	Adecuación pasillos y áreas de conexión
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E10.X	Señalización e ilumación escaleras mecánicas
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos
E22.X	Señalización e ilumación controles de paso y seguridad

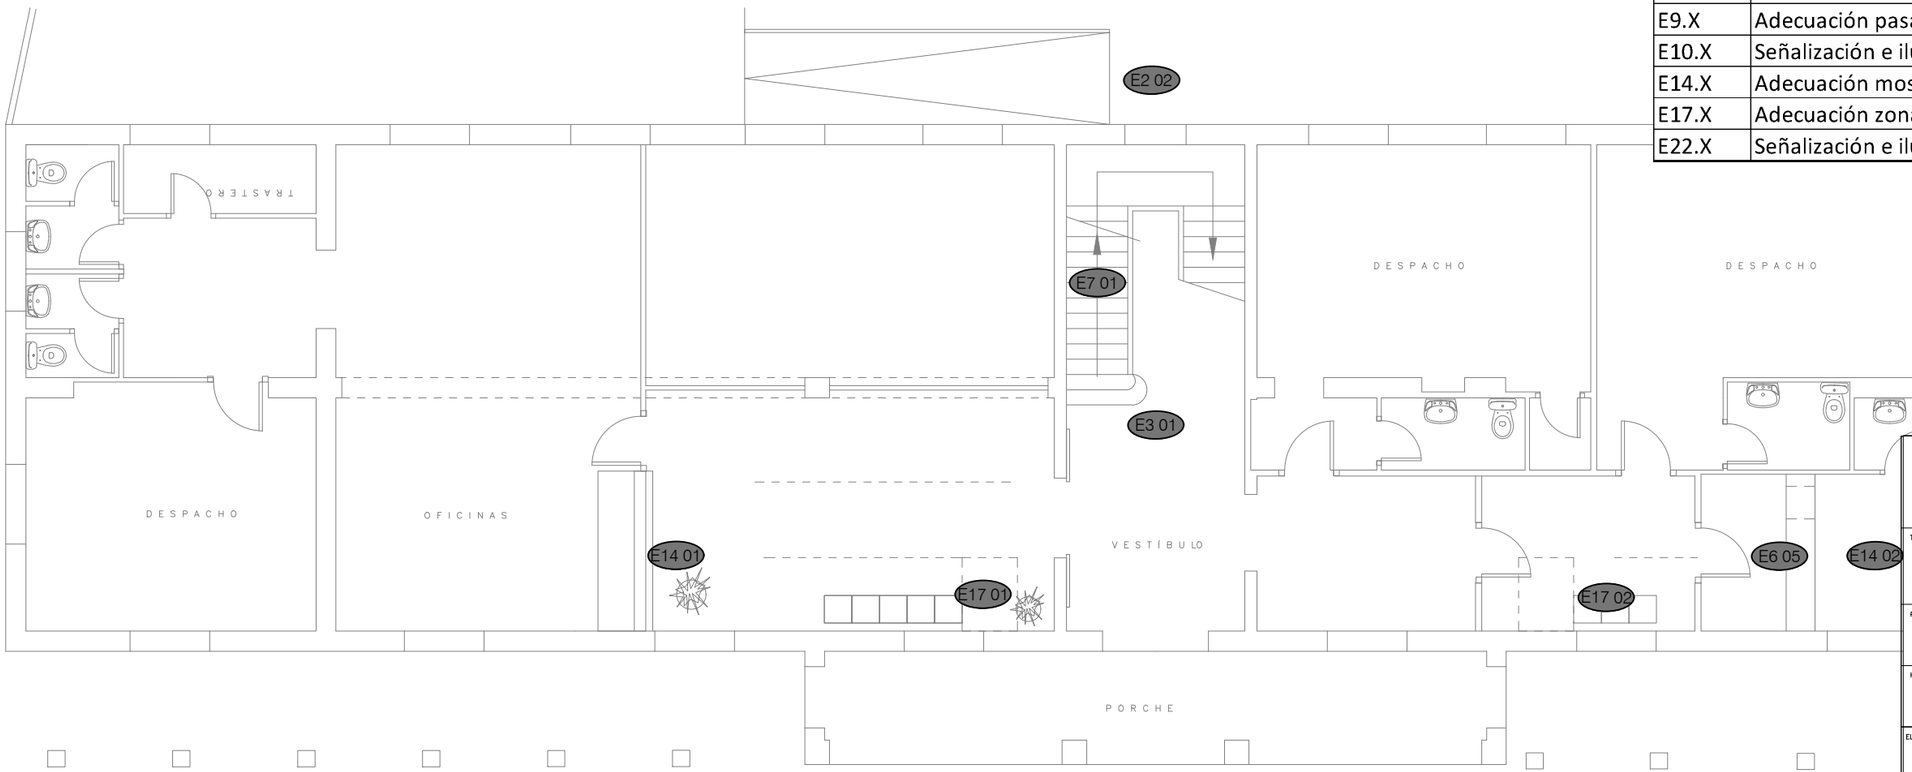

PLANTA BAJA

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/50, A3 1/100

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES ALCUDIA OFICINAS APB

FECHA: JULIO 2024

HOJA Nº : 1 de 11

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR

ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

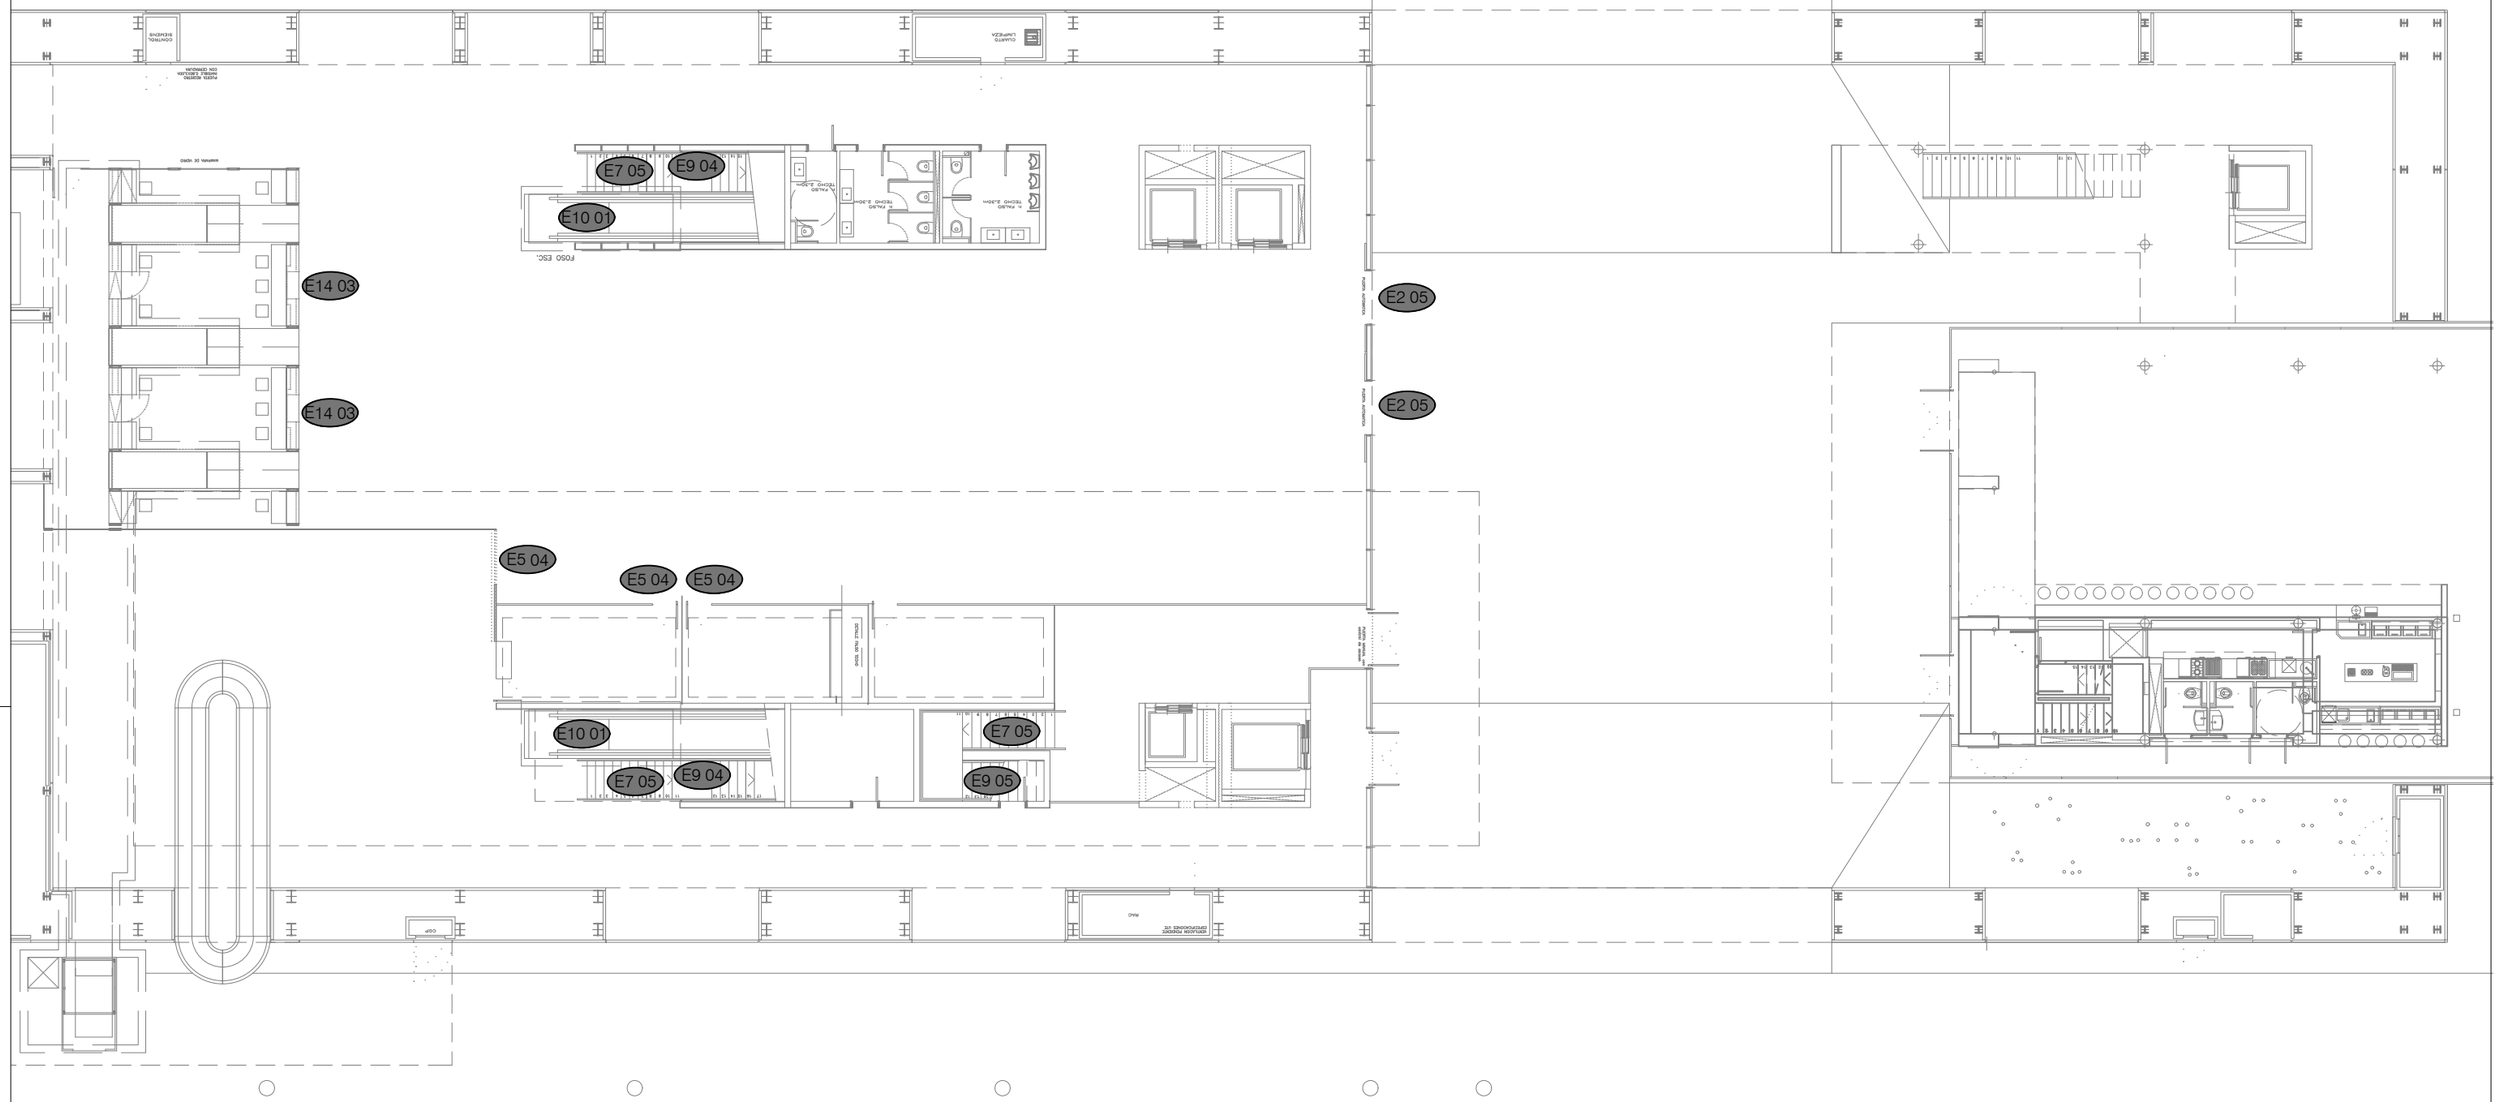

PUERTO DE ALCUDIA	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E1.X	Proyección nuevo itinerario accesible
E2.X	Sustitución puertas de acceso
E3.X	Adecuación escalón vestíbulo
E5.X	Adecuaciónde puertas de paso
E6.X	Adecuación pasillos y áreas de conexión
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E10.X	Señalización e ilumación escaleras mecánicas
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos
E22.X	Señalización e ilumación controles de paso y seguridad

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/100, A3 1/200

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES ALCUDIA ESTACIÓN MARÍTIMA PB

FECHA: JULIO 2024

HOJA Nº : 2 de 11

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,
CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR
ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

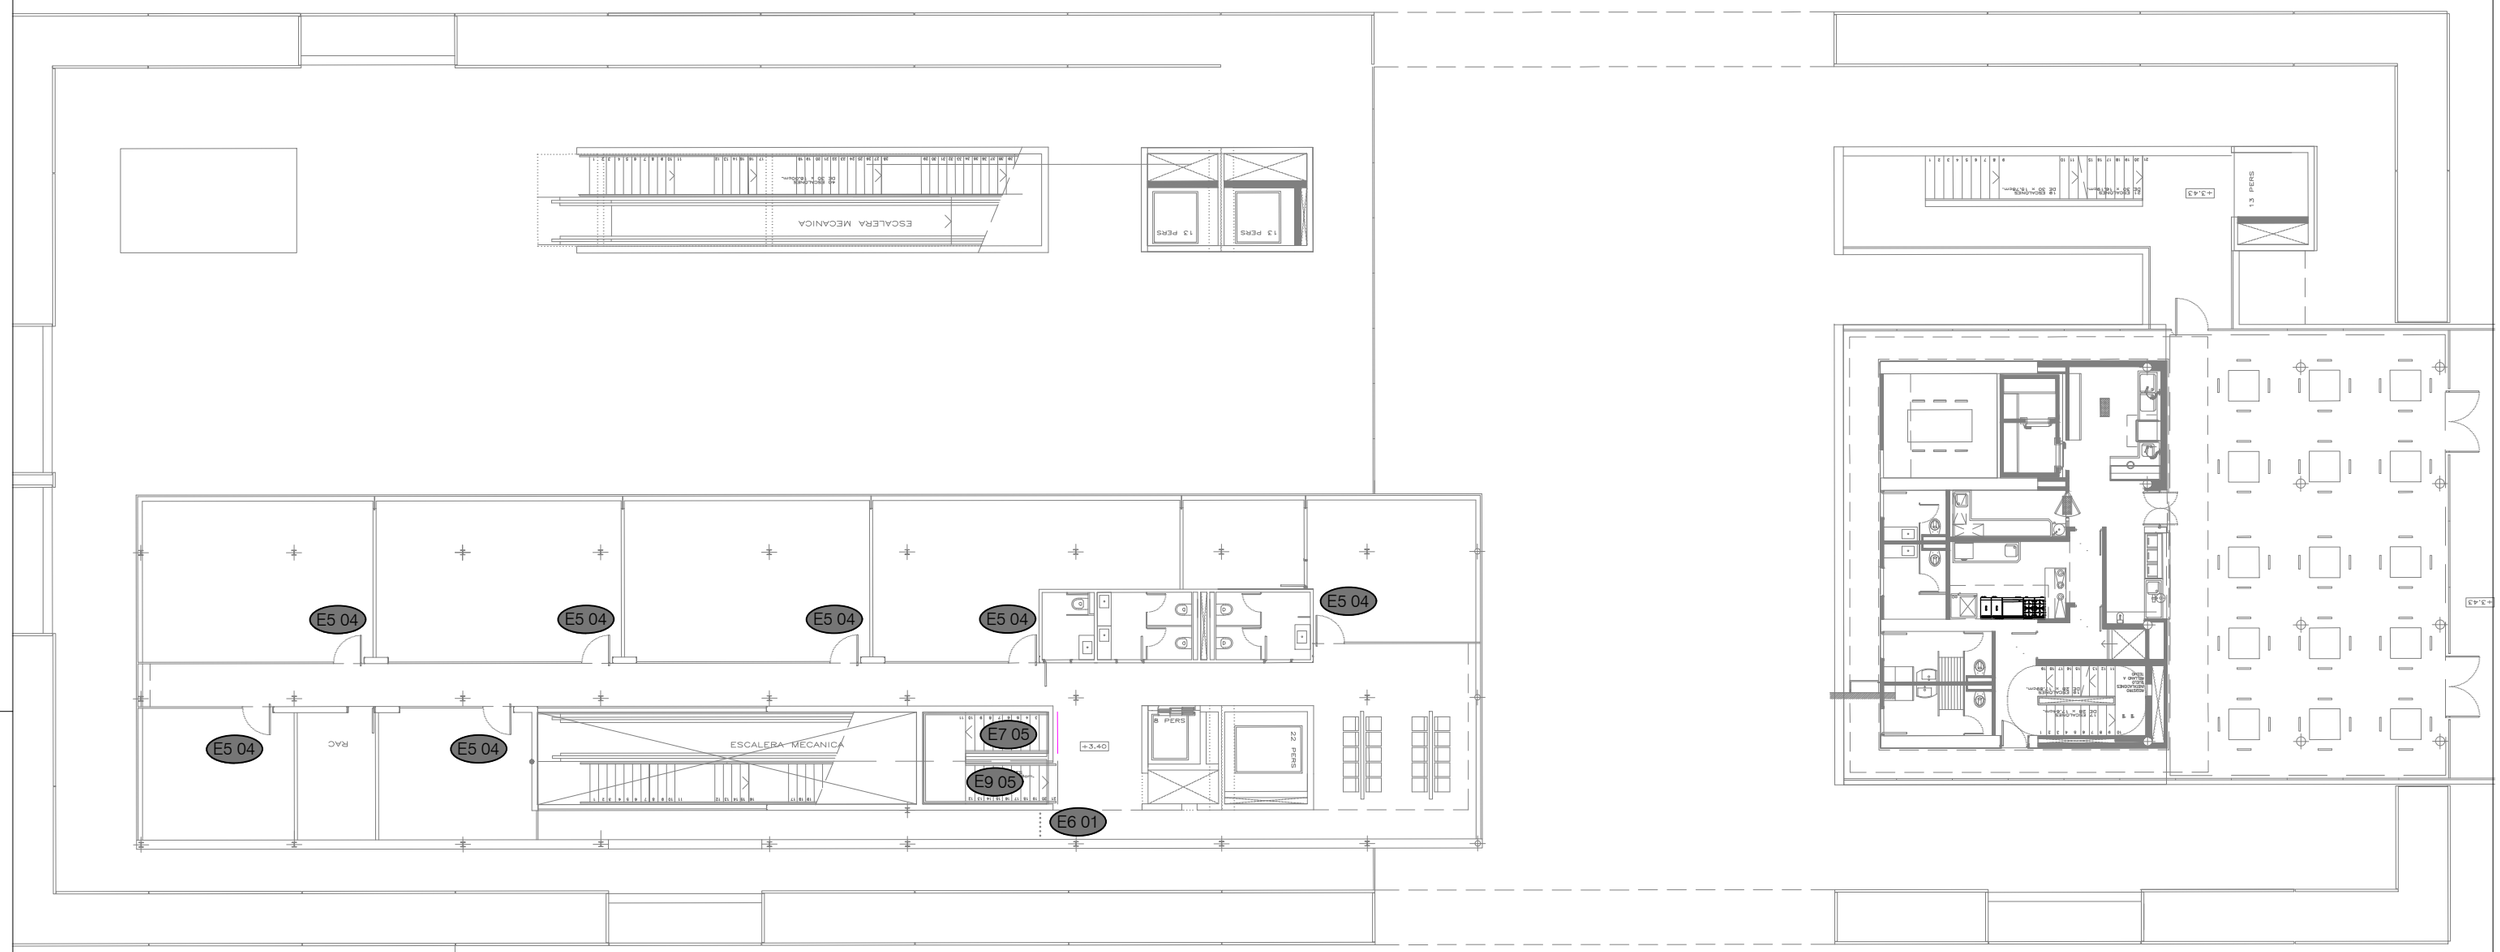

PUERTO DE ALCUDIA	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E1.X	Proyección nuevo itinerario accesible
E2.X	Sustitución puertas de acceso
E3.X	Adecuación escalón vestíbulo
E5.X	Adecuacióndе puertas de paso
E6.X	Adecuación pasillos y áreas de conexión
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E10.X	Señalización e ilumación escaleras mecánicas
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos
E22.X	Señalización e ilumación controles de paso y seguridad

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/100, A3 1/200

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES ALCUDIA ESTACIÓN MARÍTIMA P1

HOJA Nº : 3 de 11

FECHA: JULIO 2024

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,
CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR
ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

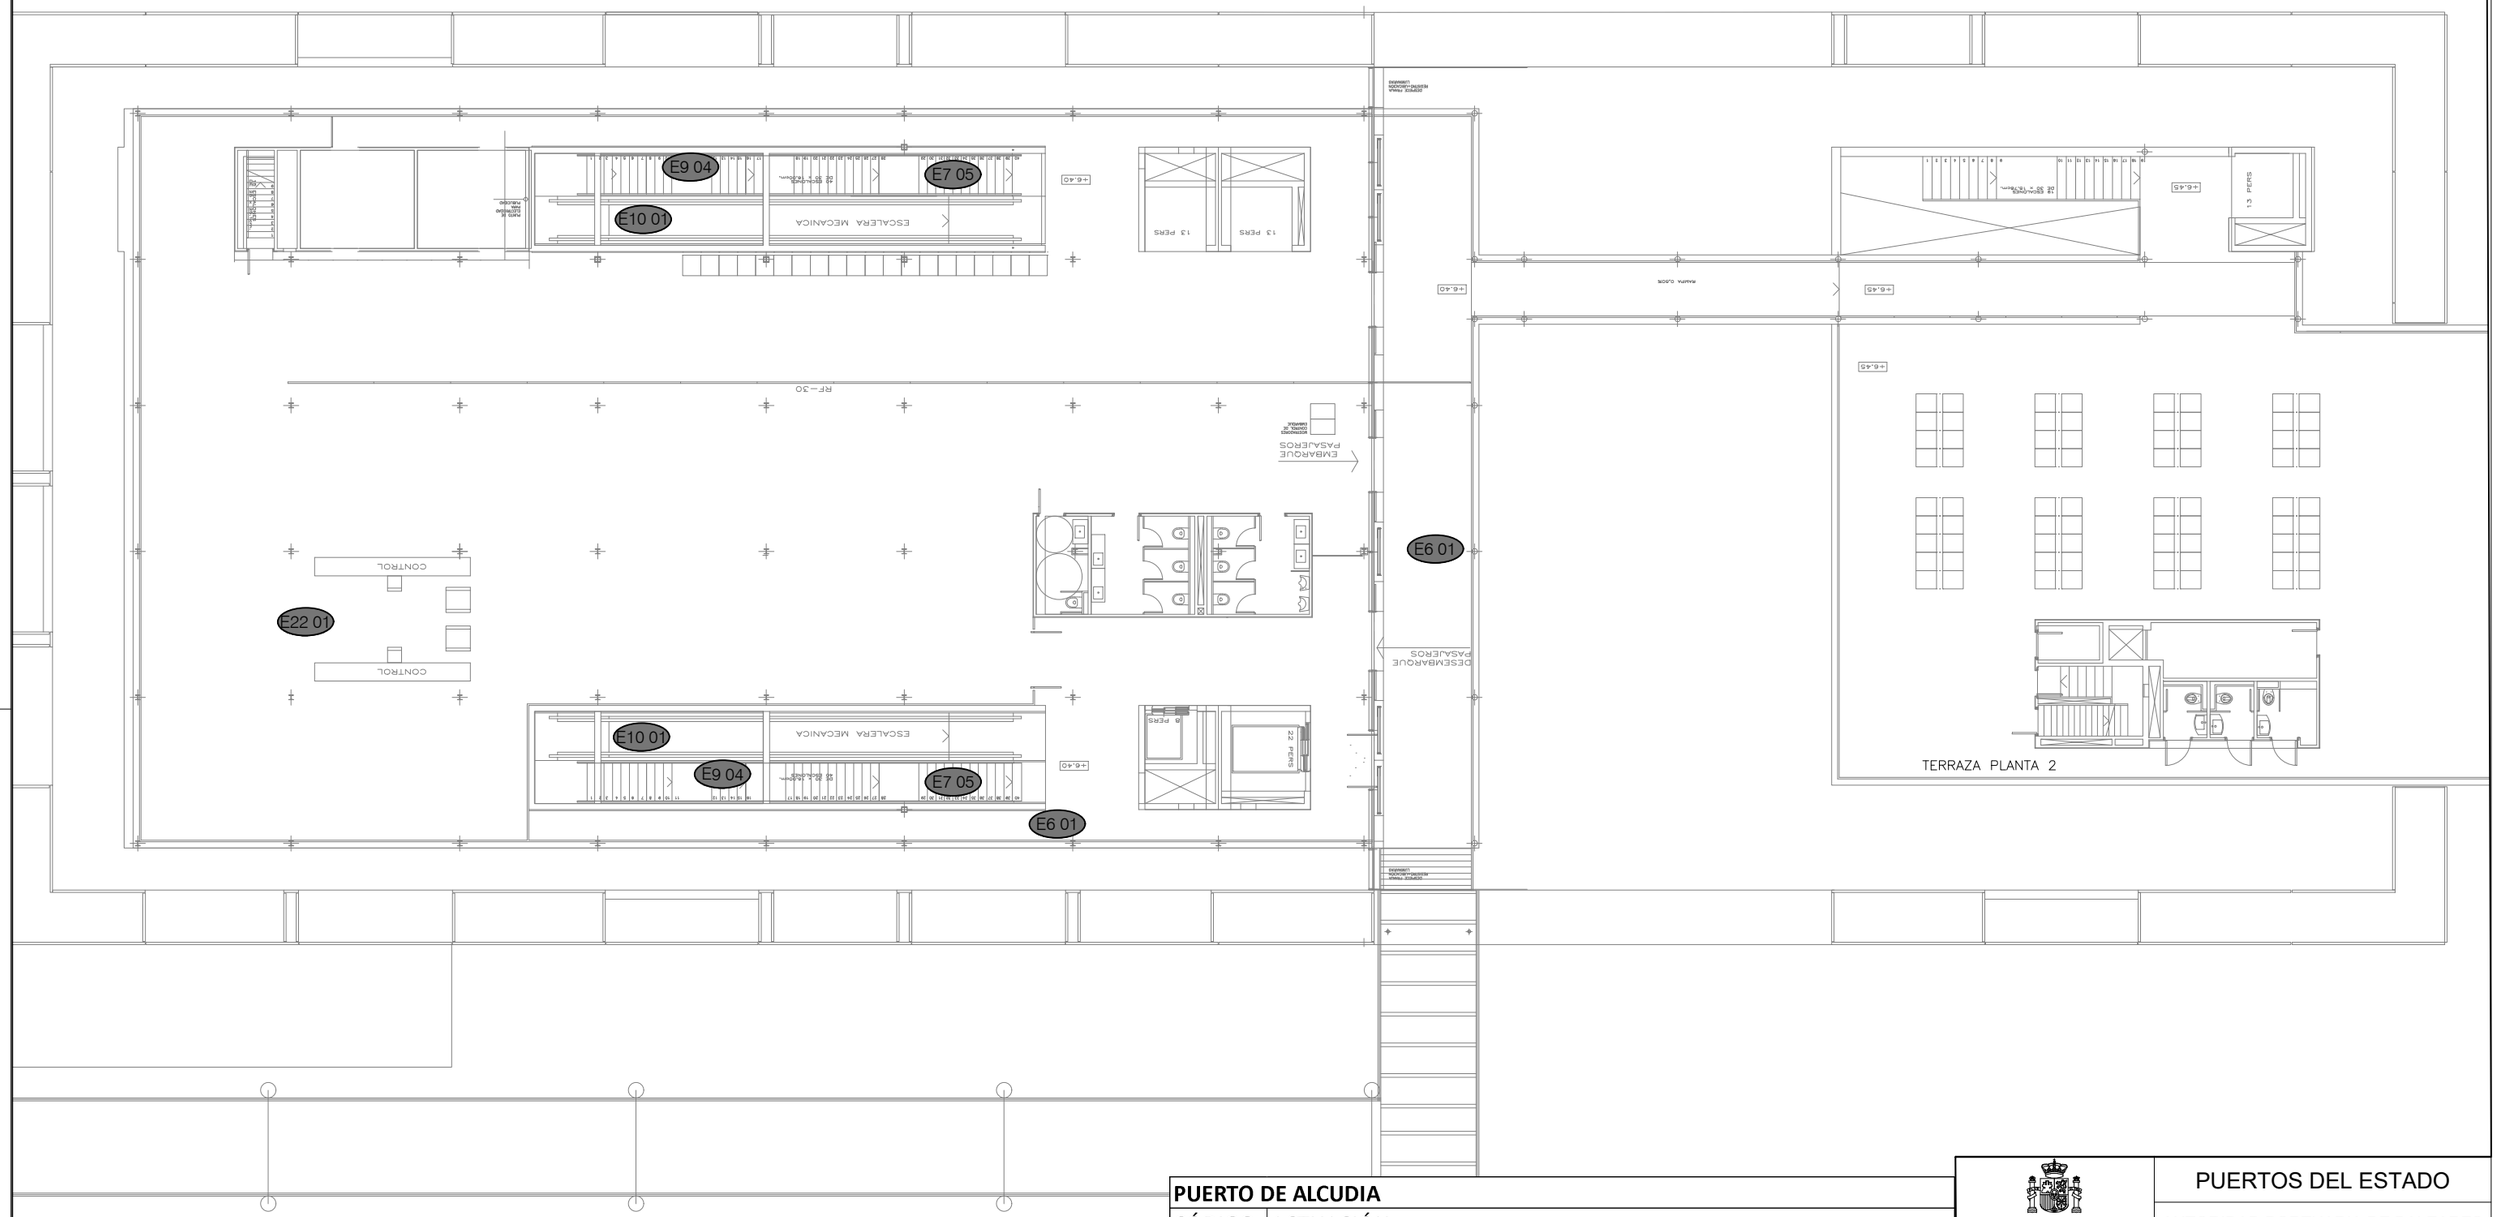

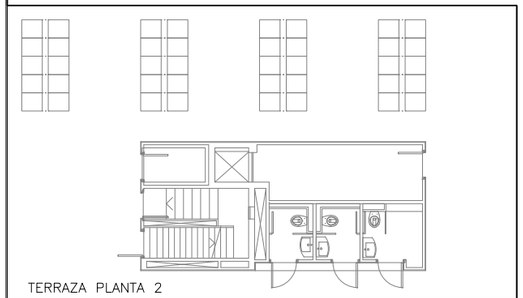

PUERTO DE ALCUDIA	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E1.X	Proyección nuevo itinerario accesible
E2.X	Sustitución puertas de acceso
E3.X	Adecuación escalón vestíbulo
E5.X	Adecuaciónde puertas de paso
E6.X	Adecuación pasillos y áreas de conexión
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E10.X	Señalización e ilumación escaleras mecánicas
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos
E22.X	Señalización e ilumación controles de paso y seguridad

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/100, A3 1/200

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES ALCUDIA ESTACIÓN MARÍTIMA P2

HOJA Nº : 4de 11

FECHA: JULIO 2024

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO, CARLOS TORRALBA FELIU, ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME, EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, VICTOR DARDER GALLARDO, ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

VºBº EL DIRECTOR, ANTONIO GINARD LÓPEZ, ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PLANTA BAJA

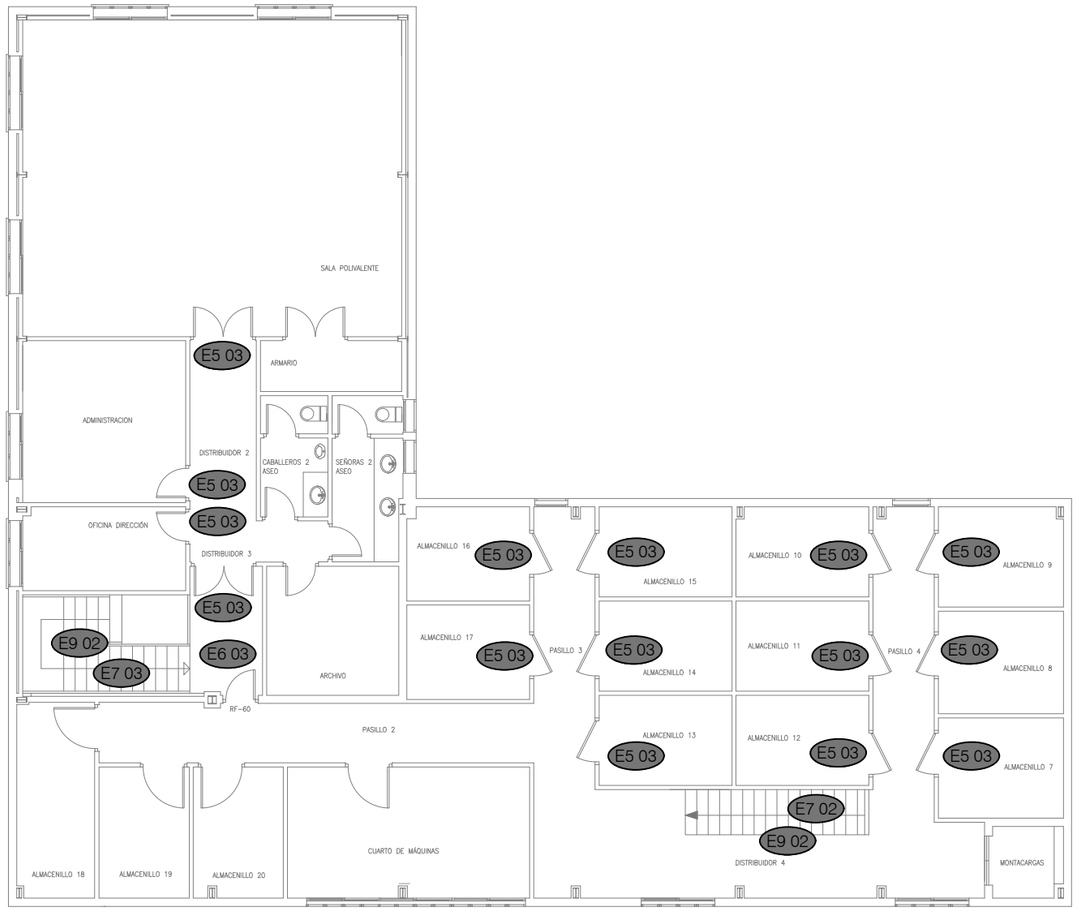

PLANTA PRIMERA

PUERTO DE ALCUDIA	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E1.X	Proyección nuevo itinerario accesible
E2.X	Sustitución puertas de acceso
E3.X	Adecuación escalón vestíbulo
E5.X	Adecuacióndе puertas de paso
E6.X	Adecuación pasillos y áreas de conexión
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E10.X	Señalización e ilumación escaleras mecánicas
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos
E22.X	Señalización e ilumación controles de paso y seguridad

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/75, A3 1/150

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES ALCUDIA LONJA DE PESCADORES P1 Y PB

FECHA: JULIO 2024

HOJA Nº : 5 de 11

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO, CARLOS TORRALBA FELIU, ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME, EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS, VICTOR BARDER GALLARDO, ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B° EL DIRECTOR, ANTONIO GINARD LÓPEZ, ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

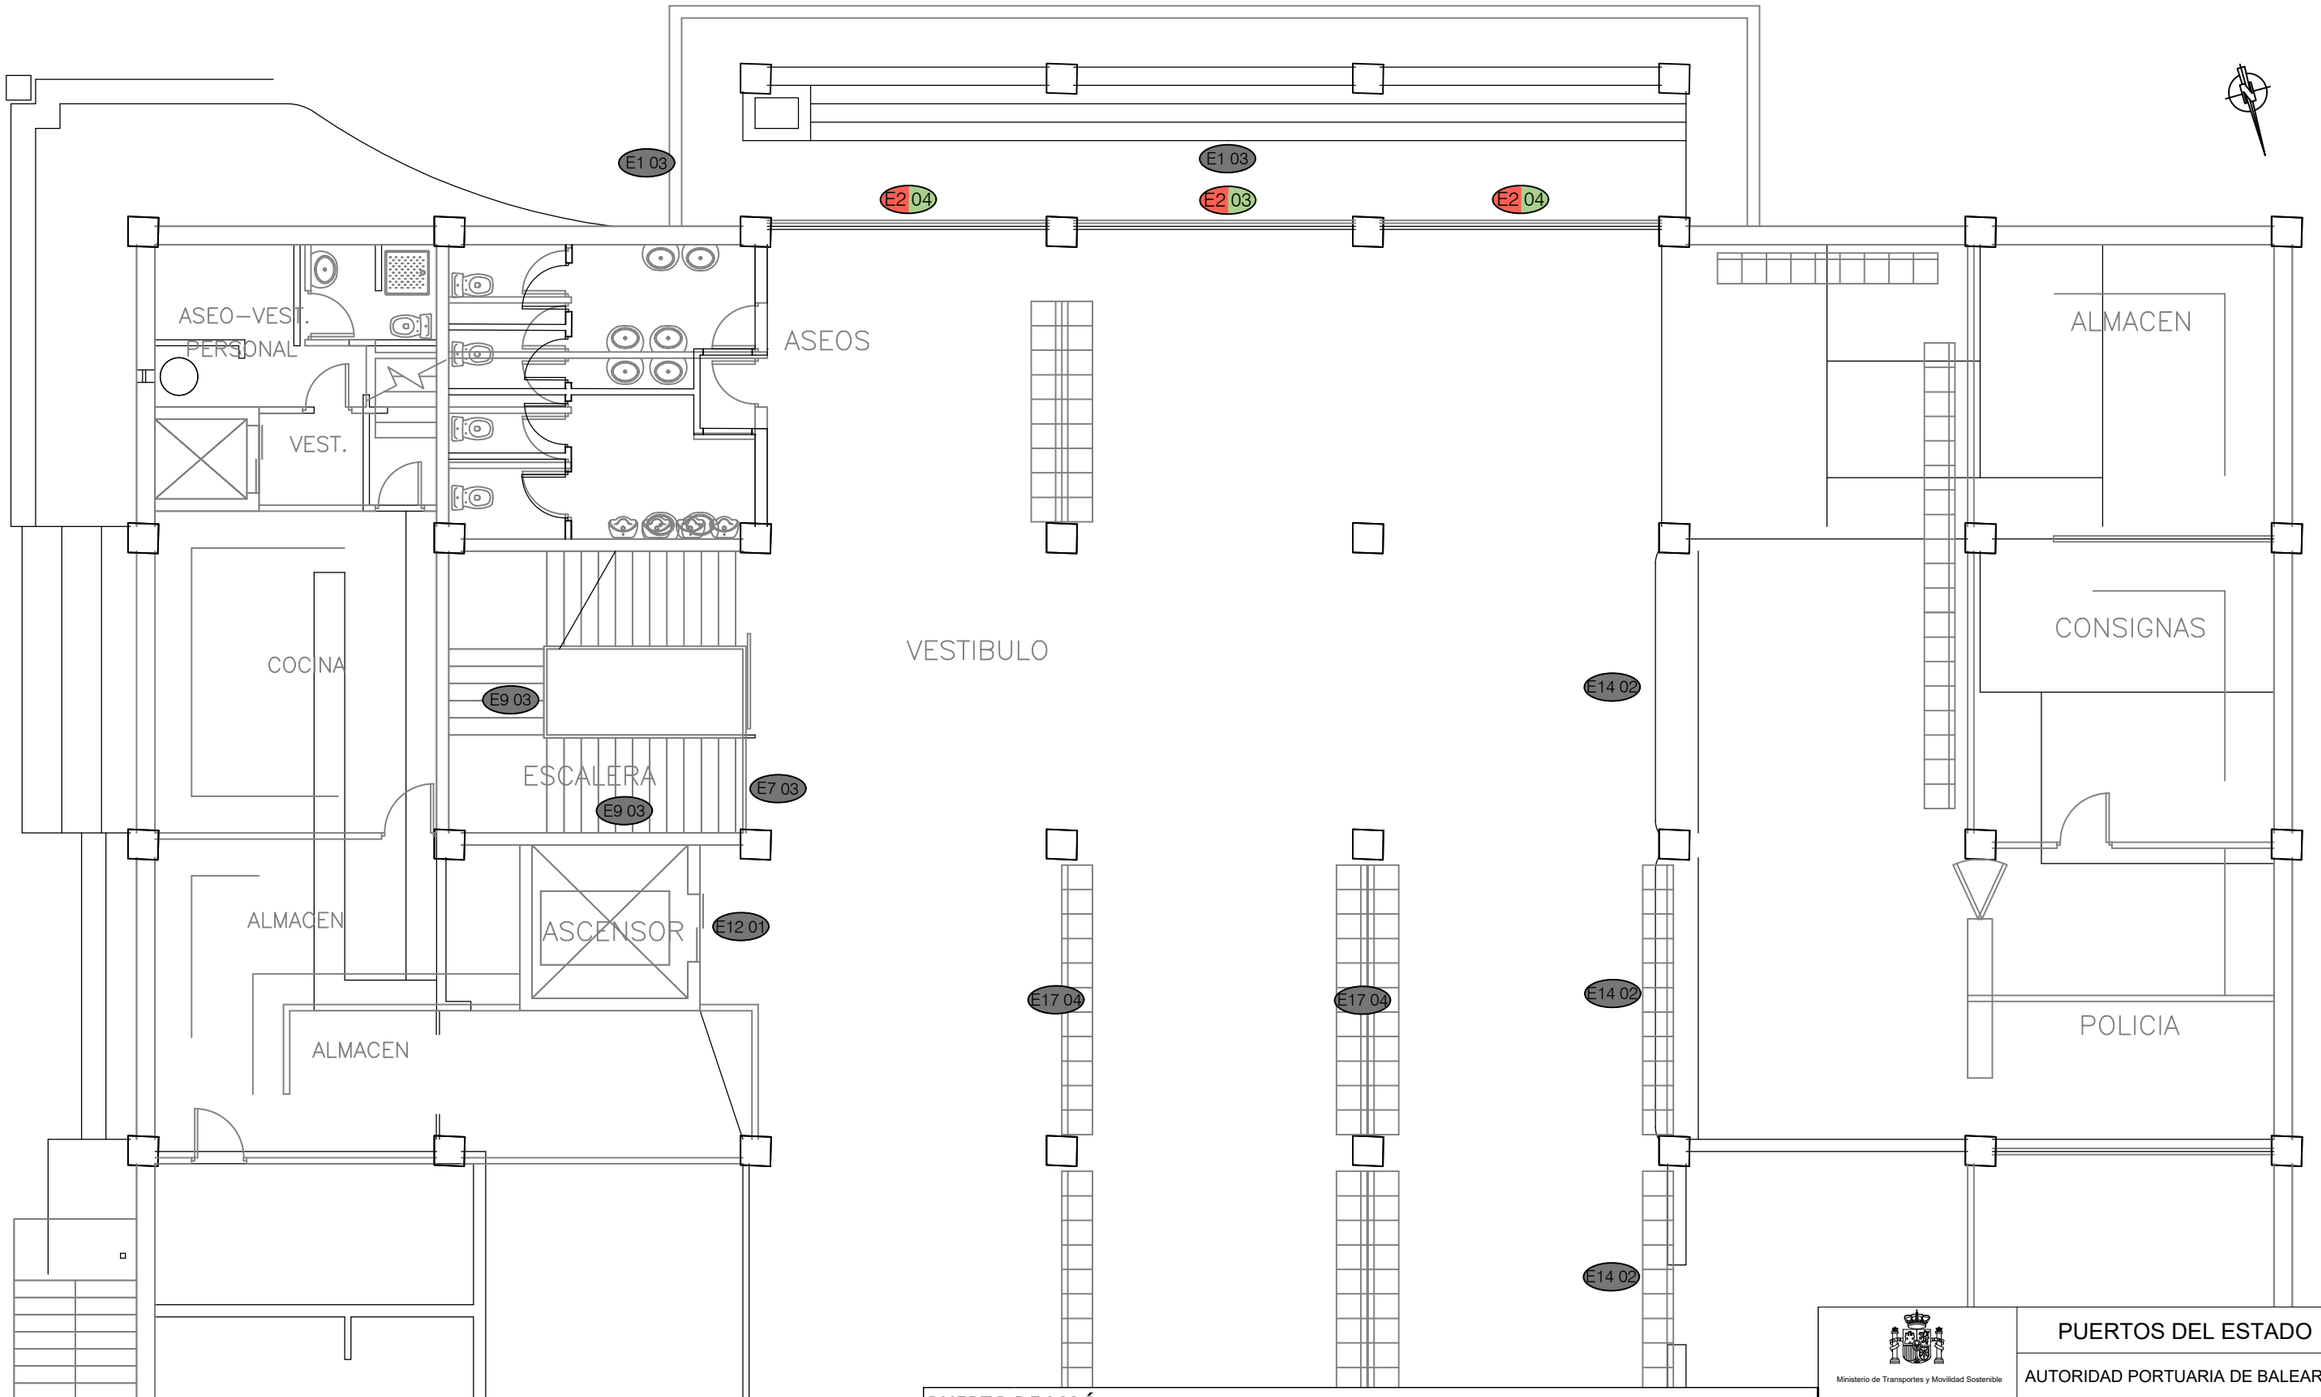

PUERTO DE MAÓ	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E1.X	Adecuación itinerario accesible
E2.X	Adecuación puertas de acceso
E5.X	Adecuación de puertas de paso
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E8.X	Adecuación rampas
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E12.X	Adecuación ascensores
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/50, A3 1/100

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO :

ACTUACIONES
MAÓ
ESTACIÓN MARÍTIMA CRUCEROS

FECHA: JULIO 2024

HOJA Nº : 6 de 11

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,
CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR
ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

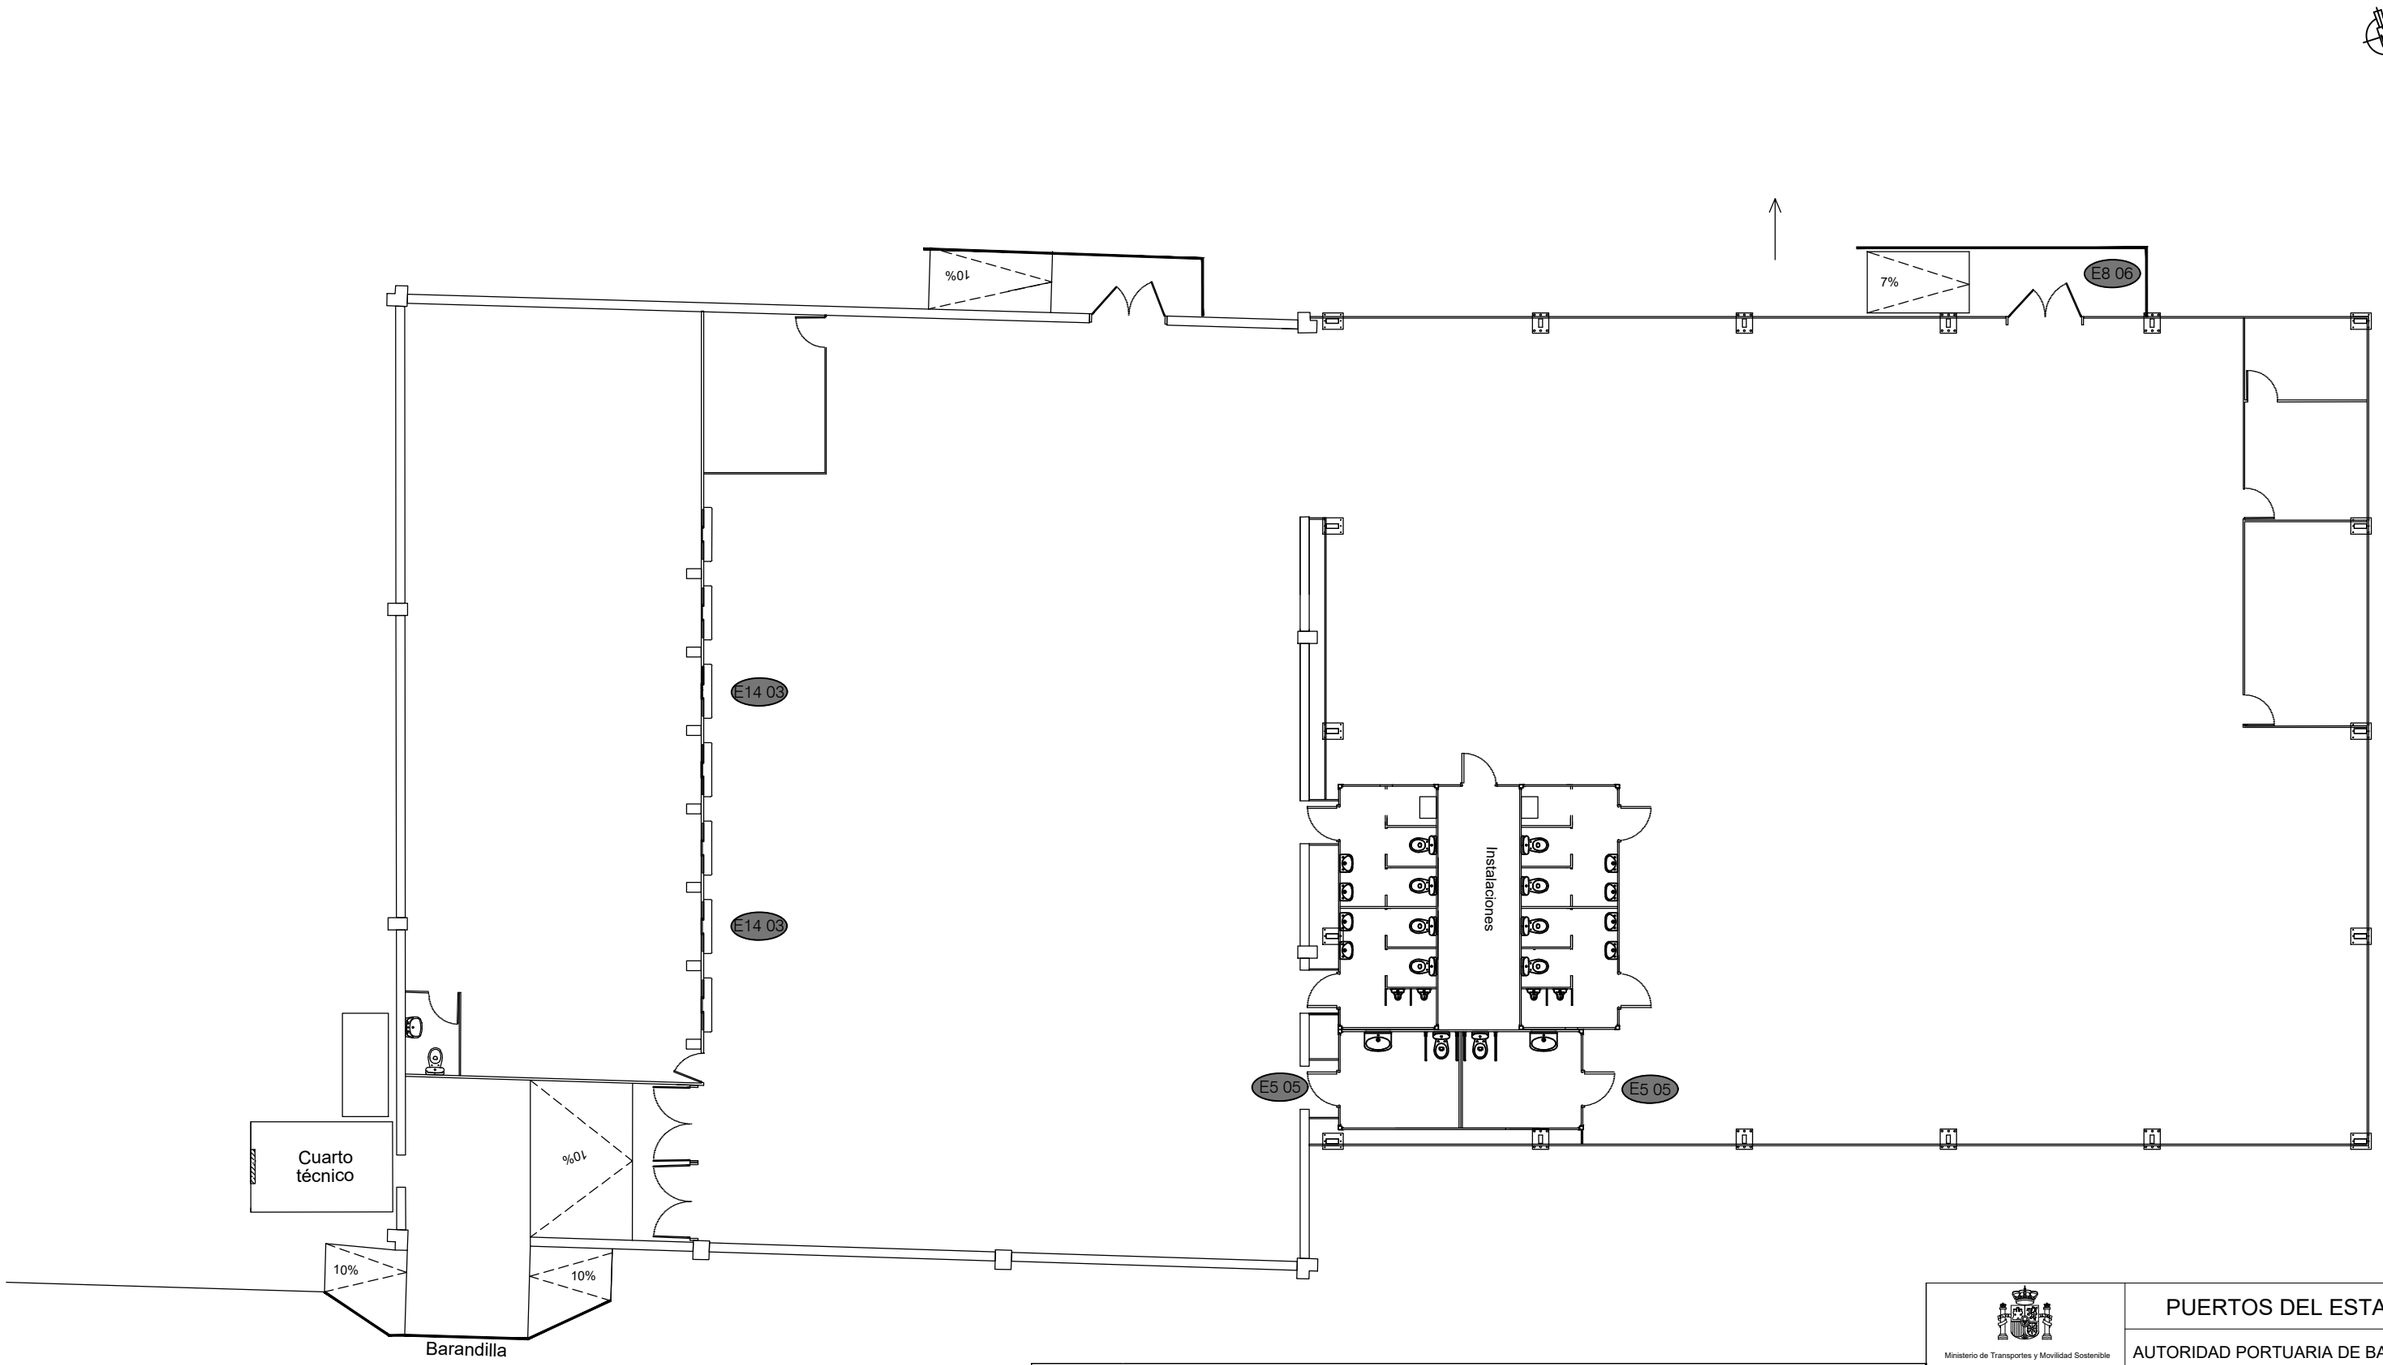

PUERTO DE MAÓ	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E1.X	Adecuación itinerario accesible
E2.X	Adecuación puertas de acceso
E5.X	Adecuación de puertas de paso
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E8.X	Adecuación rampas
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E12.X	Adecuación ascensores
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/75, A3 1/150

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES MAÓ ESTACIÓN MARÍTIMA CÓS NOU

FECHA: JULIO 2024

HOJA Nº : 7 de 11

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR

ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

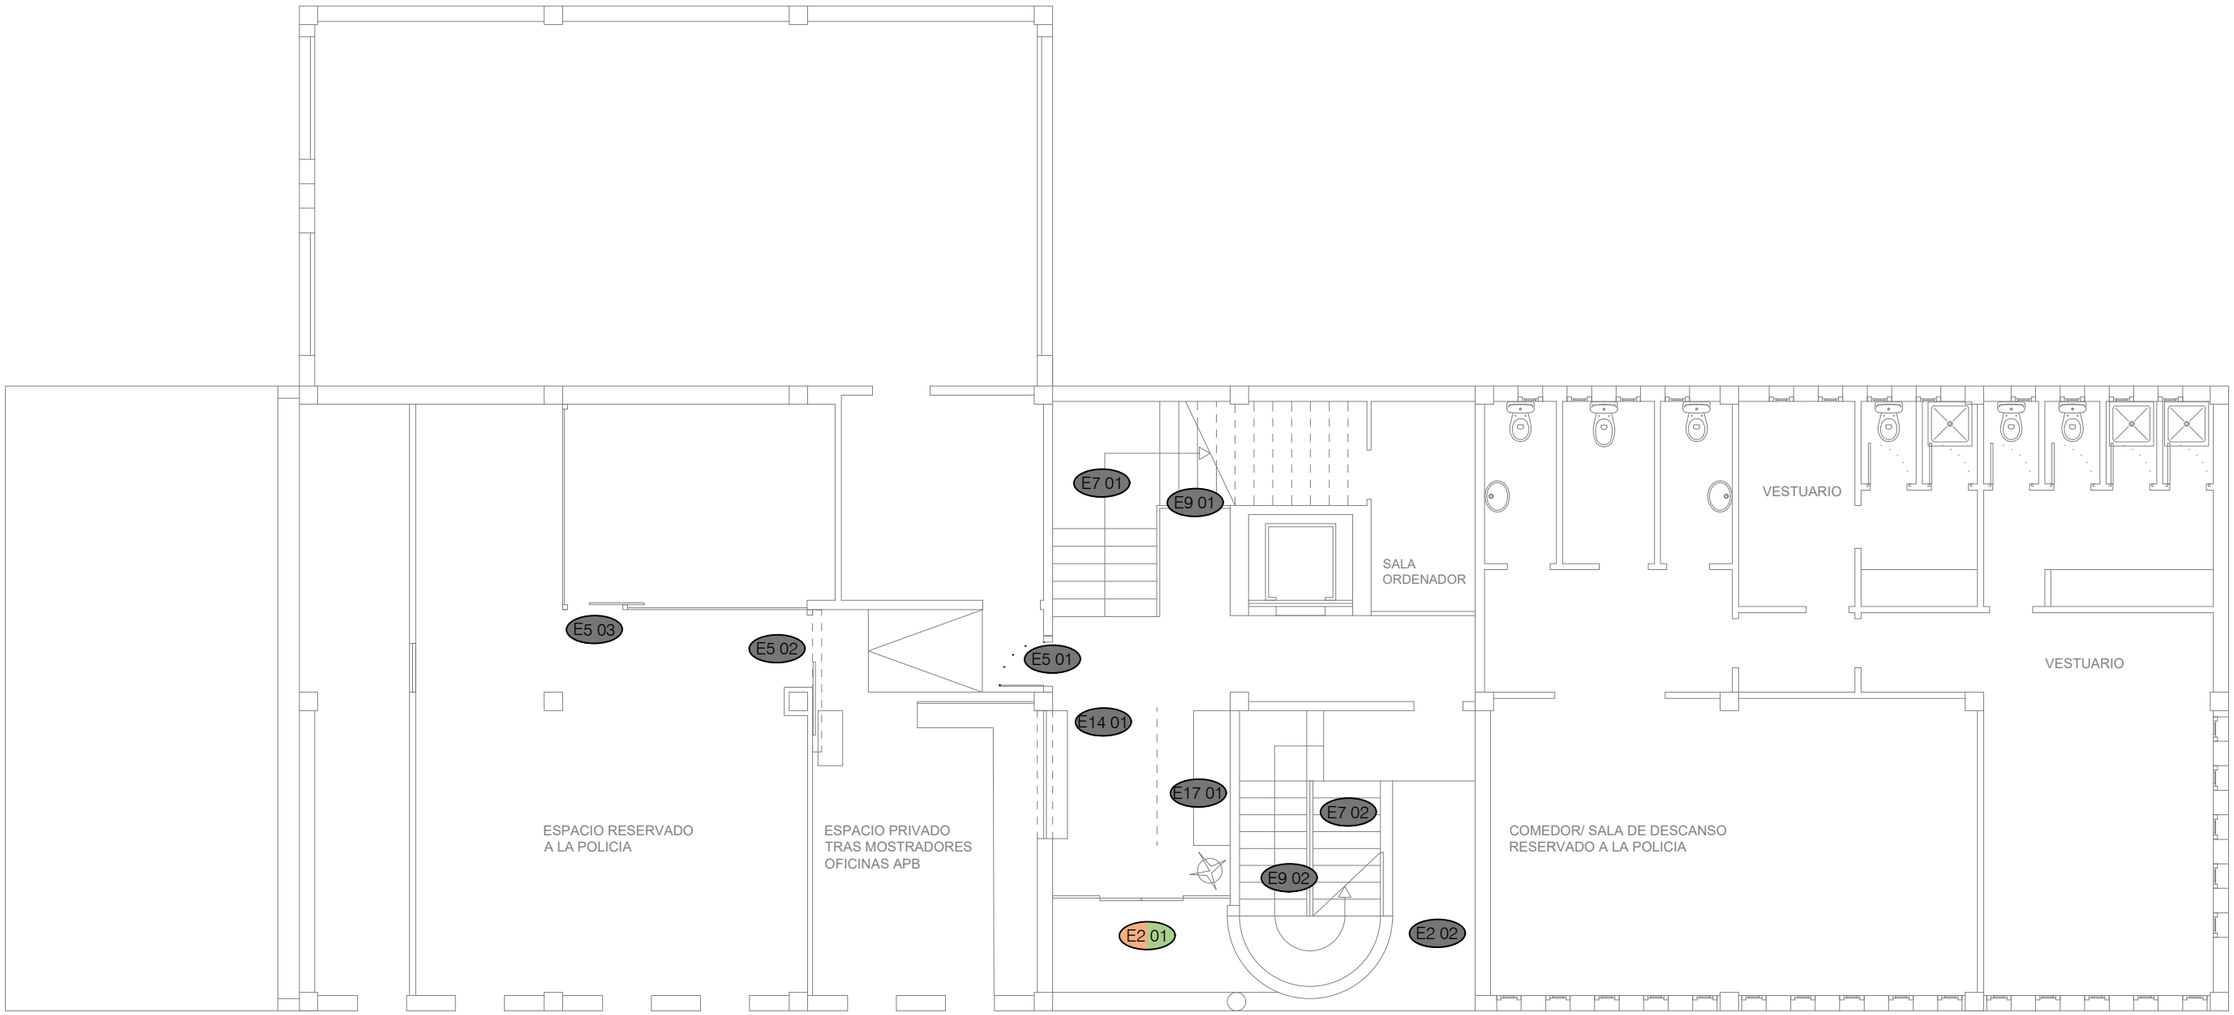

PUERTO DE EIVISSA	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E2.X	Adecuación puertas de acceso
E5.X	Adecuaciónde puertas de paso
E6.X	Adecuación pasillos y áreas de conexión
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E12.X	Adecuación ascensores
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/50, A3 1/100

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES IBIZA OFICINAS APB

HOJA Nº : 8 de 11

FECHA: JULIO 2024

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,
CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

VºBº
EL DIRECTOR
ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

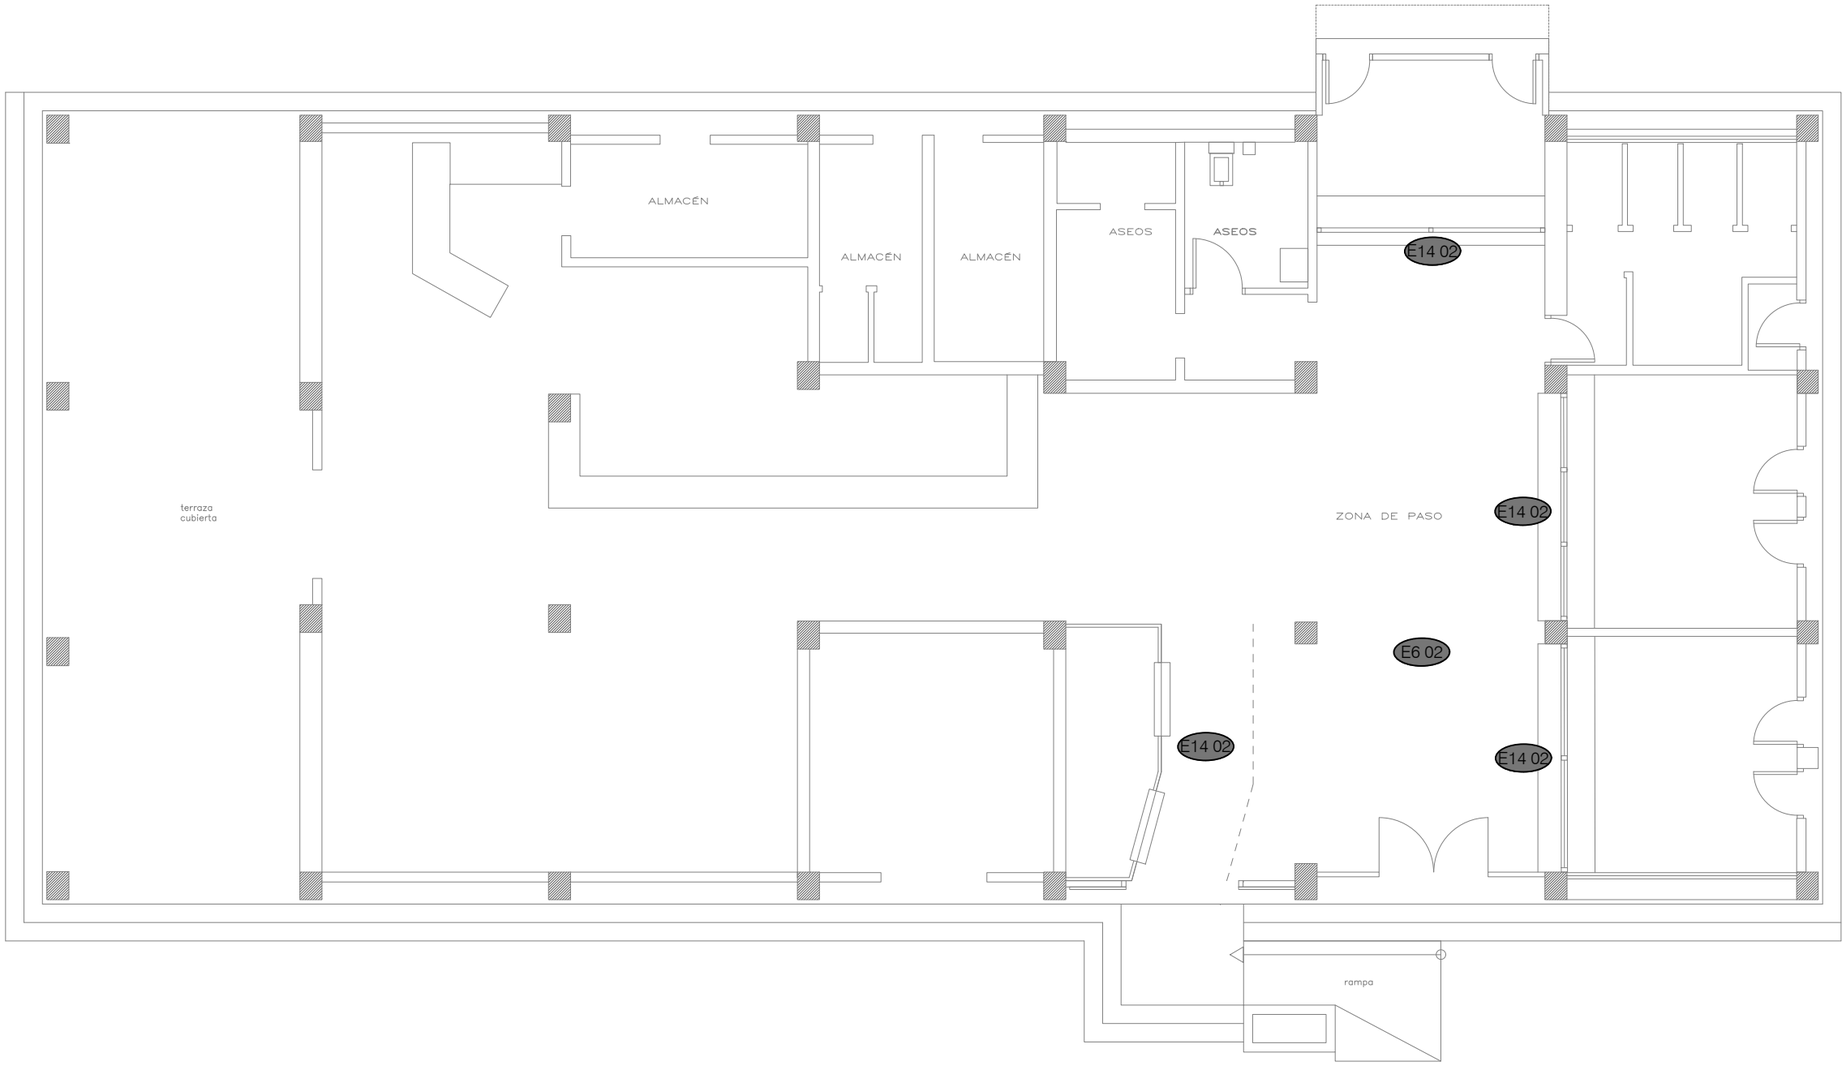

PUERTO DE EIVISSA	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E2.X	Adecuación puertas de acceso
E5.X	Adecuaciónde puertas de paso
E6.X	Adecuación pasillos y áreas de conexión
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E12.X	Adecuación ascensores
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/50, A3 1/100

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES IBIZA ESTACIÓN MARÍTIMA

HOJA Nº : 9 de 11

FECHA: JULIO 2024

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR

ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

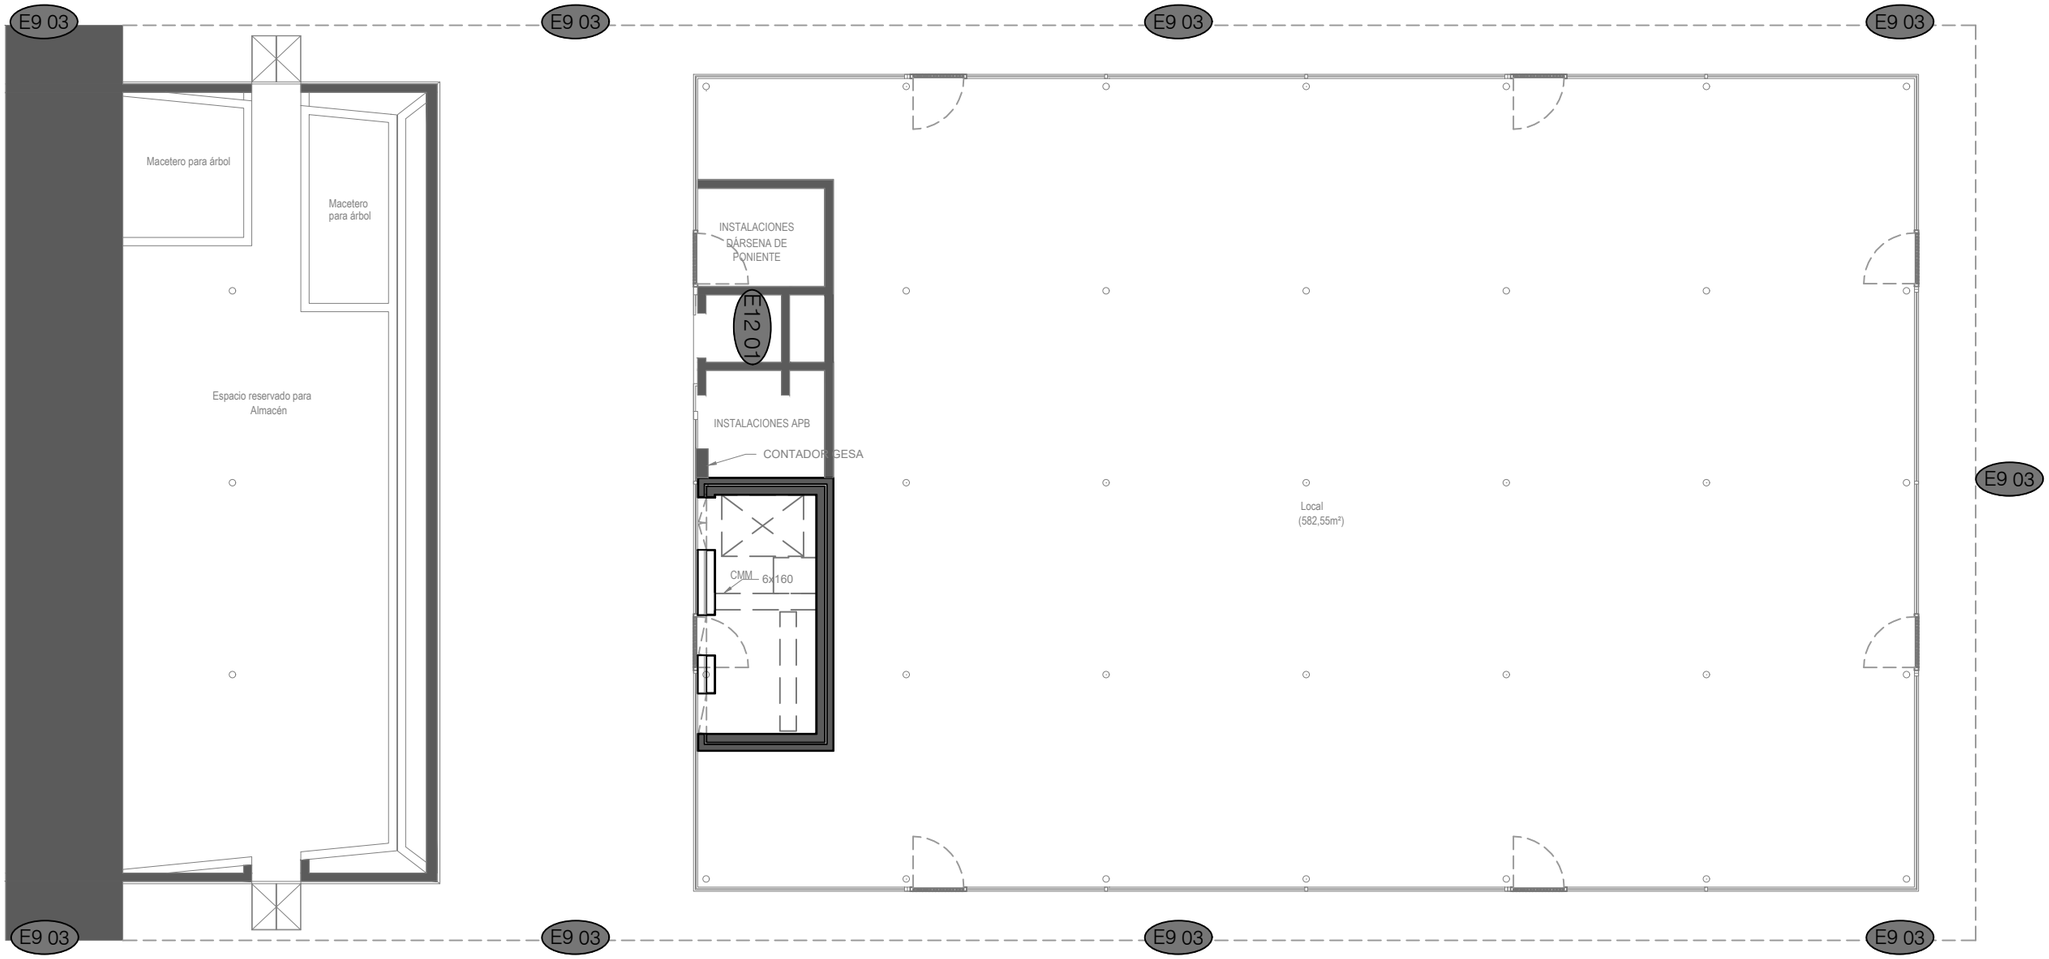

PUERTO DE EIVISSA	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E2.X	Adecuación puertas de acceso
E5.X	Adecuaciónde puertas de paso
E6.X	Adecuación pasillos y áreas de conexión
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E12.X	Adecuación ascensores
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público
E17.X	Adecuación zona de asientos

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/75, A3 1/150

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES IBIZA EDIFICIO DEL MARTILLO

FECHA: JULIO 2024

HOJA Nº : 10 de 11

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,
CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

V°B°
EL DIRECTOR
ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

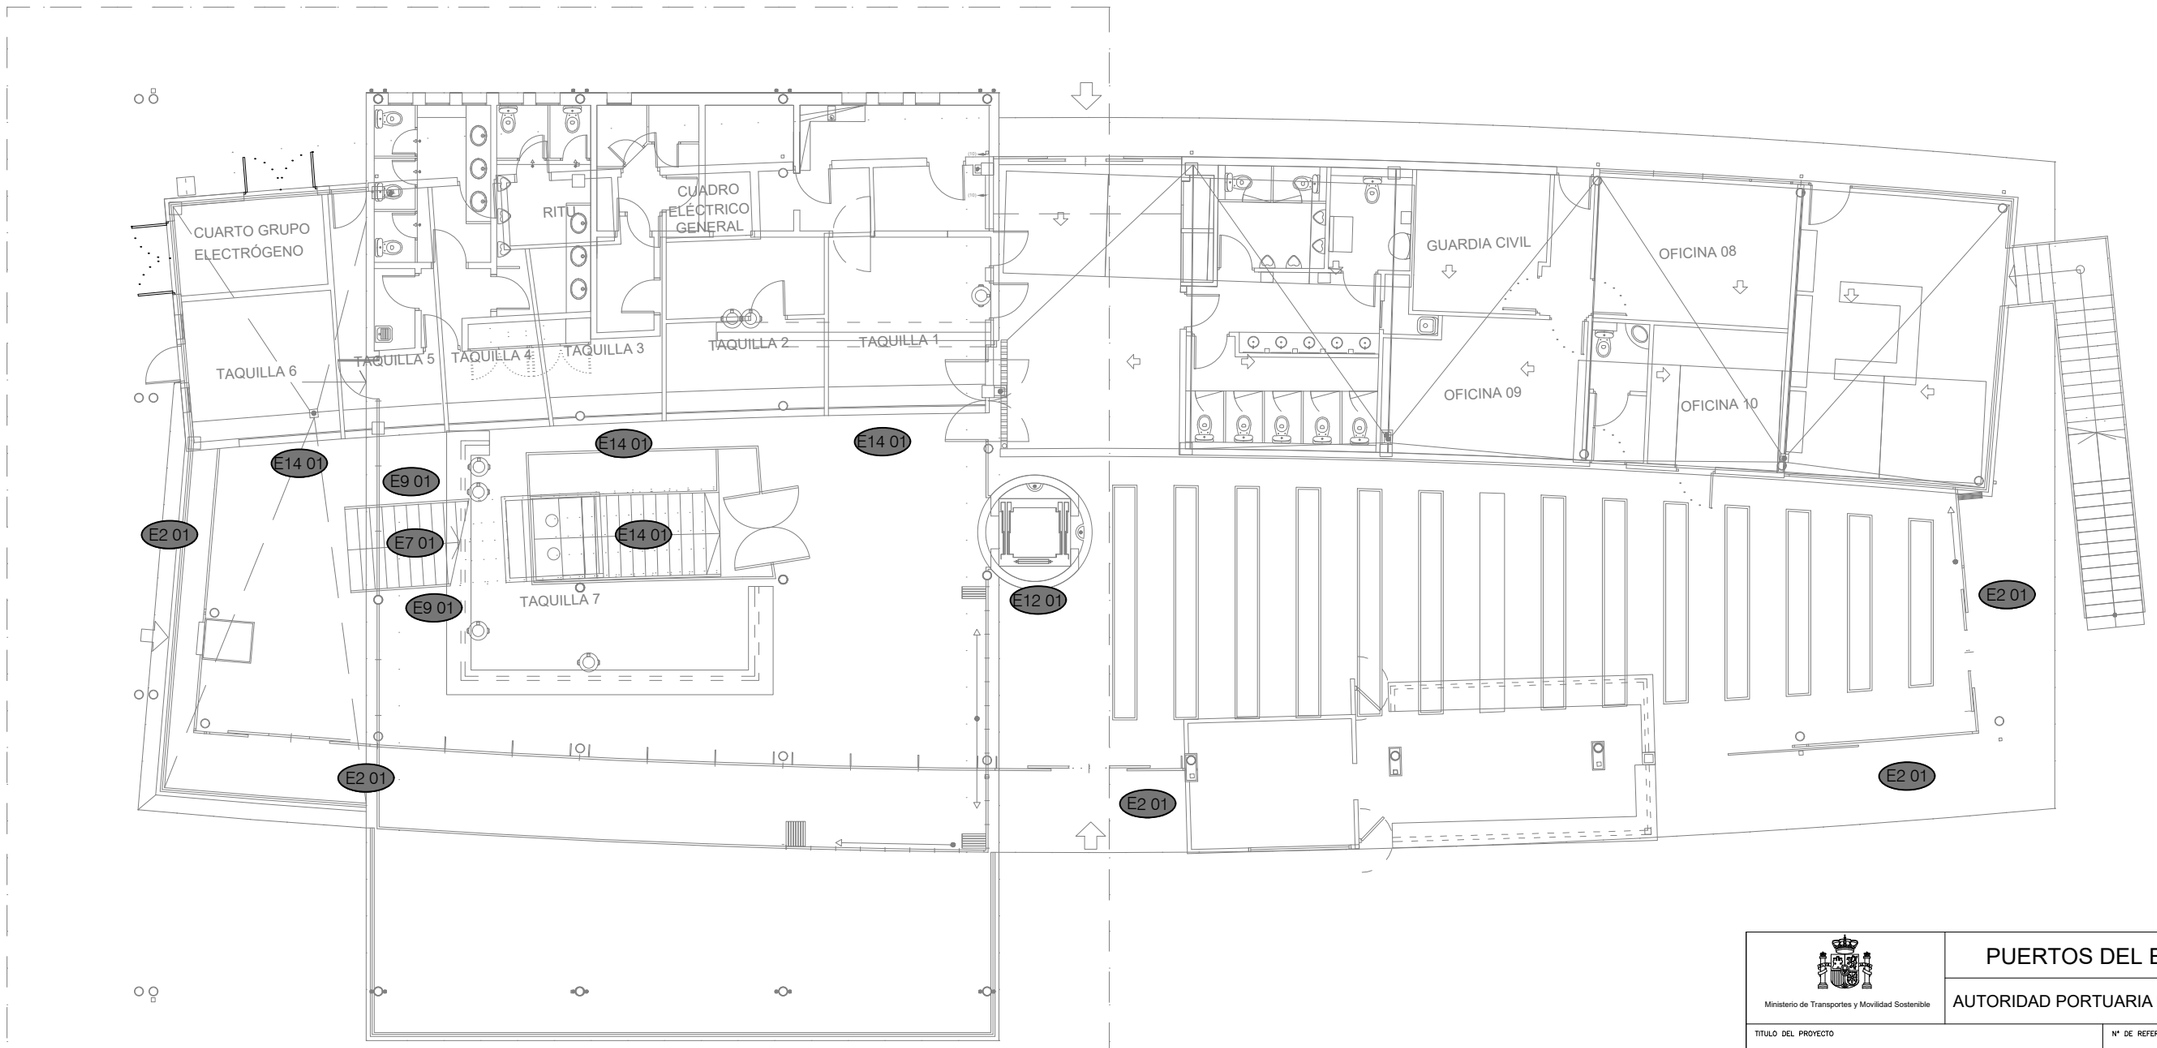

PUERTO DE LA SAVINA	
CÓDIGO	ACTUACIÓN
E2.X	Adecuación puertas de acceso
E7.X	Adecuación escaleras fijas interiores
E9.X	Adecuación pasamanos y barandillas
E12.X	Adecuación ascensores
E14.X	Adecuación mostradores de venta, información y atención al público

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/75 A3 1/150

PLANO Nº : 002

DENOMINACION PLANO : ACTUACIONES LA SAVINA ESTACIÓN MARÍTIMA

HOJA Nº : 11 de 11

FECHA: JULIO 2024

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO.
CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

VºBº
EL DIRECTOR
ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

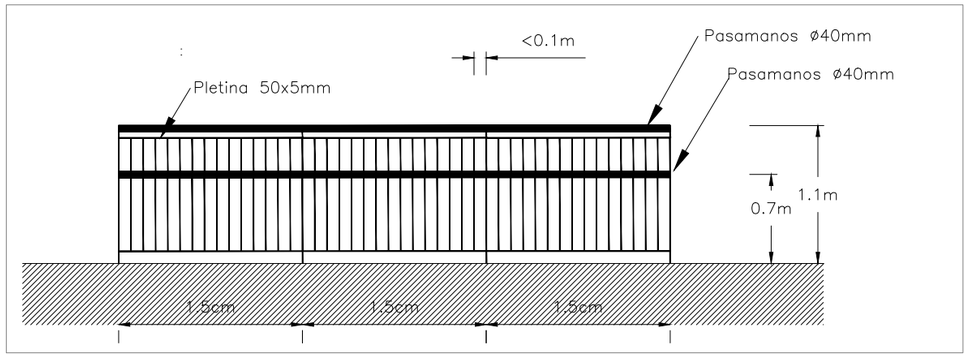

ESQUEMA BARANDILLA TIPO

ACTUACIONES:

ALCUDIA
- E1.03
- E7.01
- E7.02-3

EIVISSA
- E1.01
- E8.02
- E9.01
- E9.02

MAÓ
- E1.01
- E9.03

LA SAVINA
- E9.01

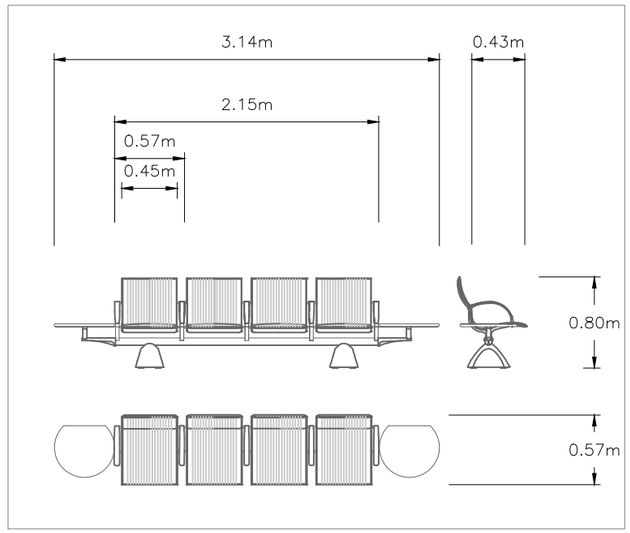

ESQUEMA UNIDAD ACCESIBLE 4 ASIENTOS

ACTUACIONES:

ALCUDIA
- E17.01
- E17.02

EIVISSA
- E17.01

MAÓ
- E17.04
- E17.05

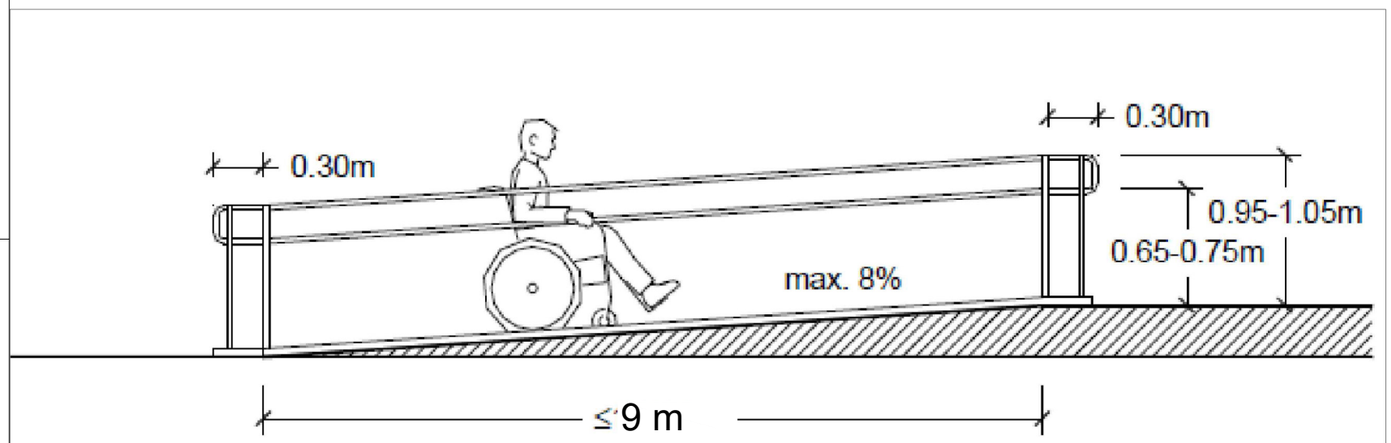

RAMPA DE LONGITUD ENTRE 3m Y 10m

ACTUACIONES:

ALCUDIA
- E1.03

EIVISSA
- E1.01

MAÓ
- E1.01

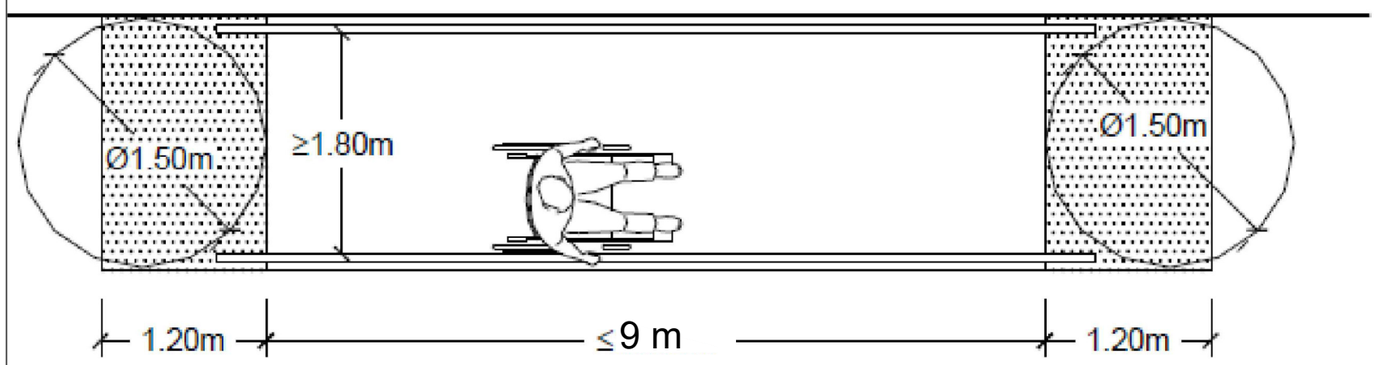

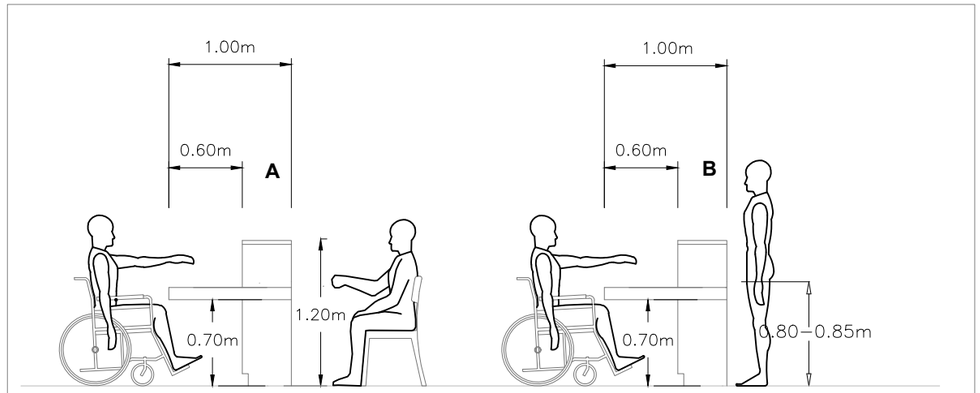

ESQUEMA MOSTRADOR ACCESIBLE

ACTUACIONES:

ALCUDIA
- E14.01
- E14.02
- E14.03

MAÓ
- E14.02
- E14.03

EIVISSA
- E14.01
- E14.02

LA SAVINA
- E14.01

DETALLES DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE ACUERDO CON LA ORDEN TMA/851/2021

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO

"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA: PO. : 74.24

ESCALAS: A1 1/50, A3 1/100

PLANO Nº : 003

DENOMINACION PLANO : DETALLES

FECHA: JULIO 2024

HOJA Nº : 1 de 2

DIBUJADO POR : IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,

CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

VºBº
EL DIRECTOR

ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

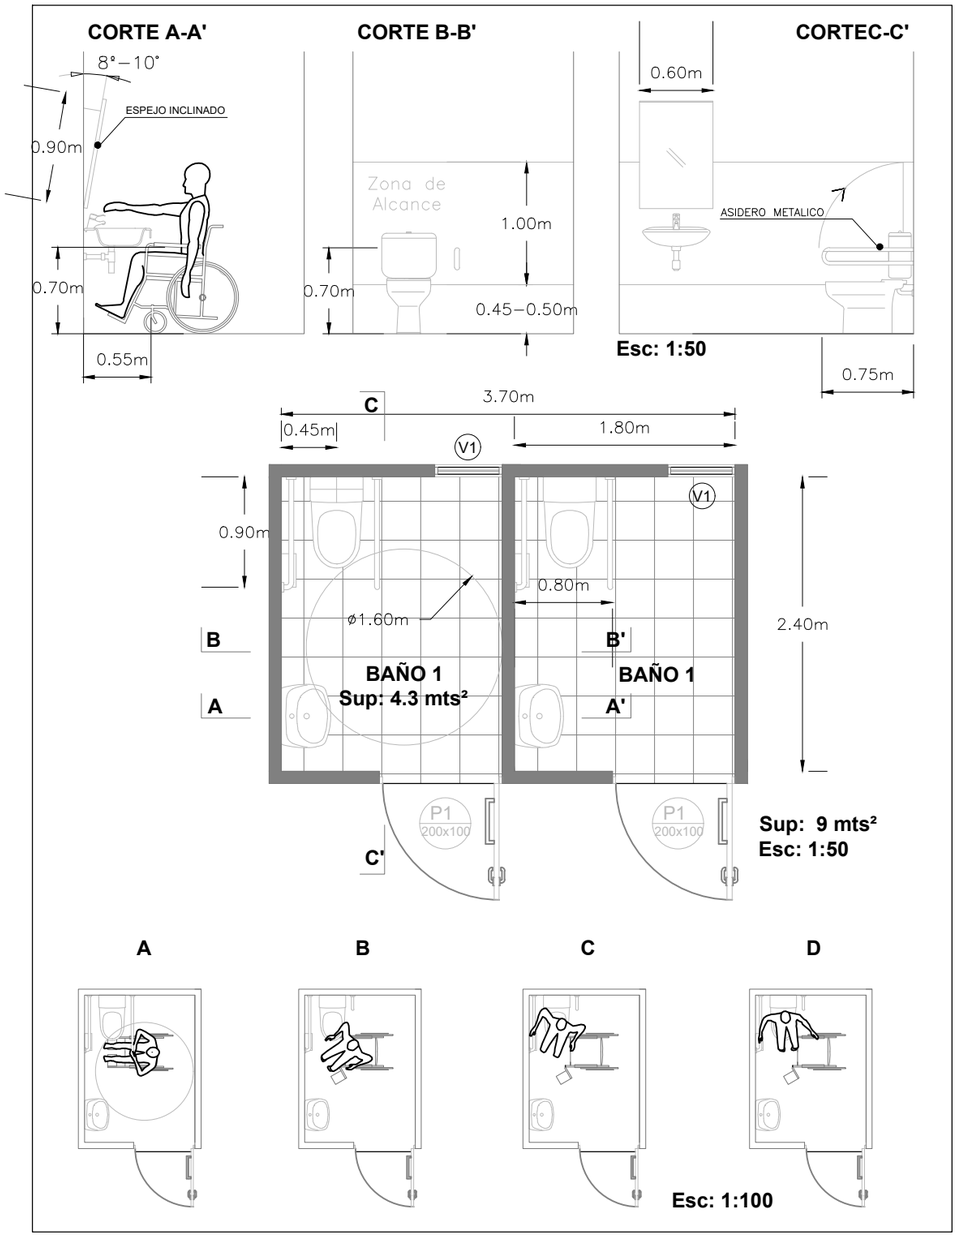

ESQUEMA BAÑO ACCESIBLE

ACTUACIONES:
LA SAVINA
- E24.01

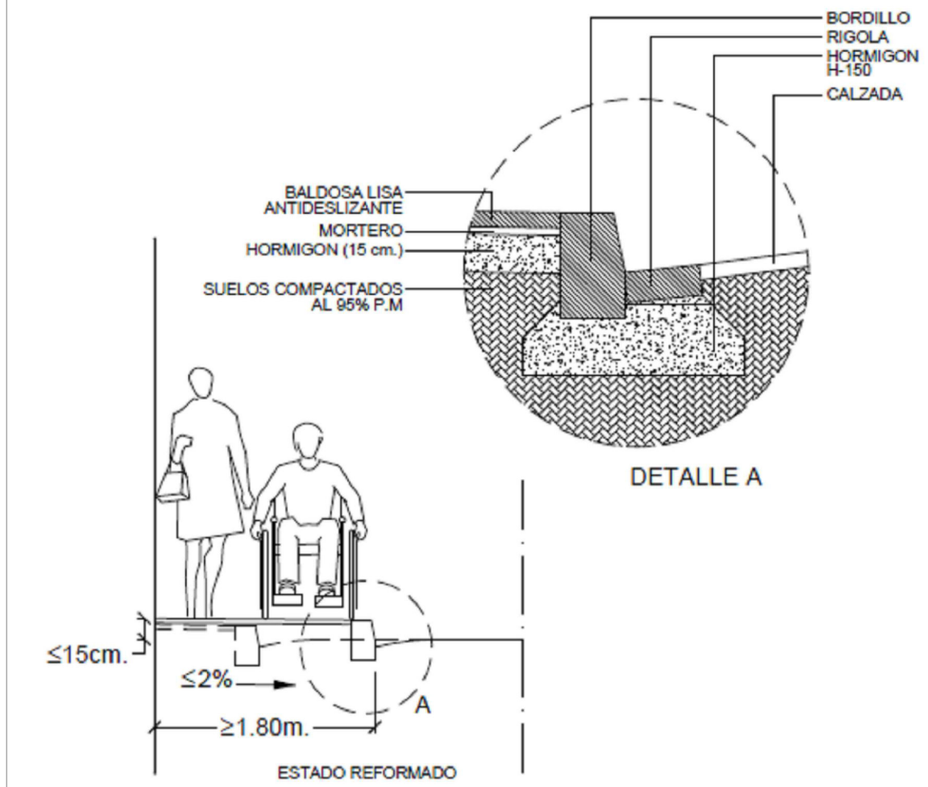

ESQUEMA ENSANCHAMIENTO DE ACERA

ACTUACIONES:
EIVISSA
- E1.01

DETALLES DE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE ACUERDO CON LA ORDEN TMA/851/2021

Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES

TITULO DEL PROYECTO
"ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA APB EN LOS PUERTOS DE ALCUDIA, MAÓ, EIVISSA Y LA SAVINA"

Nº DE REFERENCIA
PO. : 74.24

ESCALAS:
A1 S/E
A3 S/E

PLANO Nº :
003

DENOMINACION PLANO :
DETALLES

FECHA
JULIO 2024

HOJA Nº :
2 de 2

DIBUJADO POR :
IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU

EL AUTOR DEL DOCUMENTO,
CARLOS TORRALBA FELIU
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS
VICTOR DARDER GALLARDO
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

VºBº
EL DIRECTOR
ANTONIO GINARD LÓPEZ
ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

IDOM

ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS EN EL PERIODO DE 2023 Y 2024

Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina.

P.O.74.24

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Septiembre de 2024

Enc. P/103731

TABLA DE REVISIONES

Edición	Fecha	Redactado	Revisado	Verificado	Objeto de Edición
1	02/10/23	ACA	CTF	MPT	
2	11/03/24	ACA	CTF	MPT	
3	24/07/24	AGA	CTF	MPT	
4	02/09/24	AGA	CTF	MPT	

ÍNDICE

1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 7

1.1 Objeto del pliego 7

1.2 Normativa de aplicación 7

1.2.1 Generales 7

1.2.2 Accesibilidad 7

1.2.3 Edificación y obra civil 8

1.2.4 Portuario 8

1.2.5 Seguridad y salud 8

1.2.6 Medio ambiente 9

1.2.7 Residuos 9

1.3 Omisiones a la documentación 9

1.4 Descripción de las obras 9

1.4.1 Puerto de Alcudia 9

1.4.2 Puerto de Maó 11

1.4.3 Puerto de Eivissa 12

1.4.4 Puerto de La Savina 14

2 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LA MDO. Y LOS MATERIALES 16

2.1 Neutros 16

2.2 Arenas 17

2.3 Cementos 26

2.4 Cales 35

2.5 Lechadas y materiales para rejuntado 39

2.6 Hormigones estructurales en masa 43

2.7 Hormigones estructurales para armar 56

2.8 Hormigones de uso no estructural 68

2.9 Morteros con aditivos 72

2.10 Clavos 79

2.11 Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos 80

2.12 Lata 83

2.13 Tablero 85

2.14 Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas 95

2.15 Piezas rectas de hormigón para bordillos 111

2.16 Piezas curvas de hormigón para bordillos 115

2.17 Losetas de mortero de cemento 119

2.18 Pasamanos para barandillas 123

2.19 Barandillas de acero inoxidable 126

2.20 Materiales para señalización horizontal 127

2.21 Señales 133

2.22 Carteles 138

2.23 Materiales auxiliares para protecciones de vialidad 142

3 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 152

3.1 Actuaciones previas y demoliciones 152

3.1.1 Desmontajes y arranques de pavimentos y soleras 152

3.1.2 Derribos de estructuras 154

3.1.3 Demoliciones de elementos de vialidad 157

3.1.4 Desmontajes, arranques y demoliciones de elementos de seguridad, protección y señalización 159

3.1.5 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición a instalación autorizada de gestión de residuos 161

3.2 Actuaciones de mejora de accesibilidad 163

3.2.1 Pavimentos de losetas de mortero de cemento 163

3.2.2 Bordillos rectos con piezas de hormigón 166

3.2.3 Bordillos curvos con pieza de hormigón 168

3.2.4 Base de hormigón 170

3.2.5 Pavimentos de piezas cerámicas 172

3.2.6 Estructuras de hormigón 176

3.2.7 Señalización horizontal 185

3.2.8 Señales de información y dirección 192

3.2.9 Elementos auxiliares para señalización vertical 194

3.2.10 Barandillas de acero inoxidable 198

3.2.11 Bancos 202

3.2.12 Pilonas 204

3.2.13 Puerta cortafuegos de hojas batientes, colocada 206

3.2.14 Hoja batiente para puerta de entrada, de madera, colocada 208

3.2.15 Hoja batiente para puerta exterior, de madera, colocada 210

3.2.16 Materiales para cerramientos practicables de madera 212

3.2.17 Materiales para cerramientos practicables de acero en perfiles laminados 214

3.2.18 Cerramiento de vidrio de abertura automática, colocado (D) 217

3.2.19 Cierrapuertas para puerta de vidrio, colocado 219

3.2.20 Inodoros 220

3.2.21 Lavabos 222

3.2.22 Grifería y accesorios para lavabos 224

3.2.23 Secamanos 227

4 CONDICIONES DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 229

4.1 Unidades de obra no reseñadas. Partidas alzadas a justificar 229

4.2 Partidas alzadas de abono íntegro 229

4.3 Puerto Alcudia 229

4.3.1 Oficinas APB 229

4.3.2 Estación marítima 231

4.3.3 Lonja 232

4.4 Puerto Maó 234

4.4.1 EM Cruceros 234

4.4.2 EM Cos Nou 235

4.5 Puerto de Eivissa 236

4.5.1 APB 236

4.5.2 Estación Marítima 237

4.5.3 Edificio Martillo 238

4.6 Puerto de La Savina 239

4.6.1 Estación marítima 239

4.7 Partida de abono integro en Seguridad y Salud 240

4.7.1 Seguridad y salud 240

5 DISPOSICIONES GENERALES 241

5.1 Comprobación del replanteo 241

5.2 Plazo para comenzar a ejecutar las obras 241

5.3 Ejecución de las obras 242

5.4 Recepción de los trabajos 242

5.5 Liquidación de la obra 243

5.6 Propiedad industrial y comercial 243

5.7 Medidas de seguridad 243

5.8 Obligaciones de carácter social 244

5.9 Seguro de obra 244

5.10 Organización y policía de las obras 245

5.11 Interferencia con la explotación portuaria 245

5.12 Inadecuada colocación de materiales 245

5.13 Señalización de las obras 245

5.13.1 Señales luminosas y operaciones 246

5.13.2 Balizas y miras 246

5.14 Retirada de las instalaciones provisionales de obra 246

5.15 Obligaciones generales 247

5.16 Permisos y licencias 247

5.17 Gastos de cuenta del contratista 247

5.18 Programa de trabajo 248

5.19 Personal técnico afecto a las obras 249

5.20 Libros de órdenes y de incidencias 249

5.21 Subcontratistas o destajistas 249

5.22 Contradicciones, omisiones o errores 250

5.23 Ensayos 250

5.24 Materiales 251

5.25 Equipos y maquinaria 251

5.26 Relaciones valoradas y certificaciones 252

5.27 Relaciones legales y responsabilidades con el público 252

5.28 Documentación a presentar 253

5.29 Documentación fotográfica 254

6 CONSIDERACIÓN FINAL 255

1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

1.1 Objeto del pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares constituye junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que definen las condiciones que han de reunir los materiales, la ejecución y control de las obras, y la medición y abono de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto de "**Actuaciones para la mejora de la accesibilidad de los edificios públicos de la APB en los puertos de Alcudia, Maó, Eivissa y La Savina" P.O.74.24.**

1.2 Normativa de aplicación

Serán de aplicación, en su caso como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego, siempre que no modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica, todas las disposiciones, normas y legislación que tengan referencia con las obras a realizar, entre las que se destacan, sin carácter exhaustivo, las siguientes:

1.2.1 Generales

- Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Con carácter supletorio, se aplicará:

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
- Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas

1.2.2 Accesibilidad

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. (Normativa Nacional).
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (Normativa Nacional).
- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
- Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia.
- Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, únicamente en el texto no derogado por la Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears, en particular el capítulo III del título I («Barreras arquitectónicas en los medios de transporte»), en todo lo que no se oponga al Real decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de las formas de transporte para personas con discapacidad.

1.2.3 Edificación y obra civil

- Código estructural, aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de Junio.
- NCSE-02: Norma de construcción Sismo-resistente: Parte general y edificación (Real decreto 997/2002, de 27 de septiembre)

1.2.4 Portuario

- CTE DB SE-AE: Código Técnico de Edificación Documento Básico Seguridad Estructural: Acciones en la edificación.
- CTE DB SE: Código Técnico de Edificación Documento Básico Seguridad Estructural

1.2.5 Seguridad y salud

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, modificado por el Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre
- Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, modificada por última vez por la Ley 32/2010 de 5 de agosto.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, modificado por última vez por el Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo

1.2.6 Medio ambiente

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
- Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

1.2.7 Residuos

- Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

1.3 Omisiones a la documentación

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en Planos o viceversa, habrá de ejecutarse como si estuviera en ambos documentos. En caso de discrepancia, se estará a lo que disponga el Director de Obra.

1.4 Descripción de las obras

1.4.1 Puerto de Alcudia

Se recogen a continuación el listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso público, agrupados según la codificación original del *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia*.

- E1: En este grupo se incluyen actuaciones relativas a corregir la accesibilidad a los edificios.
- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E3: Se incluye la mejora de accesibilidad de los vestíbulos.
- E5: Las actuaciones consisten en la adecuación de las puertas de paso.
- E6: Se estudian las medidas para mejorar la accesibilidad de los pasillos, pasarelas y áreas de conexión existentes entre los diferentes ámbitos de los edificios.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E10. Se analizan en este apartado las escaleras mecánicas existentes en la Estación Marítima.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E17: Se comprueba que los asientos garanticen comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas en las áreas de espera.

- E22: Se analizan los controles de paso y seguridad.

Se incluye información específica adicional de cada una de las deficiencias detectadas en el Anejo Nº1 Antecedentes, donde se han extraído de los documentos de *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina*, preparados por IDP, las fichas relevantes cuyas actuaciones se incluyen en el presente proyecto.

A continuación, se presenta el listado de actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación de las deficiencias detectadas:

Actuaciones previas

En el puerto de Alcudia, se requieren ejecutar las siguientes actuaciones previas:

- Demolición de estructura del mostrador no accesible con medios manuales.
- Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales.
- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales.
- Repicado de superficie de hormigón.
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos.

Actuaciones de mejora de accesibilidad

Con el fin de mejorar la accesibilidad, se proyectan las siguientes actuaciones, que deberán ser llevadas a cabo de acuerdo con las indicaciones recogidas en la Orden TMA/851/2021, y según detalle de planos:

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado.
- Suministro y colocación de puerta interior de madera para un hueco de obra existente.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Reposición pavimento de loseta para acera similar a las losetas existentes, para las actuaciones de adecuación de mostradores no accesibles.
- Colocación de baldosas con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura, en zonas próximas a paso de peatones y vados peatonales. Además, también se emplean en la entrada y salida de rampas y escaleras, tendrán una anchura igual a la de la rampa y escalera, así como, frente a los mostradores de atención al cliente. La profundidad será hasta edificación existente o si no la hubiere, de 4 metros.

- Colocación de tubo de acero galvanizado de señal vertical, colocado en tierra hormigonado.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.
- Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
- Desmontaje, traslado y posterior montaje de señal existente.
- Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, dos hojas batientes, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible.
- Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible.
- Instalación de puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de dimensiones adecuadas para el hueco de obra.
- Formación de rampa compuesta por recrecido de hormigón de 15 cm de espesor medio y suministro y colocación de pavimento cerámico, recibido con mortero adhesivo, previa preparación de la superficie a la colocación.
- Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada.

1.4.2 Puerto de Maó

Se recogen a continuación el listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso público, agrupados según la codificación original del *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Maó.*

- E1: En este grupo se incluyen actuaciones relativas a corregir la accesibilidad a los edificios.
- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E3: Se incluye la mejora de accesibilidad de los vestíbulos.
- E5: Las actuaciones consisten en la adecuación de las puertas de paso.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E8: Se estudian las rampas interiores de los edificios
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.

- E17: Se comprueba que los asientos garanticen comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas en las áreas de espera.
- E24: Se estudia los baños adaptados situados en el interior de los edificios.
- E25: En esta ficha se analiza el diseño de los vestuarios con el objetivo de que garantice la utilización segura y cómoda por parte de cualquier usuario.

Se incluye información específica adicional de cada una de las deficiencias detectadas en el Anejo Nº1 Antecedentes, donde se han extraído de los documentos de *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina*, preparados por IDP, las fichas relevantes cuyas actuaciones se incluyen en el presente proyecto.

A continuación, se presenta el listado de actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación de las deficiencias detectadas:

Actuaciones previas

- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos

Actuaciones de mejora de accesibilidad

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.
- Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.

1.4.3 Puerto de Eivissa

Se recogen a continuación el listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso público, agrupados según la codificación original del *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Eivissa.*

- E1: En este grupo se incluyen actuaciones relativas a corregir la accesibilidad a los edificios.
- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.

- E3: Se incluye la mejora de accesibilidad de los vestíbulos.
- E5: Las actuaciones consisten en la adecuación de las puertas de paso.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E8: Se estudian las rampas interiores de los edificios
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E17: Se comprueba que los asientos garanticen comodidad, seguridad e igualdad de uso a todas las personas en las áreas de espera.

Se incluye información específica adicional de cada una de las deficiencias detectadas en el Anejo Nº1 Antecedentes, donde se han extraído de los documentos de *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina*, preparados por IDP, las fichas relevantes cuyas actuaciones se incluyen en el presente proyecto.

A continuación, se presenta el listado de actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación de las deficiencias detectadas:

Actuaciones previas

- Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales.
- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos

Actuaciones de mejora de accesibilidad

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.
- Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado.
- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Colocación de baldosas con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura, en zonas próximas a paso de peatones y vados peatonales. Además, también se emplean en la entrada y salida de rampas y escaleras, tendrán una anchura igual a la de la rampa y escalera, así como, frente a los mostradores de atención al cliente. La profundidad será hasta edificación existente o si no la hubiere, de 4 metros.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.

- Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA 1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.
- Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
- Suministro y colocación de marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor.

1.4.4 Puerto de La Savina

Se recogen a continuación el listado de actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad de los edificios de uso público, agrupados según la codificación original del *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de La Savina.*

- E2: Estas actuaciones están relacionadas con la sustitución o adecuación de las puertas de acceso a los edificios.
- E7: Se analiza las escaleras fijas de uso habitual existentes en los diferentes edificios.
- E9: Se incluye la adecuación de las barandillas, los pasamanos y los zócalos de los edificios.
- E12: En esta ficha se adecua los ascensores de los edificios.
- E14: En esta ficha se estudian los mostradores de atención presentes en los edificios.
- E24: Se estudia los baños adaptados situados en el interior de los edificios.

Se incluye información específica adicional de cada una de las deficiencias detectadas en el Anejo Nº1 Antecedentes, donde se han extraído de los documentos de *Plan estratégico para la mejora de la accesibilidad en el ámbito portuario de Alcudia, Eivissa, Maó y La Savina*, preparados por IDP, las fichas relevantes cuyas actuaciones se incluyen en el presente proyecto.

A continuación, se presenta el listado de actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación de las deficiencias detectadas:

<u>Actuaciones previas</u>

- Desmontaje de mostrador no accesible con medios manuales
- Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuos

<u>Actuaciones de mejora de accesibilidad</u>

- Instalación de pasamanos formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, con soportes fijados a los pilares anclados al suelo. Para adecuación de escaleras y rampas.
- Instalación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm.

- Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento.
- Colocación de baldosas con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura, en zonas próximas a paso de peatones y vados peatonales. Además, también se emplean en la entrada y salida de rampas y escaleras, tendrán una anchura igual a la de la rampa y escalera, así como, frente a los mostradores de atención al cliente. La profundidad será hasta edificación existente o si no la hubiere, de 4 metros.
- Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
- Instalación de bucle de inducción magnética.
- Ejecución del mostrador de atención al público accesible.

2 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LA MDO. Y LOS MATERIALES

2.1 Neutros

1. Definición y características de los elementos

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes:

- Elaboración de hormigón
- Elaboración de mortero
- Elaboración de pasta de yeso
- Riego de plantaciones
- Conglomerados de grava-cemento, tierra-cemento, grava-emulsión, etc.
- Humectación de bases o subbases
- Humectación de piezas cerámicas, de cemento, etc.

Características generales:

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica.

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales.

Se podrá utilizar agua reciclada proveniente del lavado de los camiones hormigonera en la propia central de hormigón, siempre que cumpla las especificaciones anteriores y su densidad sea <= 1,3 g/m3 y la densidad total sea <=1,1 g/cm3

El agua a utilizar ya sea en el curado como en el amasado del hormigón, no debe contener ninguna sustancia perjudicial en cantidades que puedan afectar a las propiedades del hormigón o a la protección del armado.

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que cumple todas y cada una de las siguientes características:

- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952): >= 5
- Total de sustancias disueltas (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956)
- Cemento SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Otros tipos de cemento: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ión cloro, expresado en Cl- (UNE 7178)
- Agua para hormigón armado: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Agua para hormigón pretensado: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Agua para hormigón en masa con armadura de fisuración: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidratos de carbono (UNE 7132): 0

- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.

3. Normativa de obligado cumplimiento

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

4. Condiciones de control de recepción

Operaciones de control:

Antes del inicio de la obra y si no se tienen antecedentes del agua que se va a utilizar, o se tienen dudas, se analizará el agua para determinar:

- Potencial de hidrógeno pH (UNE 83952)
- Contenido de sustancias disueltas (UNE 83957)
- Contenido de sulfatos, expresados en SO4 (UNE 83956)
- Contenido de ión Cl- (UNE 7178)
- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132)
- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235)
- En caso de utilizar agua potable de la red de suministro, no será obligatorio realizar los ensayos anteriores.

En otros casos, la Dirección Facultativa o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de hormigón preparado o de prefabricados, dispondrá la realización de los ensayos en laboratorios contemplados en el Código Estructural.

Criterios de toma de muestras:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la Dirección Facultativa y el Código Estructural, realizándose la toma de muestras según la UNE 83951.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

No se aceptará el agua que no cumpla las especificaciones, ni para el amasado ni para el curado

2.2 Arenas

1. Definición y características de los elementos

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas, mármoles blancos y duros, o arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción o demoliciones en una planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Arena de mármol blanco
- Arena para confección de hormigones, de origen:
    - De piedra caliza
    - De piedra granítica
- Arena para la confección de morteros
- Arena para relleno de zanjas con tuberías
- Arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones

Características generales:

El contratista someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa las canteras o depósitos origen de los áridos, aportando todos los elementos justificativos que considere convenientes o que le sean requeridos por la Dirección Facultativa, entre otros:

- Clasificación geológica.
- Estudio de morfología.
- Aplicaciones anteriores.

La Dirección Facultativa podrá rechazar todas las procedencias que, según su criterio, obligarían a un control demasiado frecuente de los materiales extraídos.

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica.

La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca explícitamente la Dirección Facultativa.

No tendrá margas u otros materiales extraños.

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0%

Contenido de materia orgánica (UNE-EN 1744-1): Color más claro que el patrón

Contenido de terrones de arcilla (UNE 7133): <= 1% en peso

Los áridos no han de ser reactivos con el cemento. No se utilizarán áridos procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc., ni las que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc., en cantidades superiores contempladas en el Código Estructural.

Los áridos reciclados deberán cumplir con las especificaciones en el Código Estructural. Además, los que provengan de hormigones estructurales sanos, o de resistencia elevada, serán adecuados para la fabricación de hormigón reciclado estructural, cumpliendo una serie de requisitos:

- Dimensión mínima permitida = 4 mm
- Terrones de arcilla para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 0,6%
- Terrones de arcilla para un hormigón con 100% de árido reciclado: <= 0,25%
- Absorción de agua para un hormigón con menos del 20% de árido reciclado: <= 7%
- Absorción de agua para un hormigón con más del 20% de árido reciclado: <= 5%
- Coeficiente de Los Ángeles: <= 40
- Contenidos máximos de impurezas:
- Material cerámico: <= 5% del peso
- Partículas ligeras: <= 1% del peso
- Asfalto: <= 1% del peso
- Otros: <= 1,0 % del peso

En los valores de las especificaciones no citadas, se mantienen los establecidos en el Código Estructural.

Arena de mármol blanco:

Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol: 0%

Arena para la confección de hormigones:

Se denomina arena a la mezcla de las diferentes fracciones de árido fino que se utilizan para la confección del hormigón

Designación: d/D - IL - N

d/D: Fracción granulométrica, d tamaño mínimo y D tamaño máximo

IL: Presentación, R rodado, T triturado (machaqueo) y M mezcla

N: Naturaleza del árido (C, calcáreo; S, silicio; G,granítico; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial y R, reciclado

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en peso

Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1): <= 1% en peso

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146507-2)

Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1): <= 0,8 en peso

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1):

- Hormigón armado o en masa con armaduras de fisuración: <= 0,05% en peso
- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso

Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento

Estabilidad (UNE-EN 1367-2):

- Pérdida de peso con sulfato sódico: <= 10%
- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15%

Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2) cuando el hormigón esté sometido a una clase de exposición H o F, y el árido fino tenga una absorción de agua >1%: <= 15%

Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)

- Para hormigones de alta resistencia: < 40
- Hormigones en masa o armados con Fck<=30 N/mm2: < 50

Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del hormigón. Para comprobarlo, en primer lugar, se realizará un análisis petrográfico para obtener el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar. Si de este estudio se deduce la posibilidad de reactividad álcali sílice o álcali silicato, se realizará el ensayo descrito en la UNE 146.508 EX. Si el tipo de reactividad potencial es de álcali carbonato, se realizará el ensayo según la UNE 146.507 EX parte 2.

La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida dentro del huso siguiente:

	Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices						
Límites	4 mm	2 mm	1 mm	0,5 mm	0,25 mm	0,125 mm	0,063 mm
Superior	0	4	16	40	70	77	(1)
Inferior	15	38	60	82	94	100	100

(1) Este valor varía en función del tipo y origen del árido.

<u>Arena de piedra granítica para la confección de hormigones:</u>

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Árido grueso:
  - Cualquier tipo: <= 1,5% en peso

- Árido fino:
  - Árido redondeado: <= 6% en peso
  - Árido de machaqueo no calcáreo para obras sometidas a exposición IIIa, b, c, IV u otra clase específica: <= 6% en peso
  - Árido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 10% en peso

Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Para obras en ambientes I, IIa,b o ninguna clase específica de exposición: >= 70
- Otros casos: >= 75

Absorción de agua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

Arena de piedra caliza para la confección de hormigones:

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Árido grueso:
  - Cualquier tipo: <= 1,5% en peso
- Árido fino:
  - Árido redondeado: <= 6% en peso
  - Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición IIIa,b,c,IV o alguna clase específica: <= 10% en peso
  - Árido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase especifica de exposición: <= 16% en peso

Valor azul de metileno (UNE 83130):

- Para obras sometidas a exposición I,IIa,b o ninguna clase específica de exposición: <= 0,6% en peso
- Resto de casos: <= 0,3% en peso

Arena para la confección de morteros:

La composición granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:

Tamiz UNE 7-050 mm	Porcentaje en peso que pasa por el tamiz	Condiciones
5,00	A	A = 100
2,50	B	60 <= B <= 100
1,25	C	30 <= C <= 100

0,63	D	15 <= D <= 70
0,32	E	5 <= E <= 50
0,16	F	0 <= F <= 30
0,08	G	0 <= G <= 15
Otras condi-ciones		C - D <= 50 D - E <= 50 C - E <= 70

Medida de los gránulos: <= 1/3 del espesor de la junta

Contenido de materias perjudiciales: <= 2%

Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones:

El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de residuos de la construcción.

El material no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de empleo.

No han de dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

Se ha considerado que su uso será para rellenos de zanjas con tuberías.

Para cualquier otra utilización se requiera la aceptación expresa de la Dirección Facultativa y la justificación mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones requeridas para el uso al que se pretende destinar.

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.

Cada remesa de arena se descargará en una zona, ya preparada, de suelo seco.

Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado.

Los áridos se han de almacenar de tal modo que queden protegidos frente a la contaminación, y evitando su posible segregación, sobre todo durante su transporte. Se recomienda almacenarlos bajo techado para evitar los cambios de temperatura del árido y en un terreno seco y limpio destinado al acopio de los áridos. Las arenas de otro tipo se almacenarán por separado.

3. Normativa de obligado cumplimiento

Arena para la confección de hormigones:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Arena para la confección de morteros:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

Áridos procedentes del reciclaje de residuos de la construcción y demoliciones:

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Arenas para otros usos:

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcado y control de la documentación:

La entrega de árido en obra deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por el suministrador, en la que han de constar como mínimo los siguientes datos:

- Identificación del suministrador
- Número del certificado de marcado CE o indicación de autoconsumo
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la cantera
- Fecha de la entrega
- Nombre del peticionario
- Designación del árido según el Código Estructural
- Cantidad de árido suministrado
- Identificación del lugar de suministro

El fabricante deberá proporcionar la información relativa a la granulometría y a las tolerancias del árido suministrado.

El suministrador pondrá a disposición de la Dirección Facultativa si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Función: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que

deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro,

- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros trabajos de obras públicas de Función: Aplicaciones que exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:
    - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones
- Productos para edificios, fabricación de productos de hormigón prefabricado, carreteras y otros trabajos de obras públicas de Función: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro,
- Productos para carreteras y otros trabajos de obras públicas y edificación de Función: Aplicaciones que no exigen requisitos de seguridad muy estrictos*. * Requisitos que deben ser definidos por leyes, reglamentos y normas administrativas nacionales de cada estado miembro:
    - Sistema 4: Declaración de Prestaciones

El símbolo de marcado de conformidad CE debe estamparse conforme la Directiva 93/68CE y debe estar visible sobre el producto o sobre etiqueta, embalaje o documentación comercial y debe ir acompañado de la siguiente información:

- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca de identificación y dirección del fabricante
- Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto)
- Designación del producto
- Información de las características esenciales aplicables

En la documentación del marcado deberá constar:

- Nombre del laboratorio que realiza los ensayos
- Fecha de emisión del certificado
- Garantía de que el trato estadístico es el exigido en el marcado
- Estudio de finos que justifique experimentalmente su uso, en el caso de haber áridos que no cumplan con el Código Estructural.

El árido reciclado deberá incluir en su documentación:

- Naturaleza del material
- Planta productora del árido y empresa transportista del escombro
- Presencia de impurezas
- Detalles de su procedencia
- Otra información que resulte relevante

<u>Operaciones de control:</u>

Los áridos deberán disponer del marcado CE, de tal modo que la comprobación de la idoneidad para su uso se hará mediante un control documental del marcado para determinar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y del Código Estructural.

En el caso de los áridos de autoconsumo, el Constructor o el Suministrador deberán aportar un certificado de ensayo, de cómo máximo tres meses de antigüedad, realizado en un laboratorio de control de los contemplados en el Código Estructural, que verifique el cumplimiento de las especificaciones del árido suministrado con la normativa.

La Dirección Facultativa podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante ensayos.

La Dirección Facultativa, además, valorará si realizar una inspección a la planta de fabricación, a poder ser, antes del suministro del árido, para comprobar la idoneidad para su fabricación. En caso necesario, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos siguientes para verificar la conformidad de las especificaciones:

- Materia orgánica (UNE-EN 1744-1).
- Terrones de arcilla (UNE 7133).
- Material retenido por el tamiz 0.063 UNE (UNE EN 933-2) y que flota en un líquido de peso específico 2 (UNE EN 1744-1).
- Compuestos de azufre (SO3)- respecto al árido seco (UNE-EN 1744-1).
- Sulfatos solubles en ácido (UNE-EN 1744-1).
- Contenido de Ión CL- (UNE-EN 1744-1).
- Ensayo petrográfico
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507 y UNE 146-508).
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8).
- Absorción de agua (UNE-EN 1097-6).
- Ensayo de identificación por rayos X.
- Pérdida de peso con sulfato magnésico (UNE-EN 1367-2)
- Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-2)
- Coeficiente de friabilidad (UNE 83115)

Una vez se haya realizado el acopio, se realizará una inspección visual, y si es considera necesario, se tomarán muestras para realizar los ensayos correspondientes.

Se podrá aceptar la arena que no cumpla con los requisitos siempre y cuando mediante lavado, cribado o mezcla, se alcancen las condiciones exigidas.

Criterios de toma de muestras:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la Dirección Facultativa y el Código Estructural.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

No se aceptará la arena que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego de condiciones. Si la granulometría no se ajusta a la utilizada para el establecimiento de las dosificaciones aprobadas, se deberán proyectar y aprobar nuevas fórmulas de trabajo.

No se utilizarán áridos finos que tengan un equivalente de arena inferior a:

- 70, en obras sometidas a las clases I, IIa, o IIb, y no sometidas a las clases específicas de exposición
- 75, en los otros casos

En el caso de las arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas o de rocas dolomíticas que no cumplan con la especificación del equivalente de arena, se podrán aceptar si el ensayo del azul de metileno (UNE-EN 933-9) cumple lo siguiente:

- Para obras con clase general de exposición I, IIa o IIb (y sin clase específica): <= 0,6% en peso
- Resto de casos: <= 0,3% en peso

Si el valor del azul de metileno fuera superior a los valores anteriores, y se presenten dudas de la presencia de arcilla en los finos, se podrá realizar un ensayo de rayos X para su detección e identificación: se podrá emplear el árido fino si las arcillas son del tipo caolinita o illita, y si las propiedades del hormigón con este árido son las mismas que las de uno que tenga los mismos componentes, pero sin los finos.

Se podrán utilizar arenas rodadas, o procedentes de rocas de machaqueo, o escorias siderúrgicas adecuadas, en la fabricación de hormigón de uso no estructural.

2.3 Cementos

1. Definición y características de los elementos

Conglomerante hidráulico formado por diferentes materiales inorgánicos finamente divididos que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratación, endurece y una vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.

Se consideran los cementos regulados por la norma RC-08 con las siguientes características:

- Cementos comunes (CEM)
- Cementos de aluminato de calcio (CAC)
- Cementos blancos (BL)
- Cementos resistentes al agua de mar (MR)

<u>Características generales:</u>

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo en su composición.

El cemento será capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y áridos, de producir un mortero o un hormigón que conserve su trabajabilidad durante un tiempo

suficientemente largo y alcanzar, al cabo de períodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar estabilidad de volumen a largo plazo.

No tendrá grumos ni principios de aglomeración.

En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con lo establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizarán o comercializarán cementos con un contenido en cromo (VI) superior a dos partes por millón del peso seco del cemento.

Cementos comunes (CEM):

Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre, 1328/1995 de 28 de julio y 956/2008 de 6 de junio.

Los componentes deberán cumplir los requisitos especificados en el capítulo 5 de la norma UNE-EN 197-1.

Tipos de cementos:

- Cemento Portland: CEM I
- Cemento Portland con adiciones: CEM II
- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM III
- Cemento puzolánico: CEM IV
- Cemento compuesto: CEM V

Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, según el contenido de la adición o mezcla de adiciones presentes en el cemento. Según dicho contenido creciente los subtipos pueden ser A, B o C.

Adiciones del clinker pórtland (K):

- Escoria de horno alto: S
- Humo de sílice: D
- Puzolana natural: P
- Puzolana natural calcinada: Q
- Ceniza volante silícea: V
- Ceniza volante calcárea: W
- Esquisto calcinado: T
- Caliza L: L
- Caliza LL: LL

Relación entre denominación y designación de los cementos comunes según el tipo, subtipo y adiciones:

Denominación	Designación

Cemento Pórtland	CEM I
Cemento Pórtland con escoria	CEM II/A-S
	CEM II/B-S
Cemento Pórtland con humo de sílice	CEM II/A-D
Cemento Pórtland con puzolana	CEM II/A-P
	CEM II/B-P
	CEM II/A-Q
	CEM II/B-Q
Cemento Pórtland con ceniza volante	CEM II/A-V
	CEM II/B-V
	CEM II/A-W
	CEM II/B-W
Cemento Pórtland con esquisto calcinado	CEM II/A-T
	CEM II/B-T
Cemento Pórtland con caliza	CEM II/A-L
	CEM II/B-L
	CEM II/A-LL
	CEM II/B-LL
Cemento Pórtland mixto	CEM II/A-M
	CEM II/B-M
Cemento con escoria de horno alto	CEM III/A
	CEM III/B
	CEM III/C

Cemento puzolánico	CEM IV/A	
	CEM IV/B	
Cemento compuesto	CEM V/A	
	CEM V/B	

En cementos Pórtland mixtos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en cementos puzolánicos CEM IV/A y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales además del clinker deberán ser declarados en la designación del cemento.

La composición de los diferentes cementos comunes será la especificada en el capítulo 6 de la norma UNE-EN 197-1.

Los cementos comunes cumplirán las exigencias mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad especificadas en el capítulo 7 de la norma UNE-EN 197-1.

Cementos de aluminato de calcio (CAC):

Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcáreos.

Estarán sujetos al marcado CE de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 956/2008 de 6 de junio.

Cumplirán las exigencias mecánicas, físicas y químicas especificadas en la norma UNE-EN 14647.

Cementos blancos (BL):

Estarán sujetos al Real Decreto 1313/1988 y serán aquellos definidos en la norma UNE 80305 y homólogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de albañilería) que cumplen con las especificaciones de blancura.

Índice de blancura (UNE 80117): >= 85

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).

La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad que cumplirán los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos comunes en la norma UNE-EN 197-1.

La composición, así como las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que cumplirá el cemento blanco de albañilería (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento homólogo en la norma UNE-EN 413-1.

Cementos resistentes al agua de mar (MR):

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 1989, llevarán el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).

Relación entre denominación y designación de los cementos resistentes al agua de mar según el tipo, subtipo y adiciones:

Denominación	Designación
Cemento portland	I
Cemento portland con escoria	II/A-S
	II/B-S
Cemento portland con humo de sílice	II/A-D
Cemento portland con puzolana	II/A-P
	II/B-P
Cemento portland con ceniza volante	II/A-V
	II/B-V
Cemento con escoria de horno alto	III/A
	III/B
	III/C
Cemento puzolánico	IV/A
	IV/B
Cemento compuesto	V/A
	V/B

Las especificaciones generales en cuanto a composición y a exigencias mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad que cumplirán son las correspondientes a los cementos comunes homólogos de la norma UNE-EN 197-1.

Cumplirán los requisitos adicionales especificados en el capítulo 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: de manera que no se alteren sus características.

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, ventilado, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos:

- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses
- Clases 42,5: 2 meses
- Clases 52,5: 1 mes

3. Normativa de obligado cumplimiento

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcaje y control de la documentación en cementos comunes (cem) y cementos de cal (CAC):

El suministrador pondrá a disposición de la Dirección Facultativa si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para preparación de hormigón, mortero, lechadas y otras mezclas para construcción y para la fabricación de productos de construcción,
- Productos para elaboración de hormigón, mortero, pasta y otras mezclas para construcción y para la fabricación de productos de construcción:
    - Sistema 1+: Declaración de Prestaciones

El símbolo normalizado del marcado CE deberá ir acompañado de la siguiente información:

- número de identificación del organismo certificador que ha intervenido en el control de producción
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante
- número del certificado CE de conformidad
- las dos últimas cifras del año en que el fabricante puso el marcado CE
- Indicaciones que permitan identificar el producto así como sus características y prestaciones declaradas, atendiendo a sus indicaciones técnicas
- referencia a la norma armonizada pertinente
- designación normalizada del cemento indicando el tipo, subtipo, (según los componentes principales) y clase resistente
- en su caso, información adicional referente al contenido en cloruros, al límite superior de pérdida por calcinación de ceniza volante y/o aditivo empleado

Sobre el propio envase el marcado CE se puede simplificar, incluyendo como mínimo los puntos siguientes:

- el símbolo o pictograma del marcado CE
- en su caso, el número del certificado CE de conformidad
- nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante o su representante legal
- los dos últimos dígitos del año en que el fabricante puso el marcado CE
- la referencia al número de la norma armonizada correspondiente

En este caso, la información completa del marcado o etiquetado CE deberá aparecer también en el albarán o la documentación que acompaña al suministro

En el albarán figurarán los siguientes datos:

- número de referencia del pedido
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la instrucción RC-08
- cantidad que se suministra
- en su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE
- fecha de suministro
- identificación del vehículo que lo transporta

Condiciones de marcaje y control de la documentación en cementos blancos (BL) y cementos resistentes al agua de mar (MR):

En el albarán figurarán los siguientes datos:

- número de referencia del pedido
- nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento
- identificación del fabricante y de la empresa de suministro
- designación normalizada del cemento suministrado conforme al Real Decreto 956/2008 de 6 de junio
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
- la fecha de suministro
- identificación del vehículo que lo transporta (matrícula)
- en su caso, el etiquetado correspondiente al marcado CE

En el caso de cementos envasados, estos deben mostrar en sus envases la siguiente información:

- nombre o marca identificativa y dirección completa del fabricante y de la fábrica
- designación normalizada del cemento suministrado conforme a la presente instrucción
- contraseña del Certificado de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
- fechas de fabricación y de envasado (indicando semana y año)
- condiciones específicas aplicables a la manipulación y utilización del producto

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos:

- Inicio y final del fraguado
- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos

Operaciones de control:

La recepción del cemento deberá incluir al menos, dos fases obligatorias:

- Una primera fase de comprobación de la documentación
- Una segunda fase de inspección visual del suministro

Se puede dar una tercera fase, si el responsable de recepción lo considera oportuno, de comprobación del tipo y clase de cemento y de las características físicas químicas y

mecánicas mediante la realización de ensayos de identificación y, si es el caso, de ensayos complementarios.

Para la primera fase, al iniciar el suministro el Responsable de recepción ha de comprobar que la documentación es la requerida. Esta documentación estará comprendida por:

- Albarán u hoja de suministros
- Etiquetado
- Documentos de conformidad, como puede ser el marcaje CE o bien la Certificación de Conformidad del Real Decreto 1313/1988
- Para el caso de los cementos no sujetos al marcaje CE, el certificado de garantía del fabricante firmado.
- Si los cementos disponen de distintivos de calidad, será necesaria también la documentación precisa de reconocimiento del distintivo.

En la segunda fase, una vez superada la fase de control documental, se deberá someter el cemento a una inspección visual para comprobar que no ha sufrido alteraciones o mezclas indeseadas.

La tercera fase se activará cuando se pueda prever posibles defectos o en el caso que el Responsable así lo establezca por haber dado resultados no conformes en las fases anteriores o por haber detectado defectos en el uso de cementos de anteriores remesas.

En este caso se llevarán a cabo, antes de empezar la obra y cada 200 t de cemento de la misma designación y procedencia durante la ejecución, ensayos de acuerdo con lo establecido en los Anejos 5 y 6 de la RC-08.

Criterios de toma de muestras:

Las muestras se tomarán según lo indicado en la RC-08. Para cada lote de control se extraerán tres muestras, una para realizar los ensayos de comprobación de la composición, la otra para los ensayos físicos, mecánicos y químicos y la otra para ser conservada preventivamente.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

A efectos de la fase primera, no se aprobará el uso de cementos los cuales el etiquetado y la documentación no se correspondan con el cemento solicitado, cuando la documentación no esté completa y cuando no se reúnan todos los requisitos establecidos.

A efectos de la segunda fase, no se aprobará el uso de cementos que presenten síntomas de meteorización relevante, que contengan cuerpos extraños y que no resulte homogénea en su aspecto o color.

A efectos de la tercera fase, no se aprobará el uso de cementos que no cumplan los criterios establecidos en el apartado A5.5 de la RC-08.

Cuando no se cumpla alguna de las prescripciones del cemento ensayado, se repetirán los ensayos por duplicado, sobre dos muestras obtenidas del acopio existente en obra. Se aceptará el lote únicamente si los resultados obtenidos en las dos muestras son satisfactorios.

2.4 Cales

1. Definición y características de los elementos

Conglomerante obtenido por calcinación de materiales calizos, compuesto principalmente por óxidos o hidróxidos de calcio con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio y cantidades menores de óxidos de silicio, hierro y aluminio.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Cal apagada en pasta CL 90
- Cal aérea CL 90
- Cal hidráulica natural NHL 2
- Cal hidráulica natural NHL 3,5
- Cal hidráulica natural NHL 5

Cal apagada en pasta:

Si es apagada en pasta, estará apagada y mezclada con agua, con la cantidad justa para obtener una pasta de consistencia adecuada al uso que se destine.

No tendrá grumos ni principios de aglomeración.

Cal aérea CL 90:

Si contiene aditivos, éstos no afectarán a las propiedades de los morteros.

Contenido de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en peso

Contenido de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en peso

Contenido de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en peso

Contenido de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en peso

Finura de la molienda para cal en polvo (UNE-EN 459-2)

- Material retenido en el tamiz 0,09 mm: <= 7%
- Material retenido en el tamiz 0,2 mm: <= 2%

Estabilidad de volumen (UNE-EN 459-2)

- Pastas apagadas: Pasa
- Otras cales:
- Método de referencia: <= 20
- Método alternativo: <= 2

Densidad aparente para cal en polvo (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3

Agua libre (humedad) (UNE-EN 459-2) (h):

- Pastas amaradas: 45% < h < 70%
- Otras cales: <= 2%

Requisitos de reactividad y granulometría:

- Retenido por el tamiz de 3 mm: 0%
- Retenido por el tamiz de 2 mm: <=5%
- Reactividad con agua t'60ºC: <= 15 min.

Cal hidráulica natural:

Contenido de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa

(un contenido de SO3 >3% y <7% es admisible, a condición de que la estabilidad sea confirmada después de 18 días de conservación en agua, según el ensayo dado en la norma UNE-EN 196-2)

Contenido de cal libre (UNE-EN 459-2):

- Cal del tipo NHL 2: >= 15% en peso
- Cal del tipo NHL 3,5: >= 9% en peso
- Cal del tipo NHL 5: >= 3 % en peso

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: Se transportará en cisternas presurizadas dotadas de medios neumáticos o mecánicos que permitan el rápido trasiego a silos de almacenaje. Estos serán estancos.

En las obres de poco volumen el suministro podrá ser en sacos, de manera que no experimenten alteración de sus características.

Almacenamiento: Se tendrán en cuenta las normas indicadas en las fichas de seguridad para las clases de cales. Estas fichas de seguridad deben de ser las recomendadas oficialmente o, en su defecto, las facilitadas por el suministrador.

3. Normativa de obligado cumplimiento

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcado y control de la documentación:

El suministrador pondrá a disposición de la Dirección Facultativa si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para preparación de morteros de fábrica, revestimientos interiores y exteriores y otros productos de construcción:
    - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones

Para cada remesa se requerirá un albarán con una documentación aneja y una hoja de características.

En el embalaje, o bien en el albarán de entrega, deberá constar como mínimo la siguiente información:

- Nombre o marca comercial y dirección del fabricante
- Referencia a la norma UNE-EN 459-1
- Designación de la cal según el apartado 4 de la citada norma
- Fecha de suministro y de fabricación
- Designación comercial y tipo de cal.
- Identificación del vehículo de transporte
- Referencia del pedido
- Cantidad suministrada
- Nombre y dirección del comprador y destino
- Si es el caso, certificado acreditativo del cumplimento de las especificaciones obligatorias y/o acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad.
- Instrucciones de trabajo si fuera necesario
- Información de seguridad si fuera necesaria.
- Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio dónde deberá constar, cómo mínimo:
- Numero identificador del organismo notificado
- Nombre y dirección del fabricante
- Los dos últimos dígitos de la fecha de marcado
- Número del certificado de conformidad
- Referencia a la UNE EN 459-1
- Descripción del producto
- Información sobre los requisitos esenciales.

En la hoja de características deberá figurar al menos:

- Referencia del albarán
- Denominación comercial y tipo de cal
- Contenido de óxidos de calcio y magnesio
- Contenido de dióxidos de carbono
- Finura
- Reactividad

Operaciones de control:

Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Inspección de las condiciones de suministro de la cal, de acuerdo con la norma RCA-92, y recepción del certificado de calidad del fabricante conforme a las especificaciones exigidas.

- Antes de empezar la obra, y cada 500 t de material de las mismas características, se realizarán los ensayos identificativos correspondientes a la designación concreta:

Se extraerán dos muestras, una para realizar los ensayos de recepción y la otra para ensayos de contraste que se conservará al menos cien días.

Los ensayos de recepción serán los siguientes:

- Contenido de óxido cálcico y magnésico (UNE-EN 459-2)

- Contenido de anhídrido carbónico (UNE-EN 459-2)

- Reactividad al agua (UNE 80502):

- Finura de molido (UNE-EN 459-2):

Se realizarán controles adicionales, mensualmente y tres veces cómo mínimo durante la ejecución. Para cada tipo de cal se realizarán obligatoriamente los ensayos de recepción necesarios para comprobar sus características especificas.

Los métodos de ensayo se describen en la UNE-EN 459-2.

Criterios de toma de muestras:

Las muestras se tomarán según lo indicado el PG3 Articulo 200 y los criterios que determine la Dirección Facultativa. De cada lote se extraerán dos muestras, una para realizar los ensayos de recepción y la otra para los ensayos de contraste, que se conservará durante al menos 100 días. Se tomará una tercera muestra si el suministrador de cal lo solicita.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

La Dirección Facultativa indicará las medidas a adoptar en el caso que no se cumplan las especificaciones establecidas en el pliego.

La remesa no se aceptará si, en el momento de abrir el recipiente que la contiene aparece en estado grumoso o aglomerado.

2.5 Lechadas y materiales para rejuntado

1. Definición y características de los elementos

Material formado por la mezcla de un conglomerante, cargas minerales y aditivos, apto para el rellano de juntas entre diferentes materiales, o protege contra la corrosión armaduras activas de elementos pretesados o postesados

Se han considerado los siguientes tipos:

- Mezcla de carácter coloidal compuesta principalmente de cemento, agua y, eventualmente, arena fina y aditivos, utilizadas en estructuras con armaduras pretesadas y postesadas
- Material formado por la mezcla de un conglomerante, cargas minerales y aditivos, apto para rellenar las juntas entre baldosas cerámicas que forman el revestimiento de paredes o pavimentos situados en interior o exterior.
- Se han considerado los siguientes tipos de material para rejuntado de baldosas cerámicas:
- Material de rejuntado cementoso (CG): Mezcla de conglomerante hidráulico, cargas minerales y aditivos orgánicos o inorgánicos, que únicamente necesita incorporar agua o adición líquida en el momento antes de su uso.
- Material de rejuntado de resina reactiva (RG): Mezcla de resines sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos o inorgánicos, que endurecen por una reacción química.

<u>Lechada de cemento:</u>

Los componentes de la lechada: agua, áridos, cemento y aditivos, cumplirán las condiciones generales como componentes del hormigón, además de las indicadas en este apartado.

Se establecerá la fórmula de trabajo de la lechada, que incluirá como mínimo, los siguientes datos:

- La granulometría de los áridos (si es el caso).
- La dosificación de cemento, agua, áridos y, si es el caso, de cada aditivo, referidas a la mezcla total.
- La resistencia a compresión de la lechada a 28 días.
- La consistencia de la lechada.
- El tiempo de mezcla y amasado.

El cemento tiene que ser del tipo CEM I, preferiblemente, clase 32,5.

En la preparación de la mezcla se dosificarán los materiales sólidos, en peso.

Se prohíbe la elaboración manual de la mezcla.

El tiempo de amasado depende del tipo de aparato mezclador, pero en cualquier caso no será inferior a 2 minutos ni superior a los 4 minutos.

La arena será de granos silícicos o calcáreos y no debe contener impurezas o sustancias perjudiciales como ácidos o partículas laminares como mica o pizarra.

Los aditivos que se usen no contendrán sustancias que puedan perjudicar a las armaduras o a la lechada, como pueden ser los sulfuros, cloruros o nitratos, y cumplirán:

- Contenido: < 0,1%
- Cl < 1 g/l de aditivo del líquido
- pH según fabricante
- Extracto seco ±5% del definido por el fabricante

Las lechadas de inyección cumplirán que:

- El contenido de ion cloruro (Cl-) será <= 0.1% de la masa del cemento
- El contenido de ion sulfato (SO3) será <= 3.5% de la masa del cemento
- El contenido de ion sulfuro (S2-) será <= 0.01% de la masa del cemento

Las lechadas de inyección tendrán las siguientes propiedades según UNE EN 445:

- Fluidez en el cono de Marsh: 17 < F < 25
- Relación agua-cemento: <= 0,5 (óptimo entre 0,36 y 0,44)
- Exudación en probeta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A las 3 h: <= 2% en volumen
- Máxima: <= 4% en volumen
- A les 24 h: 0%
- pH del agua: >= 7
- Contracción en probeta cilíndrica: <= 2% en volumen
- Expansión: <= 10%
- Resistencia a la compresión a los 28 días: >= 300 kg/cm2(30 N/mm2)
- Reducción volumétrica: <= 1%
- Expansión volumétrica: <= 5%
- Resistencia a la compresión a 28 días: >= 30 N/mm2
- Endurecimiento:
- Inicio: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorción capilar a 28 días: > 1 g/cm2

En el caso de vainas o conductos verticales, la relación a/c de la mezcla será superior que la indicada para vainas horizontales.

Lechada para cerámica:

No tendrá grumos ni principios de aglomeración.

Lechada para cerámica de material cementoso (CG):

Se han considerado las siguientes clases en función de las características adicionales:

- CG 1: Material de rejuntado cementoso normal

- CG 2: Material de rejuntado cementoso mejorado, con características adicionales (alta resistencia a la abrasión y absorción de agua reducida)

Características fundamentales:

- Resistencia a la abrasión (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistencia a la flexión (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistencia a la compresión (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracción (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorción de agua (EN 12808-5):
- Después de 30 min: <= 5 g
- Después de 240 min: <= 10 g

Características adicionales:

- Alta resistencia a la abrasión (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorción de agua (EN 12808-5):
- Después de 30 min: <= 2 g
- Después de 240 min: <= 5 g

Lechada para cerámica de resinas reactivas (RG):

- Resistencia a la abrasión (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistencia a la flexión (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistencia a la compresión (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracción (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorción de agua después de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro y almacenaje en la lechada de cemento:

Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus características.

Almacenamiento: No se utilizará una vez pasados 30 min desde el momento de su amasado.

Suministro y almacenaje en la lechada para cerámica:

Suministro: Envasada adecuadamente, de manera que no experimente alteración de sus características.

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.

3. Normativa de obligado cumplimiento

Lechada de cemento:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.

UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.

Lechada para cerámica:

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcaje y control de la documentación en la lechada de cemento:

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la documentación relacionada con los materiales que componen la lechada de cemento, acreditando el marcado CE, según el sistema de evaluación aplicable de los materiales del Código Estructural.

Condiciones de marcado y control de la documentación en la lechada para cerámica:

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:

- Nombre del producto
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento
- Referencia a la norma UNE-EN 13888
- Tipo de material de rejuntado
- Instrucciones de uso:
- Proporciones de mezcla
- Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de realizar la mezcla y el momento en que está listo para ser aplicado
- Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado después de realizar la mezcla
- Modo de aplicación
- Tiempo que ha de transcurrir hasta realizar la limpieza y permitir el uso
- Ámbito de aplicación

Operaciones de control en las lechadas de cemento:

Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Estudio y aprobación de la dosificación de la lechada.

- Control de fabricación de la mezcla: determinación diaria del tiempo de amasado, relación agua/cemento y cantidad de aditivo.
- Antes del inicio de las obras, y cada 10 días durante su ejecución, se realizará:
- Confección y ensayo a compresión a 28 días de 3 probetas (160x40x40 mm) de lechada de cemento, según UNE EN 1015-11.

Criterios de toma de muestras en las lechadas de cemento:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y el Código Estructural.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento en las lechadas de cemento:

No se aceptará la lechada de cemento para inyección de vainas si no se cumplen las especificaciones indicadas.

2.6 Hormigones estructurales en masa

1. Definición y características de los elementos

Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo con las prescripciones del Código Estructural.

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:

- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A

- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el hormigón pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca

- TM: Tamaño máximo del árido en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento)

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado.

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro.

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el Código Estructural.

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener cenizas volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de sílice no podrá exceder del 10%

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el Código Estructural.

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según el Código Estructural y debe poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido

Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450.

Los aditivos deberán ser del tipo que establece el Código Estructural y cumplir la UNE EN 934-2

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.

Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia

Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 32,25))).

Valor mínimo de la resistencia:

- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2

Tipo de cemento:

- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1), Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)

Clase de cemento: 32,5 N

Densidades de los hormigones:

- Hormigones en masa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones del Código Estructural. La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:

- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de hormigón armado: >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3
- En todas las obras: <= 500 kg/m3

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones del Código Estructural. La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:

- Hormigón en masa: <= 0,65
- Hormigón armado: <= 0,65
- Hormigón pretensado: <= 0,60

Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
- Consistencia líquida: 16-20 cm

La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante

Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento

Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al cemento:

- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3

Tolerancias:

- Asiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
- Consistencia fluida: ± 2 cm
- Consistencia líquida: ± 2 cm

<u>Hormigones para pilotes hormigonados "in situ"</u>

Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:

- <= 32 mm
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales

Dosificaciones de amasado:

- Contenido de cemento:
- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3

- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d < 0,125 (cemento incluido):
- Árido grueso d >8 mm: >= 400 kg/m3
- Árido grueso d <=8 mm: >= 450 kg/m3

Consistencia del hormigón:

Asiento cono de Abrams(mm)	Condiciones de uso
130 <= H <= 180	- Hormigón vertido en seco
H >= 160	- Hormigón bombeado, sumergido o vertido bajo agua con tubo tremie
H >= 180	- Hormigón sumergido, vertido bajo

El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.

Hormigones para pantallas hormigonadas "in situ"

Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido:

Tamaño máximo del árido(mm)	Contenido mínimo de cemento(kg)
32	350
25	370
20	385
16	400

Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales

Dosificaciones de amasado:

- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado:
- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):
- Árido grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Árido grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm

El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.

Hormigón para pavimentos

La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá:

- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la mezcla.
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la mezcla total.
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido.

El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 kg/m3, incluido el cemento.

Contenido de cemento: >= 300 kg/m3

Relación agua/cemento: <= 0,46

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 2-6 cm

Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%

En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de aire, y en este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen.

Tolerancias:

- Asentamiento en el cono de Abrams: ± 1 cm

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: En camiones hormigonera.

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.

Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que puedan alterar la composición original.

Almacenaje: No se puede almacenar.

3. Normativa de obligado cumplimiento

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio de 2021, por el que se aprueba el Código Estructural.

Pilotes y pantallas hormigonadas "in situ"

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

Hormigón para pavimentos

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcado y control de la documentación:

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos:

- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha y hora de entrega
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Cantidad de hormigón suministrado
- Hormigones designados por propiedades de acuerdo con el Código Estructural, indicando como mínimo:
    - Resistencia a la compresión

- Tipo de consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente según el Código Estructural.
- Hormigones designados por dosificación según el Código Estructural, indicando como mínimo:
  - Contenido de cemento por m3
  - Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
  - Tipo, clase y marca del cemento
  - Contenido en adiciones
  - Contenido en aditivos
  - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
  - Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay
  - Identificación del cemento, aditivos y adiciones
  - Designación específica del lugar de suministro
  - Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
  - Hora límite de uso del hormigón

Operaciones de control en hormigón estructural:

Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.

Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.

Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el Código Estructural, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8.

Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la dosificación correcta.

Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las condiciones de suministro.

Control estadístico de la resistencia (Código Estructural): Para hormigones sin distintivo de calidad, se realizarán lotes de control de cómo máximo:

- Volumen de hormigonado: <= 100 m3
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:

- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superficie construida <= 500 m2; Número de plantas <= 2
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superficie construida <= 1000 m2; Número de plantas <= 2
- Macizos:
- Tiempo de hormigonado <= 1 semana

El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.

En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento, conforme al Código Estructural.

Control 100x100 (Código Estructural): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que se haga antes del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y calculando el valor de la resistencia característica real.

Control indirecto de la resistencia (Código Estructural): Sólo se podrá aplicar en hormigones que dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:

- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00 metros

Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.

<u>Operaciones de control en hormigón para pavimentos:</u>

Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará:

- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie se determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28 días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 12350-7).

Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En

caso contrario, se deberá esperara los 28 días y se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia.

Control de fabricación y recepción.

- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la frecuencia indicada, los siguientes ensayos:
    - Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:
    - Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)
    - Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)
    - Terrones de arcilla (UNE 7133)
    - Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)
    - Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)
    - Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:
    - Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)
    - Sustancias perjudiciales (Código Estructural)
    - Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo granulométrico (UNE EN 933-1).
    - Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días.
    - Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la temperatura.
    - Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.
    - Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):
    - Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315)
    - Consistencia (UNE 83313)
    - Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)

<u>Criterios de toma de muestras en hormigón estructural:</u>

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y el Código Estructural.

<u>Criterios de toma de muestras en hormigón para pavimentos:</u>

Se seguirán los criterios que, en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se tomará de amasadas diferentes.

Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por la mañana y otro por la tarde

<u>Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento, en hormigón estructural:</u>

No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del pliego.

Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de cada una de las N amasadas controladas de acuerdo con:

- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): <= 30
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el Código Estructural: N >= 1
- Otros casos: N >= 3
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el Código Estructural: N >= 1
- Otros casos: N >= 4
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el Código Estructural: N >= 2
- Otros casos: N >= 6

La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2 <= ... <= xn

En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como un control de identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso tienen por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de garantía muy exigente.

Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si:

f(x) = x K2rN >= fck

donde:

- f(x) Función de aceptación
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
- K2 Coeficiente:

Coeficiente:

- Número de amasadas:
- 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorrido muestral definido como: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas

- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto

Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.

Donde: s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del intervalo correspondiente.

Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.

El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.

Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real corresponde a la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será el valor de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.

Se aceptará cuando: fc,real >= fck

Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez que:

- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad del suministro
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad

<u>Interpretación de resultados y actuación en caso de incumplimiento en hormigón para pavimientos:</u>

- Interpretación de los ensayos característicos:

  Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28 días, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran dentro de los límites establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba con el hormigón correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 días y, en su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la dosificación, repitiéndose los ensayos característicos.

- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:

- El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En otro caso:
- Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.
- Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los correspondientes ensayos de información.
- Ensayos de información:

  Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos (UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de 56 días. La conservación de los testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se realizará según la UNE 83302.

El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará con el resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la resistencia media del lote es superior. En caso de incumplimiento, deben distinguirse tres casos:

- Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista.
- Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista.

Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.

La resistencia de cada amasada a una determinada edad se determinará como media de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un coeficiente dado por la tabla siguiente:

Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):

- 2 séries: 0,88
- 3 séries: 0,91
- 4 séries: 0,93
- 5 séries: 0,95
- 6 séries: 0,96

Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores especificados en la fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado.

2.7 Hormigones estructurales para armar

1. Definición y características de los elementos

Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.

Características de los hormigones de uso estructural:

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo con el Código Estructural.

La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:

- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A

- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el hormigón pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca
- TM: Tamaño máximo del árido en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento)

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado.

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio del suministro.

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el Código Estructural.

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener cenizas volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de sílice no podrá exceder del 10%

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el Código Estructural

La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la producción según el Código Estructural y debe poner los resultados del análisis al alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido

Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN 450.

Los aditivos deberán ser del tipo que establece el Código Estructural y cumplir la UNE EN 934-2

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.

Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia

Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (= 0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 para cementos normales y de endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 32,25))).

Valor mínimo de la resistencia:

- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2

Tipo de cemento:

- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1), Cementos para usos especiales ESP VI-1 (UNE 80307)
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216)

Clase de cemento: 32,5 N

Densidades de los hormigones:

- Hormigones en masa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con el Código Estructural, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:

- Obras de hormigón en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de hormigón armado: >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado: >= 275 kg/m3
- En todas las obras: <= 500 kg/m3

La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con el Código Estructural, en función de la clase de exposición. La relación agua/cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:

- Hormigón en masa: <= 0,65
- Hormigón armado: <= 0,65
- Hormigón pretensado: <= 0,60

Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm

- Consistencia líquida: 16-20 cm

La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante

Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento

Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al cemento:

- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3

Tolerancias:

- Asiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm
- Consistencia fluida: ± 2 cm
- Consistencia líquida: ± 2 cm

Hormigones para pilotes hormigonados "in situ"

Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:

- <= 32 mm
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales

Dosificaciones de amasado:

- Contenido de cemento:
- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d < 0,125 (cemento incluido):
- Árido grueso d >8 mm: >= 400 kg/m3
- Árido grueso d <=8 mm: >= 450 kg/m3

Consistencia del hormigón:

Asiento cono de Abrams(mm)	Condiciones de uso
130 <= H <= 180	- Hormigón vertido en seco

H >= 160	- Hormigón bombeado, sumergido o vertido bajo agua con tubo tremie
H >= 180	- Hormigón sumergido, vertido bajo

El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.

Hormigones para pantallas hormigonadas "in situ"

Contenido mínimo de cemento en función del tamaño máximo del árido:

Tamaño máximo del árido(mm)	Contenido mínimo de cemento(kg)
32	350
25	370
20	385
16	400

Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales

Dosificaciones de amasado:

- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado:
- Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
- Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):
- Árido grueso D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Árido grueso D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm

El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.

Hormigón para pavimentos

La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá:

- La identificación y proporción ponderal (en seco) de cada fracción de árido en la mezcla.
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, agua y, si es el caso de cada aditivo, referidas a la mezcla total.
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y si es el caso, el contenido de aire ocluido.

El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450 kg/m3, incluido el cemento.

Contenido de cemento: >= 300 kg/m3

Relación agua/cemento: <= 0,46

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313): 2-6 cm

Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%

En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de aire, y en este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en volumen.

Tolerancias:

- Asentamiento en el cono de Abrams: ± 1 cm

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: En camiones hormigonera.

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.

Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que puedan alterar la composición original.

Almacenaje: No se puede almacenar.

3. Unidad y criterios de medición

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4. Normativa de obligado cumplimiento

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio de 2021, por el que se aprueba el Código Estructural.

Pilotes y pantallas hormigonadas "in situ"

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

Hormigón para pavimentos

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcado y control de la documentación:

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos:

- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha y hora de entrega
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Cantidad de hormigón suministrado
- Hormigones designados por propiedades de acuerdo con el Código Estructural, indicando como mínimo:
    - Resistencia a la compresión
    - Tipo de consistencia
    - Tamaño máximo del árido
    - Tipo de ambiente según el Código Estructural
    - Hormigones designados por dosificación de acuerdo al Código Estructural, indicando como mínimo:
    - Contenido de cemento por m3
    - Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
    - Tipo, clase y marca del cemento
    - Contenido en adiciones
    - Contenido en aditivos
    - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
    - Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay

- Identificación del cemento, aditivos y adiciones
- Designación específica del lugar de suministro
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
- Hora límite de uso del hormigón

Operaciones de control en hormigón estructural:

Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a compresión y las otras 2 al ensayo de penetración de agua.

Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 días, según UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón procede de central certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.

Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el Código Estructural, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE EN 12390-8.

Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la dosificación correcta.

Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las condiciones de suministro.

Control estadístico de la resistencia (Código Estructural): Para hormigones sin distintivo de calidad, se realizarán lotes de control de cómo máximo:

- Volumen de hormigonado: <= 100 m3
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número de plantas <= 2
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:
- Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2; Número de plantas <= 2
- Macizos:
- Tiempo de hormigonado <= 1 semana

El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, y tendrán la misma dosificación.

En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los valores anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento, conforme al Código Estructural.

Control 100x100 (Código Estructural): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que se haga antes del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se comprueba determinando la misma en todas las amasadas sometidas a control y calculando el valor de la resistencia característica real.

Control indirecto de la resistencia (Código Estructural): Sólo se podrá aplicar en hormigones que dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:

- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00 metros

Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.

Operaciones de control en hormigón para pavimentos:

Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará:

- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie se determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28 días (UNE 83305) y, si se el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 12350-7).

Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso contrario, se deberá esperara los 28 días y se introducirán los ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia.

Control de fabricación y recepción.

- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la frecuencia indicada, los siguientes ensayos:
    - Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:
    - Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)
    - Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)
    - Terrones de arcilla (UNE 7133)
    - Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)
    - Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)

- Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:
- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)
- Sustancias perjudiciales (Código Estructural)
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo granulométrico (UNE EN 933-1).
- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días.
- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la temperatura.
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):
- Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315)
- Consistencia (UNE 83313)
- Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)

Criterios de toma de muestras en hormigón estructural:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y el Código Estructural.

Criterios de toma de muestras en hormigón para pavimentos:

Se seguirán los criterios que, en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se tomará de amasadas diferentes.

Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por la mañana y otro por la tarde

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento, en hormigón estructural:

No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del pliego.

Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de cada una de las N amasadas controladas de acuerdo con:

- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): <= 30
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el apartado 5.1 del Código Estructural: N >= 1
- Otros casos: N >= 3
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el Código Estructural: N >= 1
- Otros casos: N >= 4
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2): >= 50

- Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía conforme con el Código Estructural: N >= 2
- Otros casos: N >= 6

La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2 <= ... <= xn

En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como un control de identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso tienen por objeto comprobar la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy controlada, con una resistencia certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de garantía muy exigente.

Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si:

f(x) = x K2rN >= fck

donde:

- f(x) Función de aceptación
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
- K2 Coeficiente:

Coeficiente:

- Número de amasadas:
- 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorrido muestral definido como: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto

Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.

Donde: s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del intervalo correspondiente.

Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.

El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.

Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real corresponde a la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por exceso. Si el número de amasadas a controlar es igual o inferior a 20, fc,real será el valor de la resistencia de la pastada más baja encontrada en la serie.

Se aceptará cuando: fc,real >= fck

Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez que:

- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad del suministro
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad

<u>Interpretación de resultados y actuación en caso de incumplimiento en hormigón para pavimientos:</u>

- Interpretación de los ensayos característicos:

  Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28 días, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran dentro de los límites establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba con el hormigón correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 días y, en su caso, se introducirán los ajustes necesarios a la dosificación, repitiéndose los ensayos característicos.

- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:
- El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En otro caso:
    - Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.
    - Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los correspondientes ensayos de información.
- Ensayos de información:

  Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos (UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de

56 días. La conservación de los testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se realizará según la UNE 83302.

El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará con el resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la resistencia media del lote es superior. En caso de incumplimiento, deben distinguirse tres casos:

- Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista.
- Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista.

Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.

La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un coeficiente dado por la tabla siguiente:

Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):

- 2 séries: 0,88
- 3 séries: 0,91
- 4 séries: 0,93
- 5 séries: 0,95
- 6 séries: 0,96

Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores especificados en la fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado.

2.8 Hormigones de uso no estructural

1. Definición y características de los elementos

Hormigones que no aportan responsabilidad estructural a la construcción, pero colaboran a mejorar la durabilidad del hormigón estructural (hormigón de limpieza), o aportan el volumen necesario de un material resistente para conformar la geometría requerida para un fin concreto.

Se han considerado los siguientes materiales:

- Hormigones de limpieza, destinado a evitar la contaminación de la armadura y la desecación del hormigón estructural durante el vertido.
- Hormigón no estructural destinado a conformar volúmenes de material resistente

Características generales:

Los cementos que se pueden utilizar en hormigón no estructural son:

- Prefabricados no estructurales: Cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Hormigones de limpieza y relleno de zanjas: Cementos comunes
- Otros hormigones ejecutados en obra: Cemento para usos especiales ESP VI-1 y cementos comunes excepto CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Los áridos a utilizar podrán ser arenas y gravas rodadas o procedentes de rocas machacadas, o escorias siderúrgicas apropiadas. Se podrá emplear hasta un 100 % de árido grueso reciclado, siempre que cumpla con las especificaciones del Código Estructural con respecto a las condiciones físico-mecánicas y a los requisitos químicos.

Se deberán usar aditivos reductores de agua, ya que los hormigones de uso no estructural contienen poco cemento.

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de acuerdo con el Código Estructural.

El control de los componentes se realizará de acuerdo con los ámbitos 0101, 0521, 0531, 0701 y 1011.

Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de cemento.

El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm.

Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM= tamaño máximo del árido.

Los hormigones no estructurales tendrán una resistencia característica mínima de 15 N/mm2, y es recomendable que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm.

Se tipificarán HNE-15/C/TM, donde C= consistencia y TM = tamaño máximo del árido.

Se utilizará preferentemente, hormigón de resistencia 15 N/mm2, a menos que la DF indique lo contrario.

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.

Si se utilizan cenizas volantes, éstas no superarán el 35% del peso del cemento.

Clase resistente del cemento: >= 32,5

Contenido de cemento: >= 150 kg/m3

Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plástica: 3 - 5 cm
- Consistencia blanda: 6 - 9 cm

Tolerancias:

- Asiento en el cono de Abrams:
- Consistencia seca: Nulo
- Consistencia plástica o blanda: ± 1 cm

Tolerancias respecto de la dosificación:

- Contenido de cemento, en peso: ± 3%
- Contenido de áridos, en peso: ± 3%
- Contenido de agua: ± 3%
- Contenido de aditivos: ± 5%
- Contenido de adiciones: ± 3%

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: En camiones hormigonera.

El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.

Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que puedan alterar la composición original.

Almacenaje: No se puede almacenar.

3. Normativa de obligado cumplimiento

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio de 2021, por el que se aprueba el Código Estructural.

4. Condiciones de control de recepción

<u>Condiciones de marcado y control de la documentación:</u>

El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los siguientes datos:

- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Nombre de la central de hormigón

- Identificación del peticionario
- Fecha y hora de entrega
- Cantidad de hormigón suministrado
- Designación del hormigón de acuerdo con el Código Estructural, indicando el tipo (HL para hormigones de limpieza y HNE para hormigones no estructurales) la resistencia a compresión o la dosificación de cemento, la consistencia y el tamaño máximo del árido.
- Dosificación real del hormigón incluyendo como mínimo la siguiente información:
    - Tipo y contenido de cemento
    - Relación agua cemento
    - Contenido en adiciones, en su caso
    - Tipo y cantidad de aditivos
    - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
    - Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados
    - Identificación del lugar de suministro
    - Identificación del camión que transporta el hormigón
    - Hora límite de uso del hormigón

Operaciones de control:

Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Aprobación de la dosificación presentada por el contratista
- Control de las condiciones de suministro.
- Comprobación de la consistencia (cono de Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia de que se fabrica el hormigón con la dosificación correcta.

La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el hormigón que se va a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima de 6 meses.

Criterios de toma de muestras:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y el Código Estructural.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

La dosificación propuesta deberá garantizar la resistencia exigida en el pliego de condiciones.

No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del pliego.

Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del intervalo correspondiente.

Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.

El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.

2.9 Morteros con aditivos

1. Definición y características de los elementos

Mezcla de uno o más conglomerantes con áridos escogidos y aditivos especiales.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Mortero adhesivo
- Mortero sintético de resinas epoxi
- Mortero refractario
- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras
- Mortero de albañilería

El mortero de nivelación es una mezcla de áridos finos, cemento y aditivos orgánicos, que al añadirle agua forma una pasta fluida para extender sobre suelos existentes y hacer una capa de 2 a 5 mm de espesor de superficie plana y horizontal con acabado poroso.

El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante específico para resistir altas temperaturas, utilizado para la colocación de ladrillos refractarios en hornos, hogares, etc.

Características generales:

No tendrá grumos ni principios de aglomeración.

Adhesivo para baldosas cerámicas:

Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgánicos que dan como resultado una pasta apta para fijar revestimientos cerámicos en suelos y paredes situados en exterior o interior.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que han de mezclarse con agua justo antes de su uso.
- Adhesivo en dispersión (D): Mezcla de conglomerante orgánico en forma de polímero en dispersión acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.

- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reacción química, puede presentarse en forma de uno o más componentes.

Se han considerado las siguientes clases en función de las características adicionales:

- 1: Normal
- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales)
- F: Fraguado rápido
- T: Con deslizamiento reducido
- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y adhesivos en dispersión mejorados).

Adhesivo cementoso (C):

Características de los adhesivos de fraguado normal:

- Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)

Los adhesivos de fraguado rápido, cumplirán, además:

- Adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min)

Características especiales:

- Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Características adicionales:

- Alta adherencia inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30 min)

Adhesivos en dispersión (D):

Características fundamentales:

- Adherencia inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherencia después de envejecimiento con calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de al menos 20 min)

Características especiales:

- Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Características adicionales:

- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherencia a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierto ampliado: adherencia (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30 min)

Adhesivos de resinas reactivas (R):

Características fundamentales:

- Adherencia inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherencia después de inmersión en agua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)

Características especiales:

- Deslizamiento (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm

Características adicionales:

- Adherencia después del choque térmico (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2

Mortero sintético de resinas epoxi:

El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de áridos inertes y de una formulación epoxi en forma de dos componentes básicos: una resina y un endurecedor.

La formulación de la epoxi será determinada por el uso al que se destine el mortero y la temperatura ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulación será aprobada por la DF.

Tamaño máximo del árido: <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero

Tamaño mínimo del árido: >= 0,16 mm

Proporción árido/resina (en peso) (Q): 3 <= Q <= 7

Mortero polimérico:

El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras de poliamida, de alta resistencia mecánica, que se utiliza para la reparación y regularización de elementos de hormigón.

Granulometría: 0 - 2 mm

Resistencia a compresión a 28 días : 5 - 6 kN/m2

Resistencia a flexotracción a 28 días : 90 - 120 kg/m2

Mortero de albañilería:

Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y adiciones o aditivos (en su caso), para su uso en fábricas de albañilería (fachadas, muros pilares, tabiques) como material de rejuntado y trabazón.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Mortero para uso corriente (G), sin características especiales
- Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero diseñado con un tamaño máximo de árido menor e igual al valor que figura especificado
- Mortero para albañilería ligero (L): Mortero diseñado cuya densidad (endurecido y seco), es inferior o igual al valor que figura especificado.

La clase del mortero se define por la letra M seguida del valor de la Resistencia a compresión mínima declarada por el fabricante en N/mm2.

En el caso de morteros prescritos, el fabricante declarará la proporción de todos los componentes de la mezcla, en volumen o en peso.

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayadas según la norma correspondiente:

- Características de los morteros frescos:
- Tiempo de utilización (EN 1015-9)
- Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado áridos porosos
- Características de los morteros endurecidos:
- Resistencia a compresión (EN 1015-11)
- Resistencia de unión (adhesión) (EN 1052-3)
- Absorción de agua (EN 1015-18)
- Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745)
- Densidad (mortero endurecido en estado seco) (EN 1015-10)
- Conductividad térmica (EN 1745)
- Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (se evaluará según las disposiciones válidas)
- Características adicionales para los morteros ligeros:
- Densidad (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Características adicionales para los morteros para juntas y capas finas:
    - Tamaño del árido (EN 1015-1): <= 2 mm
    - Tiempo abierto o tiempo de corrección (EN 1015-9)
    - Reacción frente al fuego:
    - Material con contenido de materia orgánica <= 1,0%: Clase A1
    - Material con contenido de materia orgánica > 1,0%: Clase según UNE-EN 13501-1

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: en envases cerrados herméticamente.

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.

Tiempo máximo de almacenamiento:

- Mortero adhesivo: 1 año
- Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico: 6 meses

3. Normativa de obligado cumplimiento

Adhesivo para baldosas cerámicas:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

Mortero de albañilería:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

Mortero seco, nivelación, refractario, polimérico o de resinas:

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcado y control de la documentación en adhesivos para baldosas cerámicas:

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para usos para la construcción:
    - Sistema 3: Declaración de Prestaciones

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:

- Nombre del producto
- Marca del fabricante y lugar de origen

- Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento
- Referencia a la norma UNE-EN 12004
- Tipo de adhesivo, designado según el apartado 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
- Instrucciones de uso:
- Proporciones de mezcla
- Tiempo de maduración: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la mezcla hasta el momento en que esta lista para su uso
- Vida útil: intervalo de tiempo máximo en que el material puede ser utilizado después de elaborar la mezcla
- Modo de aplicación
- Tiempo abierto
- Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y permitir la circulación
- Ámbito de aplicación

Condiciones de marcado y control de la documentación en mortero de albañilería:

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para muros, pilares y particiones (morteros diseñados*). * Mortero cuya composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante con el fin de obtener las propiedades especificadas (concepto de prestación):
    - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones
- Productos para muros, pilares y particiones (morteros prescritos*). * Mortero que se fabrica en unas proporciones predeterminadas y cuyas propiedades dependen de las proporciones de los componentes que se han declarado (concepto de receta):
    - Sistema 4: Declaración de Prestaciones

En el embalaje o en el albarán de entrega constarán los siguientes datos:

- Referencia a la norma UNE-EN 998-2
- Nombre del fabricante
- Código o fecha de fabricación
- Tipo de mortero
- Tiempo de utilización
- Contenido en cloruros
- Contenido en aire
- Proporción de los componentes (morteros prescritos)
- Resistencia a compresión o clase de resistencia a compresión
- Resistencia de unión (adhesión)
- Absorción de agua

- Permeabilidad al vapor de agua
- Densidad
- Conductividad térmica
- Durabilidad
- Tamaño máximo del árido
- Tiempo abierto o tiempo de corrección
- Reacción frente al fuego
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio

Condiciones de marcado y control de la documentación en mortero seco, nivelación, refractario, polimérico o de resinas:

En el envase figurarán los datos siguientes:

- Nombre del fabricante o marca comercial
- Instrucciones de utilización
- Composición y características del mortero

Operaciones de control en mortero de albañilería:

Inspección visual de las condiciones de suministro y recepción del certificado de calidad del fabricante, según las exigencias del pliego de condiciones.

Antes del inicio de la obra, y con frecuencia semanal durante su ejecución, se comprobará la consistencia del mortero mediante el método establecido en la UNE EN 1015-4, y se preparará una serie de 3 probetas prismáticas de 4x4x16 cm con el fin de obtener la resistencia a compresión (UNE-EN 1015-11).

Criterios de toma de muestras en morteros de albañilería:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y las indicaciones de la UNE-EN 1015-11.

Interpretación de los resultados y actuaciones en caso de incumplimiento en morteros de albañilería:

No se podrán utilizar en la obra morteros sin el correspondiente certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con las condiciones exigidas.

El valor de resistencia a compresión obtenido debe corresponder al de las especificaciones de proyecto:

- Si resulta superior al 90% de la de proyecto, se aceptará el lote.
- Si resulta inferior al 90% se encargará un cálculo estructural que determine el coeficiente de seguridad del elemento correspondiente. Se aceptará el lote si este coeficiente no es inferior al 90% del previsto en el proyecto.

2.10 Clavos

Definición y características de los elementos

Elementos metálicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Patillas
- Clavos de impacto
- Clavos de acero
- Clavos de cobre
- Clavos de acero galvanizado
- Tachuelas de acero

Clavos son vástagos metálicos, puntiagudos de un extremo y con una cabeza en el otro.

Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana.

Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vástago, utilizados para unir los marcos a las paredes.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrán la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirán.

Serán rectos, con la punta afilada y regular.

Los clavos de acero cumplirán las determinaciones de las normas UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036.

ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:

Su recubrimiento de zinc será liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará exento de manchas y no presentará imperfecciones superficiales.

Protección de galvanizado: >= 275 g/m2

Pureza del zinc, en peso: >= 98,5%

Tolerancias de los clavos y tachuelas:

- Longitud: ± 1 D

1. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: Empaquetados.

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

2. Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento para las patillas.

Clavos y tachuelas:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

2.11 Materiales auxiliares para encofrados y apuntalamientos

1. Definición y características de los elementos

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la protección de los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Tensores para encofrados de madera
- Grapas para encofrados metálicos
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de encofrados metálicos
- Desencofrantes
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de casetones recuperables
- Andamios metálicos
- Elementos auxiliares para plafones metálicos
- Tubos metálicos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes, etc.
- Elemento de unión de tubos de 2,3" de D, para confección de entramados, barandillas, soportes, etc.
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas, pozos, etc.

Características generales:

Todos los elementos serán compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado o apuntalamiento y no disminuirán sus características ni su capacidad portante.

Tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones que se puedan producir sobre estos como consecuencia del proceso de hormigonado y, especialmente, por las presiones del hormigón fresco o de los métodos de compactación utilizados.

Estas condiciones se deben mantener hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia suficiente para soportar las tensiones a las que será sometido durante el desencofrado o desenmoldado.

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón, excepto cuando se facilite a la DF certificado emitido por una entidad de control, conforme los paneles han recibido tratamiento superficial que evite la reacción con los álcalis del cemento

Tensor, grapas y elementos auxiliares para plafones metálicos:

No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en la superficie.

No tendrán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización.

Fleje:

Será de sección constante y uniforme.

Ancho: >= 10 mm

Espesor: >= 0,7 mm

Diámetro de las perforaciones: Aprox. 15 mm

Separación de las perforaciones: Aprox. 50 mm

Desencofrante:

Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o grasa diluida.

No se utilizarán como desencofrantes el gasoil, la grasa común ni otros productos análogos.

Evitará la adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior del hormigón ni impedir la aplicación de revestimientos.

No debe impedir la construcción de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria.

No alterará las propiedades del hormigón con el que esté en contacto, ni la de las armaduras o el encofrado, y no ha de producir efectos perjudiciales en el medioambiente

Se ha de facilitar a la DF un certificado donde se reflejen las características del producto y sus posibles efectos sobre el hormigón, antes su aplicación

Conjunto de perfiles metálicos:

Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un encofrado para techos.

Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que soportarán y sin más desperfectos que los debidos a los usos adecuados.

Los perfiles estarán protegidos con una capa de imprimación antioxidante.

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posición.

La conexión entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrante será suficientemente estanca para no permitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.

Tolerancias:

- Rectitud de los perfiles: ± 0,25% de la longitud
- Torsión de los perfiles: ± 2 mm/m

Andamios:

Estará constituido por un conjunto de perfiles huecos de acero de alta resistencia.

Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e indeformabilidad.

Todos los elementos que formen el andamio estarán protegidos por una capa de imprimación antioxidante.

Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de carga.

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

Desencofrante:

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año

3. Normativa de obligado cumplimiento

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.12 Lata

1. Definición y características de los elementos

Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas.

Características generales:

Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.

Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

Conservará sus características para el número de usos previstos.

No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la madera.

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P):): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficiente de elasticidad:

- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2

Dureza (UNE 56-534): <= 4

Resistencia a la compresión (UNE 56-535):

- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2

Resistencia a la tracción (UNE 56-538):

- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2

Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Tolerancias:

- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Ancho nominal: ± 2 mm

Clase	Espesor nominal (mm)		
	< 50	50 a 75	> 75
	Tolerancia (mm)		
T1	±3	±4	+6,-3
T2	±2	±3	+5,-2
T3	±1,5	±1,5	±1,5

- Flecha: ± 5 mm/m
- Torsión: ± 2°

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

3. Unidad y criterios de medición

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4. Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

2.13 Tablero

Definición y características de los elementos

Tableros encofrados.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Tablero de madera
- Tablero aglomerado de madera

Características generales:

Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.

Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

Conservará sus características para el número de usos previstos.

Tolerancias:

- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Ancho nominal: ± 2 mm
- Espesor: ± 0,3 mm
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Ángulos: ± 1°

Tableros de madera:

Tablero de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas.

No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.

Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las características de la madera.

Peso específico aparente (UNE 56-531) (P):): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficiente de elasticidad:

- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2

Dureza (UNE 56-534): <= 4

Resistencia a la compresión (UNE 56-535):

- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2

Resistencia a la tracción (UNE 56-538):

- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2

Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Tableros de madera aglomerada:

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y prensado en caliente.

Estará lijado por ambas caras.

No tendrá defectos superficiales.

Peso específico: >= 6,5 kN/m3

Módulo de elasticidad:

- Mínimo: 2100 N/mm2
- Medio: 2500 N/mm2

Humedad del tablero (UNE 56710): >= 7%, <= 10%

Hinchamiento en:

- Espesor: <= 3%
- Longitud: <= 0,3%
- Absorción de agua: <= 6%

Resistencia a la tracción perpendicular en las caras: >= 0,6 N/mm2

Resistencia al arranque de tornillos:

- En la cara: >= 1,40 kN
- En el canto: >= 1,15 kN

5. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.

Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

6. Unidad y criterios de medición

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

7. Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

8. Baldosas cerámicas esmaltadas y gres prensado

Definición y características de los elementos

Baldosas cerámicas para revestimientos, verticales o horizontales, obtenidas de una pasta de arcilla, silicio, fundentes y colorantes, cocida.

Se han considerado las siguientes piezas:

- Azulejo (prensado y esmaltado del grupo BIII)
- Baldosa de gres extruido (pieza esmaltada o sin esmaltar de grupo AI o AII-a)
- Baldosa de gres porcelánico (pieza prensada normalmente sin esmaltar del grupo BI-a)
- Baldosa de gres prensado esmaltado (pieza de grupo BI-b o BII-a)

Características generales:

Las baldosas cerámicas se clasifican según el método de fabricación:

- Método A, baldosas extruidas.
- Método B, baldosas prensadas en seco
- Método C, baldosas fabricadas por otros métodos

Las baldosas cerámicas se clasifican en diferentes grupos según la absorción de agua (E):

- Grupo I (E <=3%, baja absorción de agua)
- Grupo II (3% <E <=10%, media absorción de agua)
- Grupo III (E >10%, alta absorción de agua alta)

MÉTODO DE FABRICACIÓN	GRUPO I E<=3%	GRUPO IIa 3%<E<=6%	GRUPO IIb 6%<E<=10%	GRUPO III E>10%

A EXTRUIDAS	Grupo AI E<=3%	Grupo AIIa-1	Grupo AIIb-1	Grupo AIII
		Grupo AIIa-2	Grupo AIIb-2	
B PRENSADAS EN SECO	Grupo BI-a E<=0,5%	Grupo BIIa	Grupo BIIb	Grupo BIII
	Grupo BI-b 0,5%<E<=3%			

Como mínimo el 95% de las baldosas han de estar libres de defectos visibles que puedan afectar el aspecto de una superficie más grande de baldosa.

Tendrá un color y textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y las aristas serán rectos y la cara vista plana.

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.

Tolerancias:

Todas estas tolerancias se verificarán según la UNE_EN ISO 10545-2.

- Grupo AI-a, AI-b, AII-a1
- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación: ± 2%
- Espesor: ± 10%
- Rectitud de los lados: ± 0,6%
- Planeidad: ± 1,5%
- Ortogonalidad: ± 1%
- Grupo AII-a2, AII-b1, AII-b2 y AIII
- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación: ± 2%
- Espesor: ± 10%
- Rectitud de los lados: ± 0,6%
- Planeidad: ± 1,5%
- Ortogonalidad: ± 1%
- Grupo BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:
- 15 - 25 piezas/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 piezas/m2: ± 0,75%

- 46 - 115 piezas/m2: ± 1%
- Espesor:
- 15 - 45 piezas/m2: ± 5%
- 46 - 400 piezas/m2: ± 10%
- Rectitud de los lados:
- 15 - 115 piezas/m2: ± 5%
- 116 - 400 piezas/m2: ± 0,75%
- Planeidad:
- 15 - 115 piezas/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 piezas/m2: ± 1%
- 15 - 115 piezas/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 piezas/m2: ± 1%
- Ortogonalidad:
- Grupo BIII
- Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación:
- Lado <= 12 cm: ± 0,75%
- Lado > 12 cm: ± 0,5%
- Espesor:
- 46 - 400 piezas/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 piezas/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 piezas/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de los lados: ± 0,6%
- Planeidad: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalidad: ± 0,5%

Todas estas tolerancias se verificarán según la UNE_EN ISO 10545-2.

<u>Baldosas cerámicas para suelos:</u>

Características esenciales:

- Fuerza de rotura (ensayo UNE-EN ISO 10545-3):
- Grupo AI-a:: si espesor >=7,5mm mínimo 1300N, y si espesor < 7,5mm mínimo 600N
- Grupo AI-b:: si espesor >=7,5mm mínimo 1100N, y si espesor < 7,5mm mínimo 600N
- Grupo AII-a1: si espesor >=7,5mm mínimo 950N, y si espesor < 7,5mm mínimo 600N
- Grupo AII-a2: si espesor >=7,5mm mínimo 800N, y si espesor < 7,5mm mínimo 600N
- Grupo AII-b1: >=900N
- Grupo AII-b2: >=750N
- Grupo AIII: >=600N
- Grupo BI-a: si espesor >= 7,5 mm mínimo 1300 N ,y si espesor< 7,5 mm mínimo 700N
- Grupo BI-b: si espesor >= 7,5 mm mínimo 1100 N, y si espesor< 7,5 mm mínimo 700N
- Grupo BII-a: si espesor >= 7,5 mm mínimo 1100 N, y si espesor< 7,5 mm mínimo 600N

- Grupo BII-b: si espesor >= 7,5 mm mínimo 800 N, y si espesor< 7,5 mm mínimo 500N
- Grupo BIII: si espesor >= 7,5 mm mínimo 600 N, y si espesor< 7,5 mm mínimo 200N

Baldosas cerámicas para suelos interiores:

Características esenciales:

- Reacción al fuego: A1
- Coeficiente de fricción: El fabricante declarará el método de ensayo utilizado.

Baldosas cerámicas para suelos exteriores:

Características esenciales:

- Coeficiente de fricción (para zonas peatonales): El fabricante declarará el método de ensayo utilizado.
- Resistencia al derrape (para zonas donde circulen vehículos): El fabricante declarará el método de ensayo utilizado
- Durabilidad, resistencia a las heladas: Exigida de acuerdo con UNE-EN ISO 10545-12

Baldosas cerámicas para paredes y techos:

Características esenciales:

- Reacción al fuego A1
- Resistencia a la flexión (No aplicable a baldosas con fuerza de rotura >=3000N. UNE-EN ISO 10545-4):
- Grupo AI-a: >=28 N/mm2
- Grupo AI-b: >=23 N/mm2
- Grupo AII-a1: >=20 N/mm2
- Grupo AII-a2: >=13 N/mm2
- Grupo AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grupo AII-b2: >=9 N/mm2
- Grupo AIII: >=8 N/mm2
- Grupo BI-a: >=35 N/mm2
- Grupo BI-b: >=30 N/mm2
- Grupo BII-a: >=22 N/mm2
- Grupo BII-b: >=18 N/mm2
- Grupo BIII: Si espesor >=7,5mm mínimo >=12N/mm2, y si grueso <7,5mm mínimo 15N/mm2
- Adhesión: Aplicable para baldosas que puedan estar expuestas a la caída accidental de objetos sobre áreas de tránsito (UNE-EN-12004)

Baldosas cerámicas para suelos interiores:

Características esenciales:

- Reacción al fuego: A1
- Coeficiente de fricción: El fabricante declarará el método de ensayo utilizado

Baldosas cerámicas para suelos exteriores:

Características esenciales:

- Coeficiente de fricción (para zonas peatonales): El fabricante declarará el método de ensayo utilizado.
- Resistencia al derrape (para zonas donde circulen vehículos): El fabricante declarará el método de ensayo utilizado.
- Durabilidad, resistencia a las heladas: Exigida de acuerdo con UNE-EN ISO 10545-12

Baldosas cerámicas para paredes y techos:

Características esenciales:

- Reacción al fuego A1
- Resistencia a la flexión (No aplicable a baldosas con fuerza de rotura >=3000 N. UNE-EN ISO 10545-4)
- Grupo AI-a: >=28 N/mm2
- Grupo AI-b: >=23 N/mm2
- Grupo AII-a1: >=20 N/mm2
- Grupo AII-a2: >=13 N/mm2
- Grupo AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grupo AII-b2: >=9 N/mm2
- Grupo AIII: >=8 N/mm2
- Grupo BI-a: >=35 N/mm2
- Grupo BI-b: >=30 N/mm2
- Grupo BII-a: >=22 N/mm2
- Grupo BII-b: >=18 N/mm2
- Grupo BIII: Si espesor >=7,5mm mínimo >=12N/mm2, y si grueso <7,5mm mínimo 15N/mm2.
- Adhesión: Aplicable para baldosas que puedan estar expuestas a la caída accidental de objetos sobre áreas de tránsito (UNE-EN-12004)

Baldosas cerámicas para paredes y techos exteriores:

Características esenciales:

- Resistencia al choque térmico: Cuando corresponda (ISO 10545-9)
- Durabilidad, resistencia a las heladas: Cuando corresponda (ISO 10545-12)

9. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: Empaquetadas, en cajas.

Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

10. Normativa de obligado cumplimiento

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.

11. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcado y control de la documentación:

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para recubrimiento de paredes o techos, en interiores o exteriores, sujetos a reglamentación de reacción al fuego de Nivel o Clase: A1***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 2006/605/CE),
- Productos para pavimentos interior incluyendo zonas cerradas de transporte público de Nivel o Clase: A1***, F. *** Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 2006/605/CE),
- Productos para pavimentos exteriores y acabados de carretera para cubrir áreas de circulación peatonal y vehicular,
- Productos para recubrimiento de paredes o techos, en interiores o exteriores, para usos no sujetos a reglamentación de reacción al fuego ni de sustancias peligrosas:
    - Sistema 4: Declaración de Prestaciones
- Productos para pavimentos sujetos a reglamentaciones sobre sustancias peligrosas,
- Productos para recubrimiento de paredes o techos, en interiores o exteriores, sujetos a reglamentación de sustancias peligrosas, y en techos interiores suspendidos sujetos a requisitos de seguridad durante el uso:
    - Sistema 3: Declaración de Prestaciones

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje han de ir marcadas con:

- La marca comercial y/o una marca de fabricación apropiada, y el país de origen
- La marca de primera calidad.
- La referencia del anexo correspondiente a la norma europea (UNE EN 14411) y su clasificación, cuando sea aplicable.
- Las medidas nominales y las medidas de fabricación modular (M) o no modular
- La naturaleza de la superficie (GL esmaltada o UGL no esmaltada)

El embalaje y/o documentación comercial han de llevar el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE debe ir acompañado por la siguiente información:

- Referencia a la norma UNE-EN 14411

- Nombre o marca del fabricante
- Dos últimas cifras del año de impresión del marcado
- Clasificación del producto y usos finales previstos.
- Indicaciones para identificar las características del producto en base a las especificaciones técnicas.

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas. según lo especificado en el apartado 4.1 del DB HE 1:

- Conductividad térmica (W/mK)
- Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua

Operaciones de control en piezas para revestimientos:

Las tareas de control a realizar son las siguientes:

El control de recepción de material verificará que las características de los materiales son coincidentes con lo establecido en la DT. Este control cumplirá lo especificado en el apartado 7.2 del CTE.

Control de documentación: documentos de origen (hoja de suministro y etiquetado), certificado de garantía del fabricante, en su caso, (firmado por persona física) y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas, incluida la documentación correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente.

Control mediante distintivos de calidad y avaluaciones de idoneidad: En el caso en que el fabricante disponga de alguna marca de calidad, aportará la documentación correspondiente

Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree conveniente.

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuarán las siguientes comprobaciones:

- Antes de empezar la obra, si varía el suministro, y por cada 1000 m2 de plaquetas que lleguen a la obra se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:
- resistencia a las manchas (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistencia a productos (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistencia a la abrasión (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherencia al mortero de cemento (ASTM C 482)
- Sobre 10 baldosas:

- absorción de agua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistencia a la flexión (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprobación dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecto superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 baldosas:
- resistencia a la helada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistencia al agrietado del vidriado (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistencia al choque térmico (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistencia al ácido clorhídrico o al hidróxido de potasio (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 baldosas:
- dureza al rallado (escala de mohs)
- Sobre 1 baldosa:
- coeficiente de dilatación lineal (UNE-EN ISO 10545-8)

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.

Criterios de toma de muestras en piezas para revestimientos:

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento en piezas para revestimientos:

Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace entrega de los certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos a cargo del Contratista.

Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre un total de 10 baldosas del mismo lote.

Sólo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las 10 baldosas resulten satisfactorios.

Operaciones de control en piezas para pavimentos:

En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuarán las siguientes comprobaciones:

- Antes de empezar la obra, si varía el suministro y cada 1000 m2 de superficie (unas 10.000 piezas), se pedirán al contratista los certificados del fabricante que garanticen el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas, incluyendo los resultados de los ensayos siguientes, realizados por un laboratorio acreditado:
    - Aspecto.
    - Absorción de agua.
    - Resistencia a la flexión.
    - Dureza superficial.
    - Dilatación térmica.

- Resistencia a las manchas.
- Resistencia a los productos domésticos de limpieza.
- Longitud.
- Anchura.
- Espesor.
- Rectitud de aristas.
- Planeidad.
- Ortogonalidad.

En caso de no presentar estos resultados, o que la DF tenga dudas de su representatividad, se realizarán estos ensayos sobre el material recibido, a cargo del contratista.

Si el material dispone de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de la presentación de los ensayos de control de recepción.

Criterios de toma de muestras en piezas para pavimentos:

Se seguirán las instrucciones de la DF. y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento en piezas para pavimentos:

Si en los plazos establecidos al empezar la obra no se hace la entrega de los certificados de calidad del fabricante, se realizará una serie completa de ensayos a las piezas recibidas a cargo del Contratista.

Se repetirá el ensayo que no cumpla las especificaciones sobre un total de 10 baldosas del mismo lote.

Sólo se aceptará el lote, cuando los resultados obtenidos sobre las 10 baldosas resulten satisfactorios.

2.14 Aditivos y adiciones para hormigones, morteros y lechadas

1. Definición y características de los elementos

Aditivos son aquellas sustancias o productos que al incorporarse a los morteros, hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, propiedades habituales o de su comportamiento.

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos, o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con la finalidad de mejorar alguna de sus propiedades o darle características especiales.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Colorante
- Aditivos para hormigón:
- Inclusor de aire
- Reductor de agua/plastificante
- Reductor de agua de alta actividad/superplastificante
- Retenedor de agua
- Acelerador del fraguado
- Hidrófugo
- Inhibidor del fraguado
- Aditivos para morteros:
- Inclusor de aire /plastificante
- Inhibidor del fraguado para mortero fuertemente retardado
- Adiciones:
- Cenizas volantes
- Humo de sílice
- Escoria granulada

Aditivos:

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas del hormigón o mortero.

Tendrá un aspecto homogéneo.

El color será uniforme y se ajustará al especificado por el fabricante.

Las características siguientes cumplirán con los valores declarados por el fabricante, ensayados según la norma correspondiente, dentro del límite de tolerancia indicado, en su caso.

Características esenciales:

- Efecto sobre la corrosión: No favorecerá la corrosión del acero embebido en el material.
- Contenido en alcalinos (Na2O, equivalente) (UNE-EN 480-12): <= valor especificado por el fabricante

Características complementarias:

- Componente activo (UNE-EN 480-6): Sin variaciones respecto al espectro de referencia especificado por el fabricante
- Densidad relativa, en aditivos líquidos (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contenido en extracto seco convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1, o dentro de los límites declarados por el fabricante

Aditivos y colorante para hormigón:

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón o el tiempo de fraguado deberán cumplir las condiciones de la UNE EN 934-2.

Limitaciones de uso de aditivos

- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón armado y pretensado
- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia
- Plastificantes con efecto aireante: Se admitirán si el aire ocluido es <=6% en volumen (UNE EN 12350-7)
- Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento

Aditivos para hormigones:

Características esenciales:

- Contenido total de cloruros (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificado por el fabricante
- Características complementarias:
- Contenido cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificado por el fabricante

Aditivo para hormigón inclusor de aire:

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas uniformemente, que sirven para mejorar el comportamiento frente a las heladas. Estas condiciones se mantendrán durante el fraguado.

Características esenciales:

- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contenido de aire total, en volumen (UNE-EN 12350-7): 4 a 6%
- Factor de espaciado de los huecos en el hormigón endurecido (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3): >= 75%

No se utilizarán agentes aireantes con hormigones excesivamente fluidos.

La proporción de aire en el hormigón se debe controlar de forma regular en la obra.

No se puede mezclar con otros tipos de aditivos sin la autorización previa de la DF.

Características complementarias:

- Diámetro de las burbujas (D): 10 <= D <= 1000 micras

Aditivo para hormigón, reductor de agua/plastificante:

El aditivo reductor de agua/plastificante es un producto para incorporar durante el amasado del hormigón, con el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar el asentamiento en cono para una misma cantidad de agua.

Características esenciales:

- Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistencia a compresión a 7 y 28 días del hormigón con aditivo, en relación con el hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%

Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.

Aditivo para hormigón, reductor de agua de alta actividad/superplastificante:

El aditivo reductor de agua de alta actividad/superplastificante, es un producto para incorporar durante el amasado del hormigón, con el fin de disminuir fuertemente la cantidad de agua para una misma consistencia, o aumentar considerablemente el asentamiento en cono para una misma cantidad de agua.

Características esenciales:

- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
- Valores en relación al mismo hormigón sin aditivo a igual consistencia:
- Reducción de agua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistencia a compresión (UNE-EN 12390-3):
- 1 día: >= 140%
- 28 días: >= 115%
- Valores en relación al mismo hormigón sin aditivo a igual relación agua/cemento:
- Consistencia:
- Asentamiento en cono (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escurrimiento (EN 12350-5): >= 160 mm
- Mantenimiento de la consistencia (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min después de la adición, no será inferior a la consistencia inicial
- Resistencia a compresión a 28 días >= 90%
- Contenido en aire <= 2% en volumen

Aditivo para hormigón, retenedor de agua:

Aditivo que reduce la pérdida de agua al disminuir la exudación.

Características esenciales:

- Exudación (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3): >= 80%

Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.

Aditivo para hormigón, hidrófugo:

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del agua bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad.

Características esenciales:

- Absorción capilar en masa a 7 días (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorción capilar en masa a 28 días (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistencia a compresión a 28 días del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3): >= 85%
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
- Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.

Aditivo par hormigón, inhibidor del fraguado:

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado.

El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo.

Características esenciales:

- Tiempo de fraguado (UNE-EN 480-2):
- Inicio de fraguado: >= al del mortero de referencia + 90 min
- Final del fraguado: <= al del mortero de referencia + 360 min
- Resistencia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):
- 7 días: >= 80%
- 28 días: >= 90%
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%
- Reducción de agua: >= 5%

Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.

Aditivo para hormigón, acelerador del fraguado:

El aditivo para gunitados es un producto para incorporar durante el amasado del hormigón con el fin de acelerar el proceso de fraguado.

Se dosificará con un sistema mecánico que asegure la regularidad y la precisión de la proporción deseada de aditivo.

Será compatible con el cemento, áridos, humo de sílice y fibras, con el fin de garantizar en el hormigón proyectado las condiciones requeridas de resistencia, tanto en la primera edad como durante su evolución en el tiempo, y también con relación a la durabilidad de la obra.

No empezará a actuar hasta el momento de añadir el agua.

Características esenciales:

- Tiempo de fraguado (UNE-EN 480-2):
- Inicio del fraguado (a 20°C): >= 30 min
- Final del fraguado (a 5°C): <= 60%
- Resistencia a compresión del hormigón con aditivo, en relación al hormigón testigo sin aditivo (UNE-EN 12390-3):
- 28 días: >= 80%
- 90 días: >= que la del hormigón de ensayo a 28 días
- Contenido de aire en el hormigón fresco, en volumen (UNE-EN 12395): <= 2%

Final del fraguado según la dosificación (ensayo Vicat):

- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min

Los valores se han tomado en relación al mismo hormigón sin aditivos, a igual consistencia.

Aditivos para morteros:

Características esenciales:

- Contenido total de cloruros (ISO 1158): <= valor especificado por el fabricante
- Resistencia a compresión a 28 días (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del mortero testigo
- Características complementarias:
- Contenido de cloruros solubles en agua (UNE-EN 480-10): <= valor especificado por el fabricante

Aditivo para mortero inclusor de aire/plastificante:

Aditivo que mejora la trabajabilidad o que permite una reducción del contenido de agua por incorporación en el amasado, de una cantidad de pequeñas burbujas de aire, uniformemente distribuidas que quedan retenidas después del endurecimiento.

Características esenciales:

- Contenido de aire (EN 1015-7 método A):
- Después de un amasado normalizado: A= 17 ± 3% en volumen
- Después de 1 h en reposo: >= A - 3%
- Después de un amasado largo: <= A + 5, >= A - 5%

Características complementarias:

- Reducción de agua en masa (UNE-EN-480-13): >= 8%

Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual consistencia.

Aditivo para mortero inhibidor del fraguado:

El aditivo inhibidor del fraguado se incorpora en el momento del amasado y tiene como objetivo retardar el inicio del fraguado.

Características esenciales:

- Después de un amasado normalizado: A= 17 ± 3% en volumen
- Después de 1 h en reposo: >= 0,70 A%
- Después de un amasado largo: <= A + 5, >= A - 5%
- Contenido de aire (EN 1015-7 método A):

Características complementarias:

- Consistencia después de 28 h en reposo (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistencia a la penetración después de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del mortero de ensayo con aditivo

Los valores se han tomado en relación al mismo mortero sin aditivo, a igual consistencia.

Colorante:

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al producto final.

Deberá ser estable a los agentes atmosféricos, la cal y a los álcalis del cemento; ha de ser insoluble en agua, y no ha de alterar el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de volumen ni las resistencias mecánicas del hormigón.

Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento

- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento

Adiciones:

En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia fabricado con cemento tipo CEM I queda permitida la adición simultanea de cenizas volantes y humo de sílice siempre que la cantidad de humo de sílice no supere <=10% del peso del cemento y la suma de las adiciones (cenizas volantes+humo de sílice) no superen <=20% del peso total del cemento

Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretensadas, podrán utilizarse cenizas volantes como adición en una cantidad <=20% del peso del cemento, o humo de silice en una cantidad <=10% del peso del cemento

Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de silicio para su confección. En estructuras de edificación si se usan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo de silicio no superará el 10% del peso de cemento.

Si se adicionan al hormigón cenizas volantes o humo de sílice, deberá de utilizarse cemento del tipo CEM I

Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento
- Armado: <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento

Cenizas volantes:

Cenizas volantes para hormigones son exclusivamente los productos sólidos y en estado de fina división procedentes de la combustión de carbón bituminoso pulverizado, en los hornos de centrales termoeléctricas, y que son arrastradas por los gases del proceso y recuperados por precipitación electrostática o por captación mecánica.

Las cenizas volantes se podrán utilizar siempre que es considere que no repercutirán a las características ni a la durabilidad del hormigón, y que no favorecerán la corrosión de les armaduras. Además, se habrá de utilizar un cemento tipo CEM I (se dan recomendaciones en la UNE 83414-EX), y el hormigón deberá disponer de un certificado de garantía según el Código Estructural.

Resultados según la UNE-EN 450-1:

Características químicas, expresadas como proporción en peso de la muestra seca:

- Contenido de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contenido de anhídrido sulfúrico SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Óxido de calcio libre (UNE_EN 451-1): <= 1%
- (Se admite hasta un 2,5% si la estabilidad según 4.3.3 UNE EN 450 < 10 mm)

- Pérdida por calcinación (1h de combustión)(EN 196-2): <= 5,0%
- Características físicas:
- Finura(% en peso retenido en tamiz 0,045 mm)(UNE_EN-451-2): <= 40%
- Índice de actividad (EN 196-1):
- A 28 días: > 75%
- A 90 días: > 85%
- Expansión por el método de las agujas (UNE-EN 196-3): < 10 mm

La especificación relativa a la expansión solo se tendrá en cuenta si el contenido de óxido libre supera el 1%, sin pasar del 2,5%

Tolerancias:

- Densidad sobre valor medio que declara fabricante (UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pérdida al fuego: + 2,0%
- Finura: + 5,0%
- Variación de la finura: ± 5,0%
- Contenido de cloruros: + 0,01%
- Contenido de óxido de calcio libre: +0,1%
- Contenido SO3: + 0,5%
- Estabilidad: + 1,0 mm
- Índice de actividad: - 5,0%

Humo de silicio:

El humo de sílice o microsílice es una adición en polvo para hormigones proyectados, que tiene por objeto mejorar su trabajabilidad, resistencia a medio plazo y compacidad. Es un subproducto de la reducción de cuarzo de gran pureza con carbón en hornos eléctricos de arco, del que se obtiene silicio y ferrosilicio.

La DF podrá aceptar la utilización de un humo de sílice que no cumpla con los requisitos anteriores, siempre y cuando queden garantizados los requisitos del hormigón, tanto fresco como endurecido.

Contenido de óxido de silicio (SiO2): >= 85%

Contenido de cloruros Cl- (UNE 80-217): < 0,10%

Pérdida al fuego (UNE_EN 196-2): < 5%

Proporción de partículas inferiores a 1 micra: 90 - 95%

Índice de actividad (UNE_EN 196-1): > 100%

Tolerancia en peso: ± 3 % del peso o volumen

Escoria granulada:

La escoria granulada es escoria siderúrgica, que puede utilizarse como árido fino en la confección de hormigones.

Se considera árido fino al que pasa por el tamiz 4 (UNE-EN 933-2).

Será estable, es decir, no contendrá silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

No contendrá sulfuros oxidables.

Contenido máximo de sustancias perjudiciales en % en peso:

- Terrones de arcilla: 1%
- Material retenido por tamiz 0,063 (UNE 7-050) que flota en líquido de peso específico 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compuestos de azufre expresados en SO3- y referidos al árido seco: 2%
- Reactividad potencial con los álcalis del cemento: Nula
- Pérdida de peso máximo experimentada por los áridos al ser sometidos a 5 ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico o sulfato magnésico (UNE 7-136):
- Con sulfato sódico: <= 10%
- Con sulfato magnésico: <= 15%

<u>Escoria granulada para grava-escoria:</u>

Reactividad (PG 3/75): alfa > 20

Contenido de agua en peso (h) en función del coeficiente alfa de reactividad:

- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%

La curva granulométrica quedará dentro de los siguientes límites:

Tamiz UNE	% Acumulativo de áridos que pasan
5	95 - 100
2,5	75 - 100
1,25	40 - 85
0,4	13 - 35
0,16	3 - 14
0,08	1 - 10

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro y almacenamiento en aditivos y colorantes:

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones y con etiquetado.

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus características.

El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas temperaturas.

Suministro y almacenamiento de adiciones

Suministro: A granel en camiones silo herméticos.

Almacenamiento: En silos herméticos. Los silos tendrán pintada una franja roja de 70 cm de anchura.

Suministro y almacenamiento de escoria granulada:

Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus características.

Almacenamiento: Protegidas de contaminaciones, especialmente las del terreno, y separando las distintas fracciones granulométricas.

3. Normativa de obligado cumplimiento

Aditivos para hormigones:

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

Aditivos para morteros:

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

Adiciones para hormigones:

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.

Uso para hormigones:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcado y control de la documentación en aditivos:

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para mortero para albañilería,
- Productos para hormigón:
    - Sistema 2+: Declaración de Prestaciones

El suministro del producto ha de venir acompañado del certificado de calidad correspondiente y la ficha técnica del fabricante. Además, debe incluir la designación del aditivo de acuerdo con la norma UNE EN 934-2.

El certificado debe indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, e indicar su función principal; también ha de garantizar su efectividad y que no produzca alteraciones en las características mecánicas o químicas del hormigón o mortero.

La documentación deberá incluir también:

- Nombre del laboratorio
- Si no es un laboratorio público, expondrá la declaración de estar acreditado para realizar los ensayos
- Fecha de emisión del certificado
- Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente

La entrega de aditivos deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por el suministrador, donde han de constar como mínimo los siguientes datos:

- Identificación del suministrador
- Número del certificado de marcado CE
- Número de serie de la hoja de suministro
- Identificación del peticionario
- Fecha de entrega
- Cantidad suministrada

- Designación del aditivo según el Código Estructural
- Identificación del lugar de suministro

Condiciones de marcado y control de la documentación en aditivos para hormigón:

En el embalaje o en el albarán de entrega, constará la siguiente información, como mínimo:

- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- Nombre del lote y fábrica de producción
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del cual las propiedades ya no están garantizadas
- Instrucciones de homogeneización antes de su uso, en su caso
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se acompañará de la siguiente información:
    - Número de identificación del organismo de certificación
    - Nombre o marca de identificación del fabricante
    - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
    - Referencia a la norma EN 934-2
    - Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.)
    - Designación del producto
    - Información de las características esenciales aplicables, con los valores declarados, en su caso

Condiciones de marcado y control de la documentación en aditivos para mortero:

En el embalaje o en el albarán de entrega, constará la siguiente información, como mínimo:

- Designación (según el apartado 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- Nombre del lote y fábrica de producción
- Requisitos para el almacenamiento, incluido el límite de tiempo a partir del cual las propiedades ya no están garantizadas
- Instrucciones de uso y precauciones relativas a la seguridad
- Intervalo de uso recomendado por el fabricante
- Llevará el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE se acompañará de la siguiente información:
    - Número de identificación del organismo de certificación
    - Nombre, identificación y dirección registrada del fabricante
    - Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado
    - Número del certificado de conformidad CE del control de producción en fábrica, en su caso
    - Referencia a la norma EN 934-3
    - Descripción del producto (nombre genérico, material, uso previsto, etc.)

- Designación del producto
- Información de las características esenciales aplicables, con los valores declarados, en su caso

Condiciones de marcaje y control de la documentación en colorante para hormigones:

El suministro del producto ha de venir acompañado del certificado de calidad correspondiente y la ficha técnica del fabricante. Además, debe incluir la designación del aditivo de acuerdo con la norma UNE EN 934-2.

El certificado debe indicar las proporciones adecuadas de dosificación del producto, e indicar su función principal; también ha de garantizar su efectividad y que no produzca alteraciones en las características mecánicas o químicas del hormigón o mortero.

La documentación deberá incluir también:

- Nombre del laboratorio
- Si no es un laboratorio público, expondrá la declaración de estar acreditado para realizar los ensayos
- Fecha de emisión del certificado
- Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente

En la hoja de suministro deberá constar:

- Identificación del suministrador
- Número de serie de la fulla hoja de suministro
- Identificación del peticionario
- Fecha de entrega
- Designación de la adición
- Cantidad suministrada
- Identificación del lugar de suministro

Condiciones de marcado y control de la documentación en adiciones:

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para hormigones, morteros y pastas:
  - Sistema 1+: Declaración de Prestaciones

La entrega de adiciones deberá de ir acompañada de una hoja de suministro proporcionada por el suministrador, donde han de constar como mínimo los siguientes datos:

- Identificación del suministrador
- Número del certificado de marcado CE, para las cenizas volantes y escorias granuladas
- Identificación de la instalación de procedencia (central térmica o alto horno) para cenizas volantes

- Número de serie de la hoja de suministro
- Identificación del peticionario
- Fecha de entrega
- Cantidad suministrada
- Designación de la adición según el Código Estructural
- Identificación de lugar de suministro

La documentación deberá incluir también:

- Nombre del laboratorio
- Si no es un laboratorio público, expondrá la declaración de estar acreditado para realizar los ensayos
- Fecha de emisión del certificado
- Garantía de que el tratamiento estadístico es equivalente

Condiciones de marcado y control de la documentación en cenizas volantes:

Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información:

- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado
- Número del certificado de conformidad CE
- Referencia a la norma UNE EN 450-1
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto
- Información sobre características esenciales (tabla ZA.1) UNE-EN 450-1

Condiciones de marcado y control de la documentación en humo de sílice:

Llevarán el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado del marcado CE se acompañará de la siguiente información:

- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca de identificación y dirección registrada del fabricante
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado
- Número del certificado de conformidad CE
- Referencia a la norma UNE EN 450-1:2006
- Descripción del producto: nombre genérico, material y uso previsto
- Información sobre características esenciales (tabla ZA.1) UNE-EN 13263-1

Operaciones de control:

Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Control del suministro del material, con recepción del correspondiente certificado de calidad de acuerdo con las condiciones exigidas.

La DF podrá valorar el nivel de garantía del distintivo, y en caso de no disponer de suficiente información, podrá determinar la ejecución de comprobaciones mediante ensayos.

Operaciones de control en aditivos para hormigón:

Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto (UNE-EN 934-2).

Operaciones de control en aditivo inclusor de aire para hormigón:

Cada vez que cambie el suministrador, y al menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizará el ensayo de cantidad de aire ocluido (UNE-EN 12350-7).

Operaciones de control en colorante:

Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto (UNE-EN 934-2).

Operaciones de control en cenizas volantes:

Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto siguientes:

- Determinación de la pérdida por calcinación (UNE-EN 196-2)
- Determinación de la finura de molido (UNE-EN 451-2)
- Índice de actividad resistente con cemento Pórtland (UNE-EN 450-1)
- Estabilidad de volumen (UNE-EN 196-3)
- Contenido de cloruros (UNE-EN 196-2)
- Porcentaje de óxido de calcio libre (UNE-EN 451-1)
- Contenido de anhídrido sulfúrico (UNE-EN 196-2)

Operaciones de control en humo de sílice:

Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto siguientes:

- Determinación de la pérdida por calcinación (UNE-EN 196-2)
- Índice de actividad resistente con cemento Pórtland (UNE-EN 13263-1)
- Contenido de cloruros (UNE-EN 196-2)
- Contenido de óxido de silicio (UNE-EN 196-2)

Operaciones de control en escoria granulada:

Cada vez que cambie el suministrador, y por lo menos en una ocasión a lo largo de la obra, se realizarán los ensayos identificativos del producto (UNE-EN 934-2).

Criterios de toma de muestras:

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas UNE correspondientes y al Código Estructural en adición de humos de sílice.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento en aditivos:

La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado, permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en proyecto y en el Código Estructural.

En el caso de los aditivos que no dispongan del marcado CE, el Constructor, o el Subministrador del hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con una antigüedad inferior a 6 meses, realizado por un laboratorio de control autorizado, que demuestre la conformidad del aditivo respecto a las especificaciones del artículo 29º del Código Estructural, con un nivel de garantía estadística equivalente al exigido por los aditivos con marcado CE en la norma UNE EN 934-2.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento en colorante:

No se utilizarán aditivos que no lleguen correctamente referenciados y acompañados del correspondiente certificado de garantía del fabricante.

El Director de obra decidirá la aceptación de un producto colorante, así como su empleo, a la vista de los resultados de los ensayos previos realizados.

En el caso de los aditivos que no dispongan del marcado CE, el Constructor, o el Subministrador del hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con una antigüedad inferior a 6 meses, realizado por un laboratorio de control autorizado, que demuestre la conformidad del aditivo respecto a las especificaciones del Código Estructural, con un nivel de garantía estadística equivalente al exigido por los aditivos con marcado CE en la norma UNE EN 934-2.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento en adiciones:

Los ensayos de comprobación del producto deben resultar conformes a las especificaciones del pliego.

La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado, permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en proyecto y en el Código Estructural.

2.15 Piezas rectas de hormigón para bordillos

1. Definición y características de los elementos

Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón
- Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura principal y en su capa superficial

Se han considerado las formas siguientes:

- Recto
- Curvo
- Recto con rigola
- Para vados

Características generales:

La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.

La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.

Las caras horizontales serán planas y paralelas.

Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o achaflanadas.

No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.

La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.

En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.

En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.

La forma de expresión de las medidas será: Altura x anchura.

Espesor de la capa vista: >= 4 mm

Clases en función de la resistencia climática:

- Clase 1 (marcado A): sin medida del % de absorción de agua
- Clase 2 (marcado B): <= 6% de absorción de agua
- Clase 3 (marcado D): valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del ensayo hielo-deshielo; ningún valor unitario > 1,5

Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:

- Clase 1 (marcado F): sin medida de esta característica
- Clase 3 (marcado H): <= 23 mm
- Clase 4 (marcado I): <= 20 mm

Clases en función de la resistencia a flexión:

- Clase 1 (marcado S): valor medio: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 2,8 MPa
- Clase 2 (marcado T): valor medio: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa
- Clase 3 (marcado U): valor medio: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa

Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma.

Tolerancias:

- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: ± 1% al mm más cercano, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviación de otras dimensiones, excepto el radio:
- Caras vistas: ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm
- Otras partes: ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y bordes rectos:
    - Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: ± 1,5 mm
    - Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: ± 2 mm
    - Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: ± 2,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: ± 4 mm

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.

3. Normativa de obligado cumplimiento

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

4. Condiciones de control de recepción

<u>Condiciones de marcado y control de la documentación:</u>

En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:

- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- Identificación del producto
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio

Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el embalaje cuando no sea reutilizado, constará la siguiente información:

- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de producción
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones),
- Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada,
- Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de peatones y de vehículos:
    - Sistema 4: Declaración de Prestaciones

<u>Operaciones de control:</u>

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:
- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) y recepción del certificado de calidad del fabricante.
- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340).
- Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas cada una, para realizar los siguientes ensayos:
- Resistencia a flexión (UNE-EN 1340).
- Absorción de agua (UNE-EN 1340).
- Resistencia a compresión de testimonios extraídos de las piezas de bordillo (UNE-EN 12390-3).

En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad del producto.

Criterios de toma de muestras:

Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad del fabricante.

La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose irregularidades, hasta el 100% del suministro.

En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada una de las 3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados en las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, se podrán realizar contraensayos sobre dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del mismo lote, aceptándose el conjunto si las dos resultan conformes a lo especificado.

2.16 Piezas curvas de hormigón para bordillos

1. Definición y características de los elementos

Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una sección transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón
- Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura principal y en su capa superficial

Se han considerado las formas siguientes:

- Recto
- Curvo
- Recto con rigola
- Para vados

Características generales:

La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.

La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.

Las caras horizontales serán planas y paralelas.

Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o achaflanadas.

No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.

La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.

En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.

En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.

La forma de expresión de las medidas será: Altura x anchura.

Espesor de la capa vista: >= 4 mm

Clases en función de la resistencia climática:

- Clase 1 (marcado A): sin medida del % de absorción de agua
- Clase 2 (marcado B): <= 6% de absorción de agua
- Clase 3 (marcado D): valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del ensayo hielo-deshielo; ningún valor unitario > 1,5

Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:

- Clase 1 (marcado F): sin medida de esta característica
- Clase 3 (marcado H): <= 23 mm
- Clase 4 (marcado I): <= 20 mm

Clases en función de la resistencia a flexión:

- Clase 1 (marcado S): valor medio: >= 3,5 MPa; valor unitario: >= 2,8 MPa
- Clase 2 (marcado T): valor medio: >= 5,0 MPa; valor unitario: >= 4,0 MPa
- Clase 3 (marcado U): valor medio: >= 6,0 MPa; valor unitario: >= 4,8 MPa

Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma.

Tolerancias:

- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal: ± 1% al mm más cercano, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviación de otras dimensiones, excepto el radio:
- Caras vistas: ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm
- Otras partes: ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y bordes rectos:
    - Dispositivo de medida de 300 mm de longitud: ± 1,5 mm
    - Dispositivo de medida de 400 mm de longitud: ± 2 mm
    - Dispositivo de medida de 500 mm de longitud: ± 2,5 mm
    - Dispositivo de medida de 800 mm de longitud: ± 4 mm

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.

3. Normativa de obligado cumplimiento

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcado y control de la documentación:

En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:

- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- Identificación del producto
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio

Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el embalaje cuando no sea reutilizado, constará la siguiente información:

- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha de producción
- Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta para el uso
- Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la abrasión y la resistencia a la flexión
- Referencia a la norma UNE-EN 1340
- En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones),
- Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada,

- Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de peatones y de vehículos:
    - Sistema 4: Declaración de Prestaciones

5. Operaciones de control:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:
- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) y recepción del certificado de calidad del fabricante.
- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340).
- Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas cada una, para realizar los siguientes ensayos:
- Resistencia a flexión (UNE-EN 1340).
- Absorción de agua (UNE-EN 1340).
- Resistencia a compresión de testimonios extraídos de las piezas de bordillo (UNE-EN 12390-3).

En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad del producto.

Criterios *de toma de muestras*:

Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad del fabricante.

La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose irregularidades, hasta el 100% del suministro.

En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada una de las 3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados en las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, se podrán realizar contraensayos sobre dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del mismo lote, aceptándose el conjunto si las dos resultan conformes a lo especificado.

2.17 Losetas de mortero de cemento

1. Definición y características de los elementos

Pieza prefabricada hecha con cemento, áridos y eventualmente con colorantes, para pavimentación.

Se han considerado las siguientes piezas:

- Loseta de hormigón gris para aceras
- Loseta de hormigón con tacos para paso de peatones

Características generales:

La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.

La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.

Las caras horizontales serán planas y paralelas.

Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o redondeadas.

No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.

La textura y el color no presentarán diferencias significativas respecto a cualquier muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.

Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de hormigón, o bicapa, con diferentes tipos en su estructura principal y en su capa superficial.

En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.

En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.

La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor.

Longitud: <= 1 m

Relación entre la longitud total y el espesor: > 4

Espesor de la capa vista: >= 4 mm

Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 1339 y se determinarán según esta norma.

Tolerancias:

- Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:
- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm

- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
- Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:
- Clase 1 (marcado N): ± 5 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
- Desviación del espesor respecto del espesor nominal:
- Clase 1 (marcado N): ± 3 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: ± 3 mm
- Clase 3 (marcado R): ± 2 mm
- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza: <= 3 mm
- Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 mm):
- Clase 1 (marcado J):
- Longitud <= 850 mm: 5 mm
- Longitud > 850 mm: 8 mm
- Clase 2 (marcado K):
- Longitud <= 850 mm: 3 mm
- Longitud > 850 mm: 6 mm
- Clase 3 (marcado L):
- Longitud <= 850 mm: 2 mm
- Longitud > 850 mm: 4 mm
- Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión máxima superior a 300 mm):
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:
- Convexidad máxima: 1,5 mm
- Concavidad máxima: 1 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:
- Convexidad máxima: 2 mm
- Concavidad máxima: 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:
- Convexidad máxima: 2,5 mm
- Concavidad máxima: 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:
- Convexidad máxima: 4 mm
- Concavidad máxima: 2,5 mm

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: Empaquetados sobre palets.

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.

3. Normativa de obligado cumplimiento

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcado y control de la documentación:

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel o Clase: A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus modificaciones),
- Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos frente al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada,
- Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de peatones y de vehículos:
    - Sistema 4: Declaración de Prestaciones

En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:

- Identificación del fabricante o la fábrica
- Fecha en que el producto es declarado apto para el uso cuando se entregue con anterioridad a dicha fecha
- Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1339 y los valores declarados por el fabricante:
- Dimensiones nominales
- Resistencia climática
- Resistencia a flexión
- Resistencia al desgaste por abrasión
- Resistencia al deslizamiento/resbalamiento
- Carga de rotura
- Comportamiento frente al fuego
- Referencia a la norma UNE-EN 1339
- Identificación del producto
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE deberá ir acompañado de la información siguiente:
- Nombre o marca identificativa del fabricante
- Dirección registrada del fabricante
- Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado
- Referencia a la norma EN 1339

- El tipo de producto y el uso o los usos previstos
- Información sobre las características/mandatos a declarar:

Para los pavimentos destinados a áreas exteriores de circulación peatonal o de vehículos:

- Resistencia a la rotura
- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento
- Durabilidad

Para los productos destinados a uso interior de solería

- Reacción al fuego
- Resistencia a la rotura
- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento
- Durabilidad
- Conductividad térmica (cuando proceda)

Para los productos destinados a cubiertas:

- Comportamiento ante fuego externo: se considera satisfactorio

Operaciones de control:

En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:

- Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN 1339) y recepción del certificado de calidad del fabricante.
- Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339).
- Para a cada suministrador diferente, se tomarán 9 muestras (6 de 3 piezas cada una y 3 de 6 piezas) para realizar los siguientes ensayos (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 muestras de 3 piezas:
- Absorción de agua.
- Heladicidad.
- Permeabilidad y absorción de agua para la cara vista.
- Resistencia al choque
- Sobre 3 muestras de 6 piezas cada una:
- Resistencia a flexión
- Estructura
- Resistencia al desgaste por abrasión (2 piezas de cada muestra)
- Recepción del certificado de garantía de calidad del fabricante. En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, o otra legalmente reconocida en un país de la CEE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad de producto.

Criterios de toma de muestras:

Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la norma UNE-EN 1339.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad del fabricante.

La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose irregularidades, hasta el 100% del suministro.

En los ensayos de control de lote el resultado de cada serie (valor medio de los resultados de las piezas de cada muestra) debe cumplir las especificaciones. Si una serie no cumple este requisito se podrán realizar contra-ensayos sobre dos muestras más procedentes de mismo lote, aceptando el conjunto si en las dos resultan conformes a lo especificado.

2.18 Pasamanos para barandillas

1. Definición y características de los elementos

Perfil de acabado del travesaño superior de barandillas.

Se han considerado los siguientes materiales:

- De roble, melis o pino flandes
- De latón
- De aluminio

2.18.1.1 *Características generales:*

La cara superior tendrá la forma adecuada al uso y la inferior estará preparada para recibir el perfil del travesaño.

Tolerancias:

- Longitud del perfil: ± 1 mm
- Sección del perfil: ± 2,5%
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Torsión del perfil: ± 1°/m
- Planeidad: ± 1 mm/m
- Ángulos: ± 1°

Pasamanos de madera:

Perfil macizo de madera para remate superior del barandal.

La madera no presentará otros defectos que los citados como admisibles.

El perfil no tendrá nudos muertos.

La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e insectos.

La unión de los perfiles será ensamblada y encolada.

El conjunto de barandilla cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.

Características de la madera:

	Roble	Melis	Pino Flandes
Resist. Compresion (UNE 56-535)	45 N/mm2	60,4 N/mm2	40 N/mm2
Resist. flexión (UNE 56-537)	60 N/mm2	115 N/mm2	80 N/mm2
Resist. al esfuerzo cortante	7,5 N/mm2	4,5 N/mm2	3 N/mm2
Densidad seca (UNE 56-531)	0,63-0,8 kg/dm3	>=0,85 kg/dm3	0,54-0,70 kg/dm3
Densidad verde	>=1,08 kg/dm3	>=1,03 kg/dm3	>= 0,75 kg/dm3

Diámetro de los nudos vivos de la madera: <= 5 mm

Superficie de los hongos blancos: <= 20% de la pieza

Longitud de las grietas superficiales producidas por secado (UNE_EN 1310): <= 5% de la pieza

Humedad de los perfiles (UNE 56529): <= 12%

Diferencia de la humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56-529): <= 6%

<u>Pasamanos de aluminio:</u>

Perfil hueco de aleación de aluminio para remate superior del barandal.

El perfil provendrá de la extrusión del tocho de aluminio.

Estará protegido superficialmente con una capa de óxido de aluminio, posteriormente sellado.

Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos superficiales.

La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto en la DT.

La unión entre perfiles se hará por soldadura, roblones de aleación de aluminio, tornillos autorroscados o tornillos con rosca métrica.

Tipo de aluminio (UNE 38-337): Aleación AL-0,7 Mg Si

Anodizado del perfil (UNE 38-010): >= 15 micras

Calidad del sellado. Método de la gota colorante (UNE 38-017). Media total (M): 0 <= M <= 2

Carga de rotura (para un espesor <= 25 mm UNE 38-337): >= 13 kg/mm2

Dureza Brinell (para un espesor <= 25 mm UNE_EN_ISO 650/1): >= 45

<u>Pasamanos de latón:</u>

Perfil hueco de latón para remate superior del barandal.

El perfil se obtendrá por el proceso de laminado en frío de la aleación.

Tendrá un aspecto uniforme, brillante y no presentará grietas ni defectos superficiales.

La sección y el espesor de las paredes de los perfiles se ajustarán a lo previsto en la DT.

La unión entre perfiles se hará con tornillos de acero inoxidable o de latón, autorroscantes o tornillos con rosca métrica.

Tipo de latón (UNE 37-103): Aleación Cu-Zn

Ancho del pasamano: >= 45 mm

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: Protegido para que llegue a la obra en las condiciones exigidas.

Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en contacto con el suelo.

3. Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

2.19 Barandillas de acero inoxidable

1. Definición y características de los elementos

Conjunto de perfiles huecos de acero inoxidable que forman el bastidor y frontal de las barandillas de protección.

Características generales:

El material será soldable. Contendrá cromo, cromo-níquel o cromo-manganeso-níquel, y será resistente a los ambientes corrosivos.

El tamaño, tipo y disposición de los perfiles cumplirá las especificaciones de la DT.

La unión de los perfiles estará hecha por soldadura.

Las piezas serán rectas excepto indicaciones expresas de la DT.

La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso en ningún punto, de una esfera de diámetro equivalente a la separación entre barrotes de la barandilla, ni facilitará la escalada.

Los extremos estarán acabados según la DT Los montantes tendrán dispositivos de anclaje.

El momento de inercia de los perfiles de la barandilla no solidarios con la obra, serán tales que sometidos a las condiciones de carga más desfavorables, su flecha sea inferior a 1/250 de la luz.

Composición química del acero:

	AISI 304(1.4301)	AISI 316(1.4401)
C	<= 0,07%	<= 0,07%
Mn	<= 2,00%	<= 2,00%
Si	<= 1,00%	<= 1,00%
Cr	17,50% - 19,50%	16,50% - 18,50%
Ni	8,00% - 10,50%	10,00% - 13,00%
Mo	-	2,00% - 2,50%

Resistencia a la tracción: >= 600 N/mm2

Tolerancias:

- Espesor: 2,5%

- Longitud: 0,1%
- Alineación de aristas: 0,2%
- Torsión del perfil: ± 1°/m
- Ángulos: ± 1°

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

Almacenamiento: Sin contacto directo con el suelo, con tacos de separación con la intención de que las barras no flechen más de 1/250 de la luz. No se apilarán tramos sucesivos.

3. Normativa de obligado cumplimiento

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.

2.20 Materiales para señalización horizontal

1. Definición y características de los elementos

Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos.

Microesferas de vidrio y granulado antideslizante para marcas viales

Se han considerado las siguientes pinturas:

- Pintura reflectante
- Pintura no reflectante a base de resinas sintéticas y clorocaucho

Pintura reflectante:

Será de color blanco y del tipo B-118 según UNE 48103.

No se observarán depósitos duros en el fondo del bote ni la existencia de pellejos o coágulos.

Agitado el producto, el contenido del envase se incorporará con facilidad hasta quedar completamente homogéneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la superficie.

Tendrá una consistencia adecuada para que su aplicación pueda realizarse fácilmente por pulverización o por otros medios mecánicos (MELC 12.03).

La película de pintura una vez aplicada, tendrá un aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades en el tono del color ni en el brillo.

El fabricante indicará la cantidad de materia fija de la pintura y su peso específico.

Tiempo de secado (UNE 135202): < 30 min

Sangrado (MELC 12.84): >= 6

Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell

Reflectancia (MELC 12.97): >= 80

Poder de cubrición (UNE 48081): >= 0,95

Consistencia (MELC 12.74): 80-100 U.K.

Materia fija (MELC 12.05): ± 2 unidades

Conservación envase: bueno

Estabilidad envase (ensayo a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48083): <= 5 U.K.

Estabilidad dilución (MELC 12.77): >= 15%

Aspecto: bueno

Flexibilidad (MELC 12.93): buena

Resistencia inmersión en agua (MELC 12.91): buena

Envejecimiento artificial: bueno

Tolerancias:

- Materia fija (MELC 12.05): ± 2
- Peso específico (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell para grises
- Color a las 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell para grises
- Consistencia (UNE 48076): ± 10 U.K.
- Contenido en ligante (UNE 48238): ± 2%
- Contenido en pigmento dióxido de titanio (UNE 48178): ± 1%
- Densidad relativa (UNE-EN ISO 2811-1): ± 2%
- Poder de cubrición (UNE 48081): <= 0,01

<u>Pintura no reflectante:</u>

Tipo de aceite: soja

Tipo de ligante: soja/clorocaucho

Peso específico: 15 kN/m3

Viscosidad Stomer a 25°C: 83 unidades krebs

Tiempo de secado:

- Sin polvo: 30 min
- Seco: 2 h
- Duro: 5 días
- Repintado: >= 8 h

Disolventes utilizables: universal/toluol

Rendimiento: 2,5 m2/kg

Tolerancias:

- Peso específico: ± 1 kN/m3
- Viscosidad Stomer a 25°C: ± 1 unidad krebs
- Rendimiento: ± 0,5 m2/kg

Microesferas de vidrio:

Partículas de vidrio esféricas, transparentes destinadas a asegurar la visibilidad nocturna de las marcas viales por retrorreflexión de los haces de luz incidentes, desde los faros de un vehículo, a su conductor.

La granulometría se describirá fijando los límites inferior y superior de los porcentajes de masa retenida acumulada de microesferas retenida en los tamices de ensayo ISO 565(R40/3).

Tamiz (ISO 565 R 40/3)	Masa retenida acumulada (% en peso)
Superior de seguridad	0 a 2
Superior nominal	0 a 10
Intermedios	N1 a N2 (*)
Inferior nominal	95 a 100

* N2-N1 <= 40

Microesferas defectuosas (MELC 12.30):

- Diámetro < 1 mm: < 20%
- Diámetro >= 1 mm: < 30%

Índice de refracción (MELC 12.31):

- Clase A: >= 1,5
- Clase B: >= 1,7
- Clase C: >= 1,9

Resistencia al agua: Sin alteración superficial

Resistencia a los ácidos: Sin alteración superficial

Resistencia al cloruro cálcico: Sin alteración superficial

Resistencia al sulfuro sódico: Sin alteración superficial

Estos valores han de comprobarse según la norma UNE_EN 1423.

2. Condiciones de suministro y almacenaje

Pintura:

Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura.

Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y no expuestos al sol. No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h.

Microesferas de vidrio y granulado antideslizante:

Suministro: En envase cerrado.

Almacenamiento: En su envase de origen, sin que se alteren sus condiciones.

3. Normativa de obligado cumplimiento

Pintura:

* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.

Microesferas de vidrio:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos.

Granulado antideslizante:

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4. Condiciones de control de recepción

Condiciones de marcaje y control de la documentación de las microesferas de vidrio:

El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Productos para zonas aptas para la circulación:
  - Sistema 1: Declaración de Prestaciones

Cada envase llevará en un lugar visible el marcado CE de conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que a más deberá contener la siguiente información:

- Nombre o marca de identificación del fabricante y dirección registrada
- Las dos últimas cifras del año de fabricación del producto
- Número del certificado de conformidad CE
- El número y año de esta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripción del producto
- El número de lote y masa neta
- La presencia eventual de tratamientos superficiales y su finalidad.
- Indicaciones que permitan identificar les características armonizadas del producto:
- Índice de refracción
- Granulometría
- Resistencia a la fragmentación (pera granulados antideslizantes)
- En caso de mezcla de microesferas de vidrio y áridos antideslizantes, les proporciones de ambos.

Operaciones de control para pintura:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- En cada suministro, se comprobará que el etiquetado de los envases contenga los datos exigidos en las especificaciones.
- En caso que disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad de producto.
- Para cada suministro, se exigirá el certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados de los ensayos siguientes:
- Punto de inflamación UNE 104281-1-12)

- Envejecimiento artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacidad de cubrimiento en humedad (MELC 12.96)
- Consistencia (MELC 12.74)
- Punto de reblandecimiento (UNE 135222)
- Tiempos de secado (MELC 12.71)
- Estabilidad al calor (UNE 135222)
- Cantidad de materia fija (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistencia al flujo (UNE 135222)
- Estabilidad (UNE 48083)
- Resistencia al cambio de color por efecto de aglomerado asfáltico (MELC 12.84)
- Flexibilidad (MELC 12.93)
- Resistencia a la inmersión en agua (UNE-EN ISO 2812-2)
- Contenido de ligante (UNE 48238)
- Contenido de pigmento (UNE-EN ISO 591-1)
- Resistencia a los álcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densidad relativa (UNE-EN ISO 2811-1)

En caso de pintar sobre un pavimento de hormigón, se realizará, además, el ensayo de resistencia a los álcalis (UNE-EN ISO 2812-1).

Siempre que no se reciban estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la DF no los considere representativos, el contratista deberá realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y fuera del presupuesto de autocontrol.

Operaciones de control de las microesferas de vidrio:

- En cada suministro, se comprobará que el etiquetado de los envases contenga los datos exigidos en las especificaciones.
- En caso que disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad de producto.
- Para cada suministro, se exigirá el certificado de calidad del fabricante, donde consten los resultados de los ensayos siguientes:
- Microesferas defectuosas (UNE-EN 1423/A1)
- Índice de refracción (UNE-EN 1423/A1)
- Resistencia a agentes químicos (UNE-EN 1423)
- Granulométrico (UNE-EN 1423/A1)

Siempre que no se reciban estos resultados antes del inicio de la actividad, o que la DF no los considere representativos, el contratista deberá realizar los ensayos correspondientes, a su cargo y fuera del presupuesto de autocontrol.

Criterio de toma de muestras para pintura:

La toma de muestras se realizará de acuerdo a las indicaciones de la norma UNE 135200-2.

- En función del tipo de pintura, la toma de muestras por los ensayos de identificación se realizará con los siguientes criterios:
- Pinturas: 5 botes de 1 litro extraídos de la pistola de la máquina, sin aire.
- Termoplásticos: Un bote original y una muestra de unos 4 kg tomada a la salida de la máquina.
- Plásticos: 5 muestras en cantidades equivalentes de los dos componentes.

En cualquier caso, se guardarán dos muestras más en previsión a la necesidad de repetir algún ensayo.

Criterio de toma de muestras para las microesferas de vidrio:

La toma de muestras se realizará de acuerdo a las indicaciones de la norma UNE-EN 1423/A1.

- En función del tipo de pintura, la toma de muestras por los ensayos de identificación se realizará con los siguientes criterios:
- Microesferas: 3 botes de 1 kg a la salida de la máquina, obtenidos al principio, a la mitad y al final del vaciado del tanque, y sobre 1 saco original de 25 kg.

En cualquier caso, se guardarán dos muestras más en previsión a la necesidad de repetir algún ensayo.

Interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento:

No se utilizarán materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las especificaciones del pliego.

Los ensayos de identificación tienen que resultar conformes a las especificaciones. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo correspondiente sobre las muestras reservadas, aceptándose el suministro si los dos resultados son satisfactorios.

2.21 Señales

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación en vías utilizadas por vehículos y/o peatones.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Señales de contenido fijo, que son las que tienen un contenido preestablecido por el
- Catálogo de señales verticales de circulación publicado por la Dirección General de
- Carreteras; únicamente varían su tamaño y los números que incluyen en algunos casos.
- Paneles complementarios, aquellos que acompañan a las señales de contenido
- fijo y acotan su prescripción.

Se han considerado los siguientes materiales:

- Aluminio anodizado.
- Acero galvanizado

Se han considerado los siguientes acabados:

- Con pintura no reflectora
- Con lámina retrorreflectante.

CARACTERISTICAS GENERALES:

La placa señal estará formada por estampación de una plancha de aluminio o de acero galvanizado, con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para su anclaje, y recubierta con el acabado que le sea propio, pintura no reflectora o con una lámina retrorreflectante.

La utilización de materiales de otra naturaleza deberá ser aprobada por la DF.

La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la intemperie.

No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales.

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1.

No se admitirán las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):

- P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm)).
- E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato es una placa plana).
- SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión).

Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en la DT, de acuerdo con el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.

Las estructuras y elementos de acero han de ser conformes con la Norma EN 1993-1-1.

Les estructuras y elementos de aluminio han de ser conformes con la Norma EN 1999-1-1.

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. del PG 3/75 MOD 11-OM

No se admitirá el empleo de las siguientes clases:

- Presión de viento: Clase WL2
- Presión debida a la nieve: Clase DSL0
- Cargas puntuales: Clase PL0
- Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4
- Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2.

ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANTE:

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1.

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.

ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANTE:

Estará exenta de corrosión, y no presentar defectos que impidan su visibilidad o identificación correctas, como abolladuras, etc.

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exenta de granos y de cualquier otra imperfección superficial

Los colores estarán dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia especificados en la norma UNE 135331

Brillo especular a 60°C: > 50%

Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No aparecerán dientes de sierra

Resistencia al impacto (ensayo 4.5): Sin rotura

Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6):

- Inmediatamente después del ensayo: Sin ampollas, arrugas ni reblandecimientos
- A las 24 horas: Brillo especular >= 90% brillo antes del ensayo

Resistencia a la niebla salina: Cumplirá especificaciones art. 3.7

Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9):

- No habrá ampollas, pérdida de adherencia o defectos apreciables

Envejecimiento artificial: Cumplirá las condiciones art. 3.9.

Envejecimiento natural: cumplirá las condiciones del artículo 3.10

Todos estos valores se comprobarán de acuerdo con la UNE 135331.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. En el exterior figurará el símbolo de las placas y el número de unidades.

Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con el suelo.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:

El fabricante debe facilitar la información del producto. Cuando la misma no pueda marcarse sobre el producto, debe estar en la documentación que lo acompaña. En este caso el producto debe tener un código de identificación.

Todos los productos y componentes de las señales verticales fijas de circulación han de estar marcados en su reverso de forma clara y duradera con la siguiente información:

- Símbolo del marcado CE
- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante

- Los 2 últimos dígitos del año en que se fija el marcado

- Número de certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción en fábrica si procede

- Referencia a la norma europea: EN 12899-1:2007

- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto

- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en las tablas ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicadas según apartado ZA.3 de la misma norma

El fabricante o suministrador debe facilitar la siguiente información:

- Instrucciones de montaje e instalación de la señal

- Datos sobre cualquier limitación de la ubicación de la señal

- Instrucciones de uso y mantenimiento y limpieza de la señal, incluyendo las instrucciones para el cambio de lámparas si fuera el caso

El fabricante facilitará a la DO, con cada suministro, un albarán con documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora

- Fecha de suministro

- Identificación de la fábrica que ha producido el material

- Identificación del vehículo que lo transporta

- Cantidad suministrada y designación de la marca comercial

OPERACIONES DE CONTROL:

La DO podrá comprobar sobre una muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña, en especial las dimensiones de las señales y carteles verticales, así como la retrorreflexión del material.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

La toma de muestras se realizará de acuerdo a las indicaciones de la norma PG 3/75 MOD 6-OM.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se utilizarán materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las especificaciones del pliego.

Los ensayos de identificación tienen que resultar conformes a las especificaciones. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo correspondiente sobre las muestras reservadas, aceptándose el suministro si los dos resultados son satisfactorios.

Se considera unidad defectuosa aquella que presenta algún incumplimiento en las operaciones de control definidas.

2.22 Carteles

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos para colocar verticalmente, destinados a informar y ordenar la circulación en vías utilizadas por vehículos y/o peatones.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Carteles, aquellas señales cuyo diseño varía en función de las informaciones a suministrar.

Se han considerado los siguientes materiales:

- Aluminio anodizado.
- Acero galvanizado

Se han considerado los siguientes acabados:

- Con pintura no reflectora
- Con lámina retrorreflectante.

CARACTERISTICAS GENERALES:

La placa señal estará formada por estampación de una plancha de aluminio o de acero galvanizado, con los elementos de refuerzo y anclaje necesarios para su anclaje, y recubierta con el acabado que le sea propio, pintura no reflectora o con una lámina retrorreflectante.

Los carteles están constituidos por un conjunto de lamas (de 175 mm. de altura) que forman la placa en la que están inscritos los símbolos o leyendas de una señal.

La superficie metálica será limpia, lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la intemperie.

No presentará arañazos, abolladuras ni otros defectos superficiales.

El sustrato de las señales y carteles verticales de circulación cumplirán con lo indicado en la norma UNE-EN 12899-1.

No se admitirán las siguientes clases (de acuerdo con la UNE-EN 12899-1):

- P1 para la perforación de la cara de la señal (cara de la señal con perforaciones en su superficie a una distancia no inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm)).

- E1 para los bordes de la placa de la señal (los bordes de la señal no están protegidos, el sustrato es una placa plana).

- SP0 para la protección de la superficie de la placa de la señal (sin protección alguna de la superficie de la señal frente a la corrosión).

Tendrán las dimensiones, colores y composición indicadas en la DT, de acuerdo con el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de Circulación, así como en la vigente Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.

Las estructuras y elementos de acero han de ser conformes con la Norma EN 1993-1-1.

Les estructuras y elementos de aluminio han de ser conformes con la Norma EN 1999-1-1.

Las características de las señales y carteles serán las especificadas en la Tabla 701.1. del PG 3/75 MOD 11-OM

No se admitirá el empleo de las siguientes clases:

- Presión de viento: Clase WL2

- Presión debida a la nieve: Clase DSL0

- Cargas puntuales: Clase PL0

- Deformación temporal máxima a flexión: Clase TDB4

- Deformación temporal máxima a torsión: Clase TDT0

Sólo se admitirán las señales y carteles verticales de circulación para los que los coeficientes parciales de seguridad para cargas empleados sean de la clase PAF2.

ACABADO CON LÁMINA RETRORREFLECTANTE:

Los materiales retrorreflectantes constituidos por microesferas de clase RA1 y clase RA2, serán conformes con las características visuales (coordenadas cromáticas, factor de luminancia, coeficiente de retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE-EN 12899-1.

Los materiales microprismáticos de clase RA1, RA2 y RA3, por su parte, cumplirán las características de las normas UNE-EN 12899-1 y UNE 135340.

ACABADO CON PINTURA NO RETRORREFLECTANTE:

Estará exenta de corrosión, y no presentar defectos que impidan su visibilidad o identificación correctas, como abolladuras, etc.

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, brillante, exenta de granos y de cualquier otra imperfección superficial

Los colores estarán dentro de los límites cromáticos y de factor de luminancia especificados en la norma UNE 135331

Brillo especular a 60°C: > 50%

Adherencia (ensayo 4.4): <= 1, No aparecerán dientes de sierra

Resistencia al impacto (ensayo 4.5): Sin rotura

Resistencia a la inmersión en agua (ensayo 4.6):

- Inmediatamente después del ensayo: Sin ampollas, arrugas ni reblandecimientos
- A las 24 horas: Brillo especular >= 90% brillo antes del ensayo

Resistencia a la niebla salina: Cumplirá especificaciones art. 3.7

Resistencia al calor y al frío (ensayo 4.8 y 4.9):

- No habrá ampollas, pérdida de adherencia o defectos apreciables

Envejecimiento artificial: Cumplirá las condiciones art. 3.9.

Envejecimiento natural: cumplirá las condiciones del artículo 3.10

Todos estos valores se comprobarán de acuerdo con la UNE 135331.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas individualmente o agrupadas en embalaje rígido de madera o metálico. En el exterior figurará el símbolo de las placas y el número de unidades.

Almacenamiento: Asentadas en horizontal en lugares secos, ventilados y sin contacto directo con el suelo.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.

* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:

El fabricante debe facilitar la información del producto. Cuando la misma no pueda marcarse sobre el producto, debe estar en la documentación que lo acompaña. En este caso el producto debe tener un código de identificación.

Todos los productos y componentes de las señales verticales fijas de circulación han de estar marcados en su reverso de forma clara y duradera con la siguiente información:

- Símbolo del marcado CE
- Número de identificación del organismo de certificación
- Nombre o marca distintiva de identificación y dirección registrada del fabricante
- Los 2 últimos dígitos del año en que se fija el marcado
- Número de certificado de conformidad CE o del certificado de control de producción en fábrica si procede
- Referencia a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto
- Información sobre aquellas características esenciales que procedan recogidas en las tablas ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicadas según apartado ZA.3 de la misma norma

El fabricante o suministrador debe facilitar la siguiente información:

- Instrucciones de montaje e instalación de la señal
- Datos sobre cualquier limitación de la ubicación de la señal
- Instrucciones de uso y mantenimiento y limpieza de la señal, incluyendo las instrucciones para el cambio de lámparas si fuera el caso

El fabricante facilitará a la DO, con cada suministro, un albarán con documentación anexa conteniendo, entre otros, los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora
- Fecha de suministro
- Identificación de la fábrica que ha producido el material
- Identificación del vehículo que lo transporta
- Cantidad suministrada y designación de la marca comercial

OPERACIONES DE CONTROL:

La DO podrá comprobar sobre una muestra representativa de los materiales suministrados, que la marca, referencia y características de los mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña, en especial las dimensiones de las señales y carteles verticales, así como la retrorreflexión del material.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

La toma de muestras, se realizará de acuerdo a las indicaciones de la norma PG 3/75 MOD 6-OM.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se utilizarán materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las especificaciones del pliego.

Los ensayos de identificación tienen que resultar conformes a las especificaciones. En caso de incumplimiento, se repetirá el ensayo correspondiente sobre las muestras reservadas, aceptándose el suministro si los dos resultados son satisfactorios.

Se considera unidad defectuosa aquella que presenta algún incumplimiento en las operaciones de control definidas.

2.23 Materiales auxiliares para protecciones de vialidad

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales auxiliares para protecciones de vialidad.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Poste de perfil en C y tubular para barreras de seguridad flexibles
- Soporte de tubo de acero laminado y galvanizado para soporte de señalización
- Accesorios o piezas especiales para barreras de seguridad flexibles

- Separador para barrera metálica simple
- Separador para barrera metálica doble
- Conector de poste tubular
- Terminal en forma de cola de pez aplastada para barreras de seguridad
- Pieza para sustentación del sistema de protección de motociclistas
- Pieza angular para extremo de barrera metálica
- Tope final para barrera metálica simple
- Captafaros para barreras de seguridad
- Parte proporcional de elementos de fijación para barreras de seguridad
- Captafaros retrorreflectantes para señalización horizontal, para fijar al pavimento

POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:

Elemento que soporta la barrera y que se inserta en el terreno.

Fabricado con acero tipo S 235 JR según UNE-EN 10025.

Con aptitud química a la galvanización: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)

El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.

La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.

Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras

Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc.

Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas.

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar.

Dimensiones y tolerancias de postes tipo C: UNE 135122.

Dimensiones y tolerancias de postes tubulares: UNE 135123.

Espesor nominal poste tipo C: 4 mm

Espesor nominal poste tubular: 3 mm

SOPORTES DE SEÑALIZACIÓN:

Perfil de sección cerrada, no maciza, de acero laminado y galvanizado en caliente, para el soporte de señalización vertical.

Para señales de circulación, los soportes cumplirán las condiciones de la UNE 135312, UNE 135314.

Tipo de acero: AP 11 (UNE 36093)

El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.

Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras

Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc.

Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas.

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar.

La altura del soporte será la especificada en el proyecto.

Doblado (UNE 7472): Cumplirá

Tolerancias:

- Dimensión: ±1% (mínimo ±5 mm)
- Grosor: -10% (toler.+limitada por toler. en masa)
- Masa: +8%; -6%

Alargamiento hasta la rotura:

Grueso (mm)	Alargamiento mínimo (%)	
	Longitudinal	Transversal

<=40	26	24
> 40 <=65	25	23

ACCESORIOS O PIEZAS ESPECIALES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:

Accesorio necesario para la instalación de las barreras, así como para asegurar su correcto funcionamiento.

Fabricado con acero tipo S 235 JR según UNE-EN 10025.

Con aptitud química a la galvanización: contenido de silicio y fósforo limitados (Si<=0,03% y Si+2,5P<=0,09%)

El acero estará protegido contra la corrosión mediante galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.

La calidad del zinc utilizado en el galvanizado estará de acuerdo con la UNE-EN 1179.

Espesor del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 70 micras

Masa del recubrimiento galvanizado (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2

No presentará abolladuras, puntos de oxidación ni desperfectos en su superficie.

El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de zinc.

Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas.

No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos sin galvanizar.

Dimensiones y tolerancias de separador, terminal cola de pez, pieza angular y tope final : UNE 135122.

Dimensiones y tolerancias de conector de poste tubular : UNE 135123.

Espesor nominal: 3 mm

CAPTAFAROS REFLECTORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:

Captaluces de forma angular, realizado con chapa de acero laminado y galvanizado en caliente, recubierto por el exterior de una lámina reflectante para fijar en la barrera de seguridad.

Debe ser capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente.

No presentará abolladuras, puntos de oxidación, ralladas en la lámina reflectante ni desperfectos en su superficie.

Tipo de acero: S235JR (UNE-EN 10025-2)

Espesor: 3 mm

CAPTAFAROS PARA COLOCAR EN PAVIMENTO:

Los captafaros se clasifican en función de su empleo en:

- Permanentes (color blanco en la parte no retrorreflectante)
- Temporales (color amarillo de la parte no retrorreflectante)

En función de la naturaleza del retrorreflector, se clasifican en:

- Código 1: retrorreflector de vidrio
- Código 2: retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica
- Código 3: retrorreflector orgánico de naturaleza polimérica, protegido con una superficie resistente a la abrasión

Si esta formado por dos o más partes, cada una de éstas podrá desmontarse (en caso de necesidad de sustitución) únicamente con la herramienta recomendada por el fabricante.

El elemento reflectante puede ser unidireccional o bidireccional.

La zona reflectante del captafaros estará constituida por retroreflectores de vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos con una superficie resistente a la abrasión.

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento, tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores, indicados en la UNE-EN 1463-1.

El contorno del cuerpo del elemento no presentará bordes afilados que constituyan peligro para la seguridad de la circulación vial.

Los sistemas de anclaje asegurarán su fijación permanente y que, en caso de arrancamiento o rotura, no produzcan peligro para el tráfico, ni por causa del elemento arrancado ni por los elementos de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada.

Llevará marcado en la parte superior de forma indeleble y bien visible, como mínimo, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación.

Las características técnicas del elemento serán las definidas en la UNE-EN 1463-1 y se comprobarán según esta norma.

PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:

Conjunto de elementos de fijación de acero, formados mediante estampación y galvanizados en caliente, necesarios para la fijación de un metro de barrera de seguridad.

Cumplirán las condiciones de la norma UNE 135122.

Se utilizará acero de tipo S235JR, según UNE-EN 10025. En elementos de unión (tornillos) no definidos por ninguna norma se utilizarán aceros de características similares a los normalizados.

Recubrimiento galvanizado en caliente según la norma UNE-EN ISO 10684.

Las superficies serán lisas, no presentarán fisuras, rebabas ni otros defectos superficiales.

Los hilos de la rosca de los tornillos no tendrán defecto de material ni huellas de herramienta.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:

Suministro: Los perfiles irán marcados con la identificación del fabricante. El marcado deberá ser legible a simple vista e indeleble.

Almacenamiento: En zonas a cubierto. Si no es posible se almacenarán con una pendiente mínima del 1,5 % en el sentido longitudinal del perfil y con una separación mínima de 4 cm entre los perfiles y el terreno.

En caso de suministrarse paletizados y plastificados, se retirarán los plásticos.

El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.

SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN:

Suministro: Cada elemento tendrá grabadas las siglas del fabricante y el símbolo de designación del acero.

Almacenamiento: En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo.

ACCESORIOS PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:

Suministro: Marcados con la identificación del fabricante. El marcado deberá ser legible a simple vista e indeleble.

Almacenamiento: En zonas a cubierto. En lugares secos y ventilados sin contacto directo con el suelo.

Los paquetes deben ir paletizados y no se deben apilar.

En caso de suministrarse plastificados, se retirarán los plásticos.

El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.

CAPTAFAROS:

Suministro: Empaquetados en cajas, de manera que no se alteren sus características. En el exterior figurará el número de unidades que contiene.

Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus características.

PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS:

Suministro: Empaquetados en cajas. En el exterior figurarán las características del elemento de fijación y el número de unidades que contiene.

Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus características.

No deben apilarse en más de dos alturas.

En caso de suministrarse plastificados, se retirarán los plásticos.

El acopio se realizará en zonas lisas, limpias y pavimentadas.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA GENERAL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

POSTES DE PERFIL EN C, SEPARADORES, PIEZAS ANGULARES, TOPES FINALES, TERMINALES EN FORMA DE COLA DE PEZ Y PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE FIJACION PARA BARRERAS DE SEGURIDAD FLEXIBLES:

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.

POSTES DE PERFIL TUBULAR Y CONECTOR DE POSTE TUBULAR:

* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de la barrera metálica simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.

* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.

CAPTAFAROS REFLECTORES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.

* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de ensayo.

CAPTAFAROS PARA COLOCAR EN PAVIMENTO:

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Inspección visual del material suministrado con observación de las marcas que identifican al fabricante, y recepción del correspondiente certificado de calidad donde se garanticen las condiciones indicadas en el pliego. Atención especial al aspecto superficial del galvanizado.

OPERACIONES DE CONTROL EN SOPORTES:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Cada 2000 kg, o fracción, de soportes de las mismas características (lote de control), se realizarán los siguientes ensayos:

- Características mecánicas: resistencia a tracción, límite elástico y alargamiento de ruptura (UNE-EN 10025).

En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido en la marca de calidad del producto.

OPERACIONES DE CONTROL EN POSTES PARA BARRERAS DE SEGURIDAD:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Cada 256 m de barrera de seguridad se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado según la norma UNE-EN ISO 1461.

- Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento (métodos no destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461)

- Comprobación de las características geométricas de los postes.

OPERACIONES DE CONTROL EN SOPORTES PARA SEÑALIZACIÓN:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Cada 100 m de soportes utilizados en la obra, se realizarán las siguientes comprobaciones:

- Determinación de la masa por unidad de superficie de una película de galvanizado según la norma UNE-EN ISO 1461.

- Comprobación del recubrimiento: ensayos de adherencia y masa del recubrimiento (métodos no destructivos) (ensayos conforme UNE-EN ISO 1461)

- Comprobación de las características geométricas de los soportes.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios de las normas de procedimiento indicadas en cada ensayo.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se aceptará el uso de materiales que no lleguen acompañados del correspondiente certificado de calidad del fabricante.

Los resultados de los ensayos de identificación cumplirán las condiciones del pliego. En caso de incumplimiento en una comprobación, se repetirá el ensayo sobre do muestras más del mismo lote, aceptando el conjunto, cuando estas resulten satisfactorios.

3 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

3.1 Actuaciones previas y demoliciones

3.1.1 Desmontajes y arranques de pavimentos y soleras

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de pavimentos.

El derribo y el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna utilidad y será transportado a un vertedero.

El desmontaje presupone que parte o todo el material resultante tendrá una utilidad posterior, y será limpiado, clasificado, identificado con marcas que sean reconocibles con posterioridad, y, si es necesario, croquizada su posición original.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Pavimento de hormigón

- Pavimento de mezcla bituminosa

- Pavimentos de adoquines, baldosas hidráulicas, etc.

- Solera de hormigón

Determinación del grado de dificultad de intervención en las unidades de obra donde intervienen restauradores:

- Valorar de 0 a 3 los aspectos siguientes:

    - Degradación/fragilidad del elemento a tratar

    - Dificultad/complejidad del tratamiento a realizar

    - Dificultad de acceso del elemento a tratar

- Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el criterio siguiente:

    - Suma 0 a 3: Grado de dificultad bajo

    - Suma 4 a 6: Grado de dificultad medio

    - Suma 7 a 9: Grado de dificultad alto

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Derribos o arrancados:

- Preparación de la zona de trabajo

- Demolición del elemento con los medios adecuados

- Troceado y apilado de los escombros

- Carga de escombros sobre camión

Desmontaje:

- Preparación de la zona de trabajo

- Numeración de las piezas y croquis de su posición, si es necesario

- Desmontaje por partes, y clasificación del material

- Limpieza de las piezas y carga para el transporte al lugar de acopio

- Carga y transporte de los escombros al vertedero

CONDICIONES GENERALES:

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.

DESMONTAJE:

El material estará clasificado e identificada su situación original.

El material estará almacenado en condiciones adecuadas, para que no se estropee.

Las estructuras de madera han de estar protegidas de la lluvia, el sol y las humedades. Estarán separadas del suelo.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección Facultativa antes de iniciar las obras, donde se especificará, como mínimo:

- Método de demolición y fases

- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios

- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse

- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados

- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición

- Cronograma de los trabajos

- Pautas de control y medidas de seguridad y salud

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existente, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección Facultativa.

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

Los materiales de acopio y posterior reaprovechamiento se deben situar en una zona amplia y apartada.

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.1.2 Derribos de estructuras

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Derribo de elementos estructurales, con medios mecánicos, con carga manual o mecánica sobre camión.

Se han considerado los siguientes materiales:

- Mampostería
- Obra cerámica
- Hormigón en masa
- Hormigón armado

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Corte de armaduras y elementos metálicos
- Troceado y apilado de los escombros
- Carga de los escombros sobre el camión

CONDICIONES GENERALES:

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la iniciación de los trabajos, donde se especificará, como mínimo:

- Método de demolición y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse

- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.

Se demolerá de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la demolición se haga prácticamente al mismo nivel.

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demolerán antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad.

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan cargas.

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación Técnica o en su defecto, la DF.

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento si este es estable y si su altura es <= 2 m.

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su derrumbamiento.

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas sobre la estructura por acumulación de material.

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

3.1.3 Demoliciones de elementos de vialidad

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de pavimentos.

Corte hecho con máquina corta-juntas en un pavimento que se debe de demoler, para delimitar la zona afectada, y que al realizar la demolición, los límites del pavimento que quede sean rectos y uniformes.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón
- Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceado y apilado de los escombros

CONDICIONES GENERALES:

Estará hecho en el lugar indicado por la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la iniciación de los trabajos, donde se especificará, como mínimo:

- Método de demolición y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban conservarse
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la demolición
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

3.1.4 Desmontajes, arranques y demoliciones de elementos de seguridad, protección y señalización

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Demolición o desmontaje de elementos de seguridad, protección y señalización, con medios mecánicos y carga sobre camión.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes clavados al suelo

- Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de hormigón

- Demolición de barrera de seguridad rígida de hormigón
- Desmontaje de barandilla metálica
- Desmontaje de reja y anclajes

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Corte de armaduras y elementos metálicos
- Troceado y apilado de los escombros
- Carga de los escombros sobre el camión

CONDICIONES GENERALES:

Los restos de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.

Los elementos desmontados quedarán apilados para facilitar la carga.

Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen (transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).

Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material y en condiciones de uso.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.

Se separarán las bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos y tuercas, y después las piezas separadoras.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno.

Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de demoler y cargar.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.

La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

3.1.5 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición a instalación autorizada de gestión de residuos

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o demolición o material de excavación.

Se han considerado las siguientes operaciones:

- Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de construcción o demolición
- Suministro y retirada del contenedor de residuos

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes.

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.

TRANSPORTE A OBRA:

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.

Las áreas de vertido serán las definidas por el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y Derribos" de la obra.

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados en el "Plan de gestión de Residuos de la Construcción y los Derribos" de la obra.

Las tierras cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones en función de su uso, y necesitan la aprobación previa de la DF.

TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS:

Los materiales de desecho que indique el "Plan de Gestión de Residuos de la Construcción y los Derribos" y los que la DF no acepte para ser reutilizados en obra, se transportarán a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo.

El contratista entregará al promotor un certificado donde se indique, como mínimo:

- Identificación del productor
- Identificación del poseedor de los residuos
- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y si es pertinente, el número de licencia de obras
- Identificación del gestor autorizado que ha recibido el residuo, y si este no es hace la gestión de valorización o eliminación del residuo, la identificación de quien hará esta gestión.
- Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS:

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

3.2 Actuaciones de mejora de accesibilidad

3.2.1 Pavimentos de losetas de mortero de cemento

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Formación de pavimento de losetas de hormigón.

Se han considerado los siguientes casos:

- Pavimentos de losetas de hormigón colocadas al tendido con arena-cemento, con o sin soporte de 3 cm de arena

- Pavimentos de losetas de hormigón colocadas pique de maceta con mortero, con o sin soporte de 3 cm de arena

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

En la colocación al tendido con arena-cemento:

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento

- Colocación de la capa de arena, en su caso

- Colocación de la arena-cemento
- Colocación de las piezas de loseta de hormigón
- Humectación de la superficie
- Confección y colocación de la lechada

En la colocación a pique de maceta con mortero:

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la capa de arena, en su caso
- Colocación de la capa de mortero
- Humectación de las piezas a colocar
- Colocación de las piezas
- Humectación de la superficie
- Confección y colocación de la lechada

CONDICIONES GENERALES:

El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.

En el pavimento no existirán piezas desportilladas, manchas ni otros defectos superficiales.

Las piezas estarán colocadas a tope y alineadas.

Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba.

Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la DT.

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:

- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro

Las entregas del pavimento se realizarán contra la aceras o los muretes.

Tendrá juntas laterales de contracción cada 25 m2, de 2 cm de espesor, sellados con arena. Estas juntas estarán lo más cerca posible de las juntas de contracción de la base.

Las juntas que no sean de contracción quedarán llenas de lechada de cemento portland.

Pendiente transversal: >= 2%

Tolerancias de ejecución:

- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Rectitud de las juntas: ± 3 mm/2 m
- Replanteo: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Se colocarán empezando por las aceras o los muretes.

Una vez colocadas las piezas se extenderá la lechada.

No se pisará después de haberse vertido la lechada, hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.

COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA:

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se colocaran las piezas de loseta.
- Control del aspecto de les pieza antes de la su colocación.

- Inspección del proceso de ejecución, de acuerdo a las indicaciones del pliego.
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

- Inspección visual de la unidad acabada.
- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección por parte del contratista, de los defectos de colocación según las instrucciones de la DF.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

3.2.2 Bordillos rectos con piezas de hormigón

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Formación de bordillo con diferentes materiales.

Se han considerado las siguientes unidades de obra:

- Bordillo de piezas de piedra u hormigón colocadas sobre base de hormigón

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

BORDILLO DE PIEDRA U HORMIGÓN:

El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos.

Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola.

Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.

En el caso de colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 5 cm sobre el lecho de hormigón.

Dimensiones de la base de hormigón (en su caso):

- Anchura de la base de hormigón: Espesor del bordillo + 5 cm
- Espesor de la base de hormigón: 4 cm

Pendiente transversal: >= 2%

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas.

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa compacta.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de la DF.

Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen las piezas de bordillo o de rigola.
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación.
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones del pliego y al procedimiento adoptado

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

Inspección visual de la unidad acabada.

- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

3.2.3 Bordillos curvos con pieza de hormigón

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Formación de bordillo con diferentes materiales.

Se han considerado las siguientes unidades de obra:

- Bordillo de piezas de piedra u hormigón colocadas sobre base de hormigón

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

BORDILLO DE PIEDRA U HORMIGÓN:

El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos.

Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola.

Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.

En el caso de colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 5 cm sobre el lecho de hormigón.

Dimensiones de la base de hormigón (en su caso):

- Anchura de la base de hormigón: Espesor del bordillo + 5 cm
- Espesor de la base de hormigón: 4 cm

Pendiente transversal: >= 2%

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos)

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin lluvias.

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas.

El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa compacta.

Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de la DF.

Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Control de ejecución y acabados de la base de hormigón sobre la que se coloquen las piezas de bordillo o de rigola.
- Control del aspecto de las piezas antes de su colocación.
- Inspección visual del procedimiento de ejecución, de acuerdo a las condiciones del pliego y al procedimiento adoptado

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

Inspección visual de la unidad acabada.

- Comprobación topográfica de las alineaciones y condiciones generales de acabado.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

3.2.4 Base de hormigón

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Formación de subbase o base de hormigón para soporte de pavimento.

Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, y extendido y vibración mecánica la colocación del hormigón con extendedora.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Montaje de encofrados
- Colocación del hormigón
- Ejecución de juntas de dilatación y hormigonado
- Protección del hormigón fresco y curado
- Desmontaje de los encofrados

CONDICIONES GENERALES:

La superficie acabada estará maestreada.

No presentará grietas ni discontinuidades.

Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas.

Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias no superiores a 25 m; serán de 2 cm de ancho y estarán llenas de un material flexible.

Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de retracción.

Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el Código Estructural

Tolerancias de ejecución:

- Espesor: - 15 mm
- Nivel: ± 10 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5°C y 40°C.

Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado del hormigón fresco.

Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la superficie del hormigón con los medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar.

Este proceso será como mínimo de:

- 15 días en tiempo caluroso y seco
- 7 días en tiempo húmedo

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba el Código Estructural.

3.2.5 Pavimentos de piezas cerámicas

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Formación de pavimento de adoquines o losas.

Se han considerado los siguientes materiales y formas de colocación:

- Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena
- Pavimento de adoquines o losas sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero
- Pavimento de adoquines o losas colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

En pavimentos colocados sobre lecho de arena y rejuntados con mortero:

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del lecho de arena
- Compactación y colocación de las piezas
- Rejuntado de las piezas con mortero
- Limpieza, protección del mortero y curado

En la colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación del lecho de arena
- Colocación y compactación de los adoquines
- Relleno de las juntas con arena
- Compactación final de los adoquines
- Barrido del exceso de arena

En la colocación de adoquines con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento:

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento
- Colocación de la base de mortero seco
- Humectación y colocación de los adoquines
- Compactación de la superficie
- Humectación de la superficie
- Relleno de las juntas con lechada de cemento

CONDICIONES GENERALES:

El pavimento formará una superficie plana, sin resaltes entre piezas, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.

Las piezas quedarán bien asentadas, con la cara más pulida o más ancha arriba.

Las piezas estarán dispuestas formando alineaciones rectas, según el despiece definido en la DT.

Excepto en las zonas clasificadas de uso restringido por el CTE no se admitirán las siguientes discontinuidades en el propio pavimento ni en los encuentros de éste con otros elementos:

- Imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm
- Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%
- En zonas interiores de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA

Las piezas deben quedar bien adheridas al soporte.

Las juntas quedarán llenas de material de relleno.

Pendiente transversal (pavimentos exteriores): >= 2%, <= 8%

Cuando el pavimento se tome con mortero se deberán respetar las juntas propias del soporte.

PAVIMENTO DE ADOQUINES:

Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo las especificaciones de la DT.

Juntas entre piezas: <= 8 mm

Tolerancias de ejecución:

- Nivel: ± 12 mm
- Replanteo: ± 10 mm
- Planeidad: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA

La superficie del soporte estará limpia y húmeda.

El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación o lo indicado por la DT

COLOCACION SOBRE LECHO DE ARENA:

No se trabajará en condiciones metereológicas que puedan producir alteraciones a la sub-base o lecho de arena.

El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo.

Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.

PAVIMENTOS REJUNTADOS CON ARENA:

Las juntas se rellenarán con arena fina.

Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 ó 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo final con arena para acabar de rellenar las juntas.

La compactadora tendrá ruedas de goma. Si no se dispone de compactadora con ruedas de goma, se extenderá una manta por encima de los adoquines para evitar desportillarlos.

Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.

COLOCACION CON MORTERO Y JUNTAS RELLENAS CON LECHADA:

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5°C.

Los adoquines se colocarán sobre una base de mortero seco.

Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

Una vez colocadas las piezas se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base.

Después se rellenarán las juntas con la lechada.

JUNTAS RELLENAS CON MORTERO O LECHADA:

En exteriores, la superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PAVIMENTO COLOCADO SOBRE MORTERO O LECHO DE ARENA

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Limpieza y preparación de la superficie de asiento.
- Replanteo del despiece.
- Humectación de les piezas.
- Colocación de les piezas a pique de maceta con mortero adhesivo.
- Humectación de la superficie.
- Relleno de las juntas.
- Limpieza del pavimento.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

- Inspección visual de la unidad acabada y control de las condiciones geométricas de acabado.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se harán según las indicaciones de la DF.

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirán antes de completar el pavimento.

No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores de ejecución.

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del contratista.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución.

3.2.6 Estructuras de hormigón

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Hormigonado de estructuras y elementos estructurales, con hormigón en masa, armado, para pretensar, hormigón autocompactante y hormigón ligero, de central o elaborado en la obra en planta dosificadora, que cumpla las prescripciones del Código Estructural, vertido directamente desde camión, con bomba o con cubilote, y operaciones auxiliares relacionadas con el hormigonado y el curado del hormigón.

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar:

- Pilares
- Muros
- Vigas
- Dinteles
- Zunchos
- Forjados con elementos resistentes industrializados
- Forjados nervados unidireccionales
- Forjados nervados reticulares
- Losas y bancadas
- Membranas y bóvedas

Se consideran las siguientes operaciones auxiliares:

- Aplicación superficial de un producto filmógeno para el curado de elementos de hormigón

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Hormigonado:

- Preparación de la zona de trabajo
- Humectación del encofrado
- Vertido del hormigón

- Compactación del hormigón mediante vibrado, en su caso
- Curado del hormigón

Tratamiento de curado con producto filmógeno:

- Preparación de la superficie a tratar
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de recubrimiento necesarias
- Protección de la zona tratada

CONDICIONES GENERALES:

En la ejecución del elemento se cumplirán las prescripciones establecidas en el Código Estructural, en especial las que hacen referencia la durabilidad del hormigón y las armadura (Código Estructural) en función de las clases de exposición.

El hormigón estructural debe de fabricarse en centrales específicas

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa.

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la DT.

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros.

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades.

Si la superficie debe quedar vista tendrá, además, una coloración uniforme, sin goteos, manchas, o elementos adheridos.

En el caso de utilizar matacán, las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa de hormigón sin que se toquen entre ellas.

Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el Código Estructural.

Las tolerancias de ejecución cumplirán lo especificado en el Código Estructural.

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras cumplirán lo especificado en la UNE 36831.

No se aceptarán tolerancias en el replanteo de ejes ni en la ejecución de cimentación de medianeras, huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la DF.

HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS:

Tolerancias de ejecución:

- Verticalidad de líneas y superficies (H altura del punto considerado):

- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalidad aristas exteriores o juntas de dilatación vistas (H altura del punto considerado):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviaciones laterales:
- Piezas: ± 24 mm
- Juntas: ± 16 mm
- Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales): ± 20 mm
- Sección transversal (D: dimensión considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico:
- Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm/3 m
- Resto de elementos: ± 10 mm

Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el Código Estructural.

FORJADOS DE ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS:

Espesor de la capa de compresión:

- Sobre viguetas: 40 mm
- Sobre piezas de entrevigado cerámicas o de mortero de cemento: 40 mm
- Sobre piezas de entrevigado de poliestireno: 50 mm
- Sobre piezas de entrevigado si la aceleración sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre losas alveolares pretensadas: 40 mm

Tolerancias de ejecución:

- Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:
- Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m
- Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m
- Acabado liso ± 5 mm/3 m
- Acabado muy liso ± 3 mm/3 m
- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm

FORJADOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES:

Espesor de la capa de compresión:

- Sobre piezas de entrevigado cerámicas o de mortero de cemento: 40 mm
- Sobre piezas de entrevigado de poliestireno: 50 mm
- Sobre piezas de entrevigado si la aceleración sísmica>=0.16g: 50 mm

Tolerancias de ejecución:

- Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:
- Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m
- Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m
- Acabado liso ± 5 mm/3 m
- Acabado muy liso ± 3 mm/3 m
- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm

FORJADOS NERVADOS RETICULARES:

Espesor capa superior : >= 5 cm y tendrá que llevar armado de repartimiento en malla

Separación entre ejes de nervios < 100cm

Tolerancias de ejecución:

- Planeidad medida con regla de 3 m antes de retirar los puntales:
- Acabado reglado mecánicamente ± 12 mm/3 m
- Acabado maestreado con regla ± 8 mm/3 m
- Acabado liso ± 5 mm/3 m
- Acabado muy liso ± 3 mm/3 m
- Espesor de la capa de compresión: + 10 mm, - 6 mm

TRATAMIENTO DE CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO:

Formará una película continua, flexible y uniforme, de color regular.

Quedará bien adherido sobre la superficie del hormigón, sin que haya desprendimientos de la película.

La película quedará intacta al menos un mínimo de siete días después de su aplicación.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

HORMIGONADO:

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte afectada.

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C.

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado requiere precauciones explícitas y la autorización de la DF En este caso, se harán probetas con las mismas condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida.

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón.

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón.

No se procederá al hormigonado hasta que la DF dé el visto bueno habiendo revisado las armaduras en posición definitiva.

La DF comprobará la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigón. En caso de considerar los defectos inadmisibles de acuerdo con el proyecto la DF valorará la reparación.

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón con un grueso superior al que permita una compactación completa de la masa.

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la DF aprobará la instalación de bombeo previamente al hormigonado.

No puede transcurrir más de 1,5 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que la DF lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado.

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos.

El vertido se realizará desde una altura pequeña y sin que se produzcan disgregaciones.

La compactación del hormigón se realizará mediante procesos adecuados a la consistencia de la mezcla y de manera que se eliminen huecos y evite la segregación.

Se debe garantizar que durante el vertido y compactado del hormigón no se producen desplazamientos de la armadura.

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el hormigón. Se vibrará enérgicamente.

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la DF.

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada.

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la DF antes del hormigonado de la junta.

Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos.

Antes de hormigonar la junta se humedecerá, evitando encharcar la junta

Se pueden utilizar productos específicos (como las resinas epoxi) para la ejecución de juntas siempre que se justifique y se supervise por la DF.

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante el curado y de acuerdo con el Código Estructural.

Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento.

HORMIGÓN ESTRUCTURAL:

La compactación se realizará por vibrado. El espesor máximo de la tongada dependerá del vibrador utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones.

Se vibrará más intensamente en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas y en los paramentos.

HORMIGÓN ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE:

No es necesario la compactación del hormigón.

HORMIGÓN LIGERO:

Para realizar una compactación correcta del hormigón ligero se reducirá la separación entre posiciones consecutivas de los vibradores al 70% de la utilizada para un hormigón convencional

Se evitará que el árido ligero flote como consecuencia de un excesivo vibrado.

El acabado superficial de la cara donde se vierta el hormigón se realizará mediante utillaje adecuado que garantice que el árido se introduzca en la masa de hormigón y quede recubierto por la lechada

FORJADOS DE ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS:

Las piezas de entrevigado o nervios, tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del hormigón.

Las superficies de piezas de hormigón prefabricadas deben estar bien humedecidas en el momento del hormigonado

En caso de utilizar piezas cerámicas se debe regar generosamente.

El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura del elemento.

El hormigonado de los nervios y de la capa de compresión de los forjados se realizará simultáneamente.

Se hará desde una altura inferior a 1 m y en el sentido de los nervios, sin que se produzcan disgregaciones. Se evitará la desorganización de las armaduras, las mallas y otros elementos del forjado.

En el hormigonado de losas alveolares se debe compactar el hormigón de juntas con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de estas, excepto si se utiliza hormigón autocompactante.

LOSAS:

Si el elemento es pretensado no se dejarán más juntas de las previstas explícitamente en la DT. En caso de que se haya de interrumpir el hormigonado, las juntas serán perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas, y no se volverá a hormigonar hasta que la DF las haya examinado.

Si el elemento es pretensado y no se utiliza hormigón autocompactante, se vibrará con especial cuidado la zona de anclajes.

TRATAMIENTO DE CURADO CON PRODUCTO FILMOGENO:

No se aplicará el producto sin la autorización expresa de la DF.

Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes:

- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C

- Humedad relativa del aire > 60%

- En exteriores: Velocidad del aire > 50 km/h, Lluvia

Es necesario aplicar una capa continua y homogénea inmediatamente después de verter el hormigón y preferiblemente dentro de los treinta minutos siguientes del acabado superficial.

El sistema de aplicación estará de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la autorización de la DF.

Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes, durante y después de la aplicación.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Aprobación del plan de hormigonado presentado por el contratista

- Inspección visual de todas las excavaciones antes de la colocación de las armaduras, con observación del estado de limpieza y entrada de agua en todo el recinto.

- Toma de coordenadas y cotas de todas las unidades de obra antes del hormigonado.

- Observación de la superficie sobre la que debe extenderse el hormigón y de las condiciones del encofrado. Medida de las dimensiones de todas las unidades estructurales de obra, entre los encofrados, antes de hormigonar.

- Verificación de la correcta disposición del armado y de las medidas constructivas para evitar movimientos del armado durante el hormigonado.

- Inspección del proceso de hormigonado con control, de entre otros aspectos, de la temperatura y condiciones ambientales.

- Control del desencofrado y del proceso y condiciones de curado.

- Toma de coordenadas y cotas de los puntos que deban recibir prefabricados, después del hormigonado.

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del Código Estructural.

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No se podrá iniciar el hormigonado de un elemento sin la correspondiente aprobación de la DF.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Inspección visual de la unidad finalizada y control de las condiciones geométricas de acabado, según el artículo 100. Control del elemento construido del Código Estructural.

- Ensayos de información complementaria.

De las estructuras proyectadas y construidas de acuerdo al Código Estructural, en las que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los siguientes supuestos:

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de estructura o el pliego de prescripciones técnicas particulares.

- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reune ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de prescripciones técnicas particulares establecerá los ensayos oportunos que se han de realizar, indicando con toda precisión la forma de realizarlos y la manera de interpretar los resultados.

- Cuando a juicio de la Dirección Facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la estructura.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF, y el contenido del Código Estructural.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Si se aprecian deficiencias importantes en el elemento construido, la DF podrá encargar ensayos de información complementaria (testigos, ultrasonidos, esclerómetro) sobre el hormigón endurecido, con el fin de tener conocimiento de las condiciones de resistencia conseguidas u otras características del elemento hormigonado.

3.2.7 Señalización horizontal

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Pintado sobre pavimento de marcas viales, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico.

Se han considerado las siguientes marcas:

- Marcas longitudinales
- Marcas transversales
- Marcas superficiales

Se han considerado los siguientes lugares de aplicación:

- Viales públicos
- Viales privados

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Preparación de la superficie existente
- Replanteo y premarcado
- Aplicación de la marca vial
- Protecciones provisionales durante la aplicación y el tiempo de secado

CONDICIONES GENERALES:

Las marcas viales empleadas serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos:

- En función de su vida útil:
- Permanentes (P)
- Temporales (T)
- En función de su visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexión:
- Tipo 0 (NR): no retrorreflectantes
- Tipo I (R): retrorreflectantes en seco
- Tipo II (RW): retrorreflectantes en seco y con humedad
- Tipo II (RR): retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia
- En función de sus propiedades de resistencia al deslizamiento:

- Estructuradas (E)
- No estructuradas (NE)
- En función de otros usos especiales:
- Sonoras (S)
- Fáciles de eliminar (F)
- Rebordeo (B)
- Enmascaradora (M)
- Dameros (D)
- En función de la forma de aplicación:
- Marcas viales "in situ"
- Marcas viales prefabricadas

La marca vial o sistema de señalización horizontal estará compuesta por un material base y en su caso, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado en las proporciones indicadas en las instrucciones de aplicación del sistema.

El material base estará constituido por pinturas, plásticos en frío o por termoplásticos.

Los requisitos esenciales de las marcas viales; visibilidad nocturna, visibilidad diurna, resistencia al deslizamiento y color, cumplirán las especificaciones de la UNE-EN 1436 y se determinarán con los métodos establecidos en dicha norma.

Las marcas tendrán el color, forma, dimensiones y ubicación indicadas en la DT.

Tendrán los bordes limpios y bien perfilados.

La capa de pintura será clara, uniforme y duradera.

Dosificación estándar del material base para marcas viales permanentes:

- Pinturas: 720 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 5000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 1000 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 3000 g/m2

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo: ± 3,0 cm

- Dosificación de pintura y microesferas: - 0%, + 20%

MARCAS VIALES RETRORREFLECTANTES:

El material base de la marca vial llevará incorporadas, por pre-mezclado y/o post-mezclado, microesferas de vidrio que le conferirán el carácter retrorreflectante.

La retrorreflexion de la marca vial en condiciones de humedad o de lluvia se podrá reforzar mediante propiedades especiales en su textura superficial, microesferas de vidrio gruesas, u otros medios.

Dosificación estándar de microesferas de vidrio y cargas antideslizantes de post-mezclado añadidas al material base:

- Pinturas: 480 g/m2
- Termoplásticos en capa fina: 500 g/m2
- Termoplásticos en capa gruesa: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa fina: 500 g/m2
- Plásticos en frío en dos componentes en capa gruesa: 500 g/m2

MARCAS VIALES EN CARRETERAS:

Las marcas viales empleadas en la red de carreteras del Estado serán, de acuerdo con la norma UNE-EN 1436, de los siguientes tipos:

- En función de su vida útil:
- Permanentes (P): de color blanco, utilizadas en la señalización horizontal de carreteras con tráfico convencional.
- En función de su visibilidad nocturna o propiedades de retrorreflexión:
- Tipo II (RW): marca vial no estructurada diseñada para mantener la retrorreflexión en seco y con humedad.
- Tipo II (RR): marca vial estructurada o no, diseñada para mantener la retrorreflexión en seco, con humedad y lluvia.
- En función de otros usos especiales:
- Sonoras (S): marca vial con resaltes que produce efectos sonoros y mecánicos (vibraciones). Serán permanentes y de tipo II (RR).
- Rebordeo (B): marca vial permanente de color negro, utilizada en el rebordeo de marcas viales para mejorar su contraste.
- Dameros (D): marca vial permanente de color rojo, utilizada para señalización de acceso a un lecho de frenado.

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.2a del PG 3 vigente, para las de color blanco y en las tablas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente.

La marca vial tendrá la clase de durabilidad adecuada a las características de la carretera en la que se va a aplicar. En función del factor de desgaste, calculado según las especificaciones del artículo 700.3.4.1 del PG 3 vigente, la durabilidad de los requisitos, ensayada conforme a la norma UNE-EN 13197, cumplirá:

- Marcas viales de colores blanco y negro: clases P5, P6 o P7
- Marcas viales de color rojo: >= clase P4

El material base de la marca vial y su forma de aplicación serán compatibles con el soporte sobre el que se va a aplicar:

- En actuaciones de repintado: cumplirá los criterios de compatibilidad con la marca vial existente, de acuerdo con la tabla 700.9 del PG 3 vigente.
- En aplicaciones sobre pavimento nuevo: será conforme con los criterios establecidos en la tabla 700.10 del PG 3 vigente.

Los requisitos de comportamiento de las marcas viales, durante el periodo de garantía, cumplirán con las características especificadas en la tabla 700.11 del PG 3 vigente, para las de color blanco y en las tablas 700.2.b y 700.2.c para las de color negro y rojo respectivamente.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:

Se trabajará a una temperatura entre 5°C y 40°C y con vientos inferiores a 25 km/h.

No podrá aplicarse la marca vial:

- Cuando la temperatura del sustrato no supere al menos en 3ºC al punto de rocío.
- Cuando el pavimento esté húmedo.

Antes de empezar los trabajos, la DF aprobará el equipo, las medidas de protección del tráfico y las señalizaciones auxiliares.

No se iniciarán obras que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente señalización, balizamiento y en su caso, defensas. La forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones corresponderán con lo establecido en la Norma de Carreteras 8.3.-IC y catálogo de Elementos de Señalización, Balizamiento y Defensa para la circulación vial.

La aplicación de la marca vial se realizará de acuerdo con las instrucciones del sistema de señalización vial horizontal, suministrado por el fabricante, que incluirán como mínimo:

- Identificación del fabricante
- Dosificaciones
- Tipo y proporciones de materiales de post-mezclado, en su caso
- Necesidad o no de microesferas de vidrio de premezclado

La maquinaria y equipos de puesta en obra de marcas viales cumplirán los requisitos establecidos en el artículo 700.5 del PG 3 vigente y se clasificarán y caracterizarán según lo especificado en la norma UNE 135277-1.

El cumplimiento de dichos requisitos se deberá acreditar mediante la presentación de la declaración del contratista, que para cada máquina a utilizar incluirá la siguiente información, de acuerdo con la norma UNE 135277-1:

- Ficha técnica de cada máquina
- Requisitos asociados a cada clase de máquina
- Identificación de los elementos de la máquina

Antes del comienzo de cada unidad de obra, incluidos anchos diferentes de líneas y para cada equipo, se procederá, bajo la supervisión de la DF, al ajuste de la maquinaria para determinar los parámetros de aplicación conforme lo especificado en la norma UNE 135277-1, y se elevará acta de cada uno de los ajustes realizados.

Se preverán sistemas de drenaje para evitar que las marcas viales aplicadas sean la causa de la formación de una película de agua sobre el pavimento.

La superficie donde se aplicará la pintura estará limpia, sin materiales sueltos y completamente seca.

Cuando el sistema de señalización vial horizontal no sea compatible con el sustrato (pavimento o marca vial antigua), se procederá al borrado de la marca vial existente, o a la aplicación de una imprimación o de un tratamiento superficial adecuado, a juicio de la DF, para garantizar dicha compatibilidad.

En el caso de superficies de hormigón, no quedarán restos de productos o materiales utilizados para el curado del hormigón.

Cuando el factor de luminancia del pavimento sea > 0,15, según UNE-EN 1436, se rebordeará la marca vial con una marca de rebordeo a ambos lados con un ancho igual a la mitad del correspondiente a la marca vial existente.

Si la superficie a pintar es un mortero u hormigón, no puede presentar eflorescencias, ni reacciones alcalinas.

Si la superficie donde se aplica la pintura es lisa y no tiene suficiente adherencia con la pintura, se hará un tratamiento para darle un grado de adherencia suficiente.

Si la superficie presenta defectos o agujeros, se corregirán antes de aplicar la pintura, utilizando material del mismo tipo que el pavimento existente.

Antes de aplicar la pintura se hará un replanteo topográfico, que aprobará la DF.

Se protegerán las marcas del tráfico durante el proceso inicial de secado.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

VIALES PUBLICOS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.

* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

VIALES PRIVADOS:

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Revisión de las condiciones de almacenaje y conservación de los materiales.
- Revisión de la fecha de fabricación de los materiales.
- Revisión del parte diario entregado por el Contratista, que incluirá, como mínimo la siguiente información:
- Referencia de los lotes y dosificaciones de los materiales consumidos.
- Condiciones (temperatura, presión, etc...) utilizadas en los equipos de aplicación.
- Tipo y dimensiones de la marca vial.

- Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales.
- Fecha de puesta en obra.
- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada de trabajo.
- Observaciones e incidencias que puedan influir en la vida útil o características de la marca vial aplicada.
- Comprobación del cumplimiento de las dosificaciones especificadas.
- Inspecciones para verificar la información incluida en el parte de obra y en el acta de ajuste de la maquinaria.

Los controles se realizarán de acuerdo con el apartado 700.8.3 del PG 3 vigente.

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Durante la aplicación de la pintura, la toma de muestras para comprobación de las dosificaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 700.8.3.3 del PG 3 vigente.

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Se rechazarán las marcas viales aplicadas de un mismo tipo cuando se den los siguientes supuestos:

- Los materiales aplicados no se corresponden con los acopiados.
- La maquinaria utilizada no cumple los requisitos especificados en el artículo 700.5.2 del PG 3 vigente.
- Las condiciones de puesta en obra no se corresponden con las aprobadas en el acta de ajuste de la obra.
- El valor medio de la dosificación de cada material es inferior a las dosificaciones especificadas.
- El coeficiente de variación de la dosificación del material aplicado supera el 20 %.

El Contratista ejecutará de nuevo, a su costa, las marcas viales que hayan sido rechazadas.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Durante el periodo de garantía (2 años a partir de la fecha de aplicación) se realizarán controles periódicos de las marcas viales para verificar, in situ, si cumplen los requisitos especificados.

Los controles se realizarán de forma puntual, de manera continua, o con ambos métodos:

- Método de ensayo puntual:

- Se realizará con equipos portátiles.

- Se verificarán las característica especificadas en la tabla 700.12 del PG 3 vigente, incluyendo, como mínimo, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco.

- Método de ensayo continuo:

- Se realizará con equipos dinámicos de alto rendimiento, según UNE-EN 1436.

- Se verificará, como mínimo, el coeficiente de luminancia retrorreflejada en seco.

- La DF podrá solicitar la medición del coeficiente de fricción u otras características adicionales.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF, que durante el periodo de garantía podrá solicitar la realización de comprobaciones de las características de las marcas viales en cualquier momento y tantas veces como considere oportuno.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Se rechazarán las marcas viales que no cumplan, durante el periodo de garantía, los requisitos de comportamiento especificados en las tablas 700.11, 700.2b y 700.2c del PG3 vigente, para los colores blanco, negro y rojo respectivamente.

El Contratista repintará de nuevo, a su costa, las marcas viales que hayan sido rechazadas.

3.2.8 Señales de información y dirección

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Elementos para señalización vertical de viales fijados a su soporte.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Placas con señales de información

Se han considerado los siguientes lugares de colocación:

- Viales públicos

- Viales de uso privado

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Replanteo

- Fijación de la señal al soporte

- Comprobación de la visibilidad de la señal
- Corrección de la posición si fuera necesaria

CONDICIONES GENERALES:

El elemento estará fijado al soporte, en la posición indicada en la DT, con las modificaciones introducidas en el replanteo previo, aprobadas por la DF.

Resistirá un esfuerzo de 1 kN aplicado en su centro de gravedad, sin que se produzcan variaciones de su orientación.

Se situará en un plano vertical, perpendicular al eje de la calzada.

Tolerancias de ejecución:

- Verticalidad: ± 1°

VIALES PUBLICOS:

Será visible desde una distancia de 70 m o desde la zona de parada de un automóvil, incluso en el caso de que haya un camión situado por delante a 25 m.

Esta visibilidad se mantendrá de noche con el alumbrado de cruce.

Distancia a la calzada: >= 50 cm

PLACAS CON SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS, DE REGULACION Y DE INFORMACION Y ROTULOS:

La distancia al plano del pavimento será >= 1 m, medido por la parte más baja del indicador.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No se producirán daños en la pintura, ni abolladuras en la plancha durante el proceso de fijación.

No se agujereará la plancha para fijarla. Se utilizarán los agujeros existentes.

Los elementos auxiliares de fijación cumplirán las características indicadas en las normas UNE 135312 y UNE 135314.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

VIALES PUBLICOS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

VIALES PRIVADOS:

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

OPERACIONES DE CONTROL:

- Comprobación topográfica de la situación y colocación de todas las señales.
- Inspección visual del estado general de las señales y su visibilidad.
- Para cada señal y cartel seleccionado:
- Determinación de las características fotométricas (coeficiente de retrorreflexión) y colorimétricas (coordenadas cromáticas y factor de luminancia) en la zona retrorreflectante cada 20unidades.
- Determinación de las características colorimétricas en la zona no retrorreflectante.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

- Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF.
- El número de señales y carteles seleccionados para controlar, responderá a los criterios indicados en el apartado de control de materiales (S).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

- Los criterios de aceptación y rechazo para un lote de señales o carteles del mismo tipo, se corresponden a los indicados en el apartado de control de materiales (nivel 4,0).

Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista.

3.2.9 Elementos auxiliares para señalización vertical

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Soportes para señalización vertical de tubo de acero galvanizado colocados en su posición definitiva.

Se han considerado los siguientes tipos de colocación:

- Colocado clavado en el suelo
- Colocado hormigonado en el suelo
- Colocado soldado.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Colocado clavado:

- Replanteo
- Clavado del soporte

Colocado hormigonado:

- Replanteo
- Preparación del agujero o del encofrado del dado
- Colocación del soporte y apuntalamiento
- Hormigonado del dado
- Retirada del apuntalamiento provisional

Colocado soldado:

- Replanteo
- Soldado a la placa base

CONDICIONES GENERALES:

El soporte quedará vertical, en la posición indicada en la DT, con las condiciones de replanteo aprobadas por la DF.

Sobresaldrá del terreno una altura suficiente para que la señal o letrero que le corresponda esté a una altura mínima de un metro respecto a la rasante del pavimento, excepto en el caso de pórticos en que la altura mínima deberá ser la especificada como galibo en la DT o, en su defecto, la que indique la DF.

En el caso de perfiles huecos, el extremo del tubo que quede expuesto a la intemperie, una vez instalado ha de quedar cerrado de manera que se impida la entrada de agentes agresivos en el interior. La tapa ha de ser de acero y ha de quedar soldada en todo su perímetro, antes del galvanizado.

La distancia del soporte a la parte exterior de la calzada será tal que la señal o letrero que le corresponda queden separados más de 50 cm de la parte exterior de la calzada.

El anclaje del soporte será suficiente para resistir un empuje de 1 kN aplicados en el centro de gravedad de la señal o letrero que le corresponda y una presión de viento de 2 kN/m2.

Las perforaciones del soporte para el anclaje de la señal o letrero correspondiente quedarán en la posición correcta.

Todos los elementos de fijación han de quedar protegidos de la corrosión.

Los soportes con corredera telescópica, han de permitir sustituir, añadir o quitar los módulos fácilmente, sin producir esfuerzos al conjunto.

En los soportes de aluminio, el anclaje en el cimiento de hormigón ha de ser con cuatro espárragos de diámetro no inferior a 20 mm. La fijación del soporte al hormigón ha de ser con bridas de anclaje galvanizadas y tornillos de aluminio.

El sistema de fijación ha de permitir una sustitución rápida y fácil del soporte.

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo: ± 5 cm
- Altura: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalidad: ± 1°

COLOCADO CLAVADO:

Los soportes quedarán clavados en terrenos naturales, con las características previstas en la DT.

COLOCADO HORMIGONADO:

Resistencia característica del hormigón se comprobará de acuerdo con el Código Estructural

El hormigón del dado de soporte no tendrá huecos, ni elementos que disminuyan su sección.

No se golpeará ni producirá vibraciones a los soportes hasta que el hormigón alcance una resistencia de 3 N/mm2.

Profundidad de anclaje: > 40 cm

Resistencia estimada a la compresión del hormigón a los 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2

Tamaño mínimo del dado de hormigón: 40 x 40 x 40 cm

Recubrimiento del soporte: >= 10 cm

COLOCADO SOLDADOS:

El cordón de soldadura será continuo en la base del perfil.

Las soldaduras no tendrán defectos que constituyan secuencia en una longitud superior a 10 mm.

La zona del soporte afectada por la soldadura estará pintada con pintura de zinc.

La garantía mínima de los elementos constituyentes de las barreras de seguridad que no hayan sido objeto de arrancada, rotura o deformación por la acción del tráfico, fabricados e instalados con carácter permanente y conservados regularmente según instrucciones del fabricante, será de 3 años contados desde la fecha de fabricación, y de 2 años y 6 meses des de la fecha de instalación.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:

Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la DF.

COLOCADO CLAVADO:

La máquina de clavar no producirá daños ni deformaciones a los soportes.

Una vez clavado al soporte no se puede rectificar su posición si no es sacándolo y volviéndolo a clavar.

COLOCADO HORMIGONADO:

No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C.

No se colocará la señal o letrero hasta pasadas 48 h del vertido del hormigón.

COLOCADO SOLDADOS:

La pletina donde se soldará el soporte estará empotrada previamente.

Las soldaduras se harán protegidas de la lluvia y humedades, y a una temperatura superior a 5°C.

La soldadura será eléctrica manual, por arco descubierto, con electrodos fusibles de calidad estructural básica.

La soldadura será de calidad 3 como mínimo, y formará un cordón continuo de 4 mm de espesor.

Antes de soldar se limpiarán las superficies a unir de grasas, óxidos y pinturas, y se deberá procurar que queden bien secas.

Después de ejecutar un cordón de soldadura y antes de empezar el siguiente se limpiará la escoria por medio de piqueta y cepillo.

Las soldaduras se harán por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados según la UNE-EN 287-1.

La ejecución de los diferentes tipos de soldaduras se hará de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A y el artículo 77 de la EAE para obras de edificación o de acuerdo con el artículo 640.5.2 del PG3 y el artículo 77 de la EAE para obras de ingeniería civil.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se trata de mover manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de cimentación.

- Comprobación del replanteo y tolerancias de acabado en un 10% de los soportes.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección de las irregularidades observadas a cargo del contratista.

3.2.10 Barandillas de acero inoxidable

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Barandillas formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepaño de la barandilla, colocadas en su posición definitiva y anclada con mortero de cemento u hormigón o con fijaciones mecánicas.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Barandillas de acero inoxidable anclada con mortero de cemento o con fijaciones mecánicas.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Barandilla metálica:

- Replanteo
- Preparación de la base
- Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes

CONDICIONES GENERALES:

La protección instalada reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.

Estará nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT.

La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto o la indicada por la DF.

En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a una distancia >= 50 cm del elemento que provoque dicha variación de altura.

La estructura propia de las barandillas resistirá una fuerza horizontal, uniformemente distribuida, que se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. El valor característico de la fuerza será de:

- Categoría de uso C5: 3 kN/m
- Categorías de uso C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resto de categorías: 0,8 kN/m

(Las categorías de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La parte inferior de las barandillas de las escaleras de las zonas destinadas al público en establecimientos de uso comercial o de uso pública concurrencia, en zonas comunes de edificios de uso residencial vivienda o en escuelas infantiles, estará separada una distancia de 50 mm como máximo de la línea de inclinación de la escalera.

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo: ± 10 mm
- Horizontalidad: ± 5 mm
- Aplomado: ± 5 mm/m

BARANDILLA METÁLICA:

Los montantes serán verticales.

Estará sujeta sólidamente al soporte con anclajes de acero tomados con mortero de cemento Pórtland u hormigón o con fijaciones mecánicas, protegidos contra la corrosión.

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.

Los tramos de la barandilla tendrán que estar unidos, por soldadura si son de acero o por una pieza de conexión si son de aluminio.

Tolerancias de ejecución:

- Altura: ± 10 mm
- Separación entre montantes: Nula

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.

Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación y, asimismo, mantendrán el aplomado del elemento hasta que quede definitivamente fijado al soporte.

BARANDILLA METÁLICA:

Estarán hechos los agujeros en los soportes para anclar los montantes antes de empezar los trabajos.

Los orificios de los anclajes estarán limpios de polvo u otros objetos que puedan haberse introducido en ellos desde el momento de su ejecución hasta el momento de la colocación de los anclajes.

La DF aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante.

Los anclajes se realizarán mediante placas, pletinas o angulares. La elección depende del sistema y de la distancia existente entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes.

Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.

ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO:

El material conglomerante o adhesivo con que se realice el anclaje se ha de utilizar antes de comenzar el fraguado.

Durante el fraguado no se producirán movimientos ni vibraciones del elemento.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Comprobación topográfica de la situación y colocación de la barandilla. Toma de coordenadas y cuotas de un 10% de los puntos donde se situarán los elementos de anclaje.

- Inspección visual del estado general de la barandilla, galvanizado y anclajes.

- Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se trata de mover manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de cimentación.

CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF. Los controles se fundamentan en la inspección visual y por tanto, en la experiencia del inspector en este tipo de control.

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Inspección visual de la unidad acabada.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

En la unidad acabada se realizarán, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

3.2.11 Bancos

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Bancos colocados en el exterior.

Se han considerado los siguientes tipos de bancos:

- Bancos de madera
- Bancos metálicos
- Bancos de piedra artificial
- Bancos de piedra natural
- Bancos de materiales plásticos

Se han considerado los sistemas de colocación siguientes:

- Anclados con dados de hormigón
- Fijados sobre el pavimento con fijaciones mecánicas
- Apoyados sobre el pavimento
- Empotrados al paramento

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Hormigonado de los dados de anclaje, en su caso
- Anclaje del banco, en su caso

CONDICIONES GENERALES:

El banco quedará horizontal independientemente de la pendiente del terreno.

Los elementos metálicos (fijaciones, estructuras de soporte, etc.) quedarán protegidos de la corrosión.

Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros defectos visibles.

Anclaje de los soportes: >= 25 cm

Tolerancias de ejecución:

- Altura del asiento: ± 20 mm
- Horizontalidad: ± 10 mm

ANCLADOS A DADOS DE HORMIGÓN:

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.

Dimensión de los dados de anclaje: 40x40x40 cm

Número de dados: 4

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

El hormigonado de los dados de anclaje se hará a una temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.

No se utilizará hasta haber transcurrido 48 h desde su colocación.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que presenten daños

- Replanteo de la ubicación.
- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Inspección visual de los elementos colocados.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

3.2.12 Pilonas

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Hitos y pilones de delimitación anclados al terreno con mortero de cemento.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Hito metálico formado por tubo de acero
- Hito de fundición
- Pilón esférico de hormigón
- Pilón troncocónico de hormigón
- Pilón de hormigón con forma especial

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Replanteo
- Preparación del hueco o encofrado del dado
- Colocación del elemento o de su base, en su caso, y apuntalamiento
- Amorterado u hormigonado del dado
- Retirada del apuntalamiento provisional

CONDICIONES GENERALES:

El elemento ha de estar aplomado, en la posición indicada por la DT.

Ha de sobresalir de la cota de pavimento acabado, la altura especificada en la DT o la que le sea propia según su diseño.

El anclaje del elemento ha de ser suficiente para resistir un empuje de 1 kN aplicados al centro de gravedad del mismo.

Las perforaciones del elemento han de permanecer en la posición correcta.

El elemento quedará colocado sin ningún tipo de defecto de fabricación o daño producido durante el proceso de la obra (abolladuras, rayadas, golpes, etc.).

Tolerancias de ejecución:

- Replanteo: ± 3 cm
- Altura: ± 2 cm
- Verticalidad: ± 1º

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Antes de colocar los soportes se replanteará el conjunto que aprobará la DF.

La máquina perforadora o taladradora, en su caso, no ha de producir daños ni deformaciones a la base de apoyo ni al pavimento.

El hoyo donde se coloque el elemento ha de estar húmedo y limpio de polvo u otros objetos que se puedan haber caído en su interior.

Una vez colocado el elemento, no se puede rectificar su posición si no es quitándolo y volviendo a repetir el proceso.

No se puede trabajar con lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5°C.

El hormigón o el mortero, se han de colocar antes de que comience su fraguado.

El elemento se apuntalará durante 24 h para evitar movimientos y así quede garantizada la posición deseada.

Los elementos colocados se han de señalizar de manera que sea visible su reciente puesta en obra.

3.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Inspección visual del material antes de su colocación, rechazando las piezas que presenten daños
- Replanteo de la ubicación.
- Comprobación de la correcta nivelación, según criterio de la DF.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Inspección visual de los elementos colocados.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

3.2.13 Puerta cortafuegos de hojas batientes, colocada

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Colocación de puerta cortafuegos de madera o metálica, de accionamiento manual o automático por termofusible.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Puertas de hojas batientes

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Comprobación previa de que las dimensiones del hueco y de la puerta son compatibles
- Replanteo en el hueco de la situación de los elementos de anclaje
- Fijación del marco, de las guías, colocación de la hoja y de los mecanismos de apertura

CONDICIONES GENERALES:

Estará bien aplomada, a escuadra y al nivel previsto.

Abrirá y cerrará correctamente.

Tolerancias de ejecución:

- Nivelación: ± 1 mm

- Aplomado: <= 3 mm (hacia fuera)

PUERTAS DE HOJAS BATIENTES:

El giro se realizará en el sentido de la evacuación, de manera que la apertura de la puerta no disminuya la anchura real de la vía de evacuación.

Altura de colocación de los mecanismos de apertura: 1 m (± 50 mm)

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

En la puerta de madera, una vez retirados los elementos de protección y de trabazón, los agujeros quedarán tapados con masillas, tacos, etc.

En las puertas de hojas batientes, el ajuste de las caras de contacto entre el marco y las hojas y entre las dos hojas, en su caso, se regulará con la posición de las bisagras de las hojas.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.open_in_new

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Comprobación previa de que las dimensiones del hueco y de la puerta son compatibles

- Replanteo en el hueco de la situación de los elementos de anclaje

- Fijación del marco, de las guías, colocación de la hoja y de los mecanismos de apertura

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Inspección visual y control geométrico de la unidad acabada.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

Cuando se observen irregularidades de replanteo, se deberán corregir antes de completar la ejecución de la unidad.

No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución.

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del Contratista.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No hay condiciones especificadas para la ejecución de la partida.

3.2.14 Hoja batiente para puerta de entrada, de madera, colocada

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Hoja para puerta batiente, colocada en el marco con todos los herrajes, bisagras, cerradura, etc.

Se han considerado las siguientes puertas:

- Exteriores

- Interiores

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Presentación de la puerta

- Rectificación en caso de ser necesaria

- Colocación de los herrajes

- Fijación definitiva

- Limpieza y protección

CONDICIONES GENERALES:

La puerta abrirá y cerrará correctamente.

Todos los herrajes estarán fijados al bastidor de cada hoja o bien al refuerzo.

La hoja que no lleve el cierre se fijará al marco mediante dos pasadores.

Tolerancias de ejecución:

- Horizontalidad: ± 1 mm

- Aplomado: ± 3 mm

- Plano previsto de la hoja respecto al marco: ± 1 mm

- Posición de los herrajes: ± 2 mm

PUERTAS DE ENTRADA O PUERTAS EXTERIORES O INTERIORES:

Holgura entre las hojas y el marco: <= 0,2 cm

Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

Fijaciones entre cada hoja y el marco: >= 3

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No hay condiciones específicas del proceso constructivo.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Comprobación geométrica del elemento de cerramiento

- Replanteo

- Colocación, aplomado y nivelado del elemento.

- Sujeción definitiva a la pared o marco de base y sellado

- Eliminación de rigidizadores y tapado de huecos si es el caso

- Colocación de los mecanismos

- Colocación de los tapajuntas

- Limpieza de todos los elementos

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Inspección visual y comprobación de funcionamiento de la unidad acabada.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución.

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del Contratista.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No hay condiciones especificadas para la ejecución de la partida.

3.2.15 Hoja batiente para puerta exterior, de madera, colocada

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Hoja para puerta batiente, colocada en el marco con todos los herrajes, bisagras, cerradura, etc.

Se han considerado las siguientes puertas:

- Interiores

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Presentación de la puerta

- Rectificación en caso de ser necesaria

- Colocación de los herrajes

- Fijación definitiva

- Limpieza y protección

CONDICIONES GENERALES:

La puerta abrirá y cerrará correctamente.

Todos los herrajes estarán fijados al bastidor de cada hoja o bien al refuerzo.

La hoja que no lleve el cierre se fijará al marco mediante dos pasadores.

Tolerancias de ejecución:

- Horizontalidad: ± 1 mm

- Aplomado: ± 3 mm

- Plano previsto de la hoja respecto al marco: ± 1 mm

- Posición de los herrajes: ± 2 mm

PUERTAS DE ENTRADA O PUERTAS EXTERIORES O INTERIORES:

Holgura entre las hojas y el marco: <= 0,2 cm

Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

Fijaciones entre cada hoja y el marco: >= 3

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No hay condiciones específicas del proceso constructivo.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:

Los puntos de control más destacables son los siguientes:

- Comprobación geométrica del elemento de cerramiento

- Replanteo

- Colocación, aplomado y nivelado del elemento.

- Sujeción definitiva a la pared o marco de base y sellado

- Eliminación de rigidizadores y tapado de huecos si es el caso

- Colocación de los mecanismos

- Colocación de los tapajuntas

- Limpieza de todos los elementos

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:

Inspección visual y comprobación de funcionamiento de la unidad acabada.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.

CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No es permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los defectos de ejecución.

La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del Contratista.

CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

No hay condiciones especificadas para la ejecución de la partida.

3.2.16 Materiales para cerramientos practicables de madera

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de perfiles que forman el marco y la hoja u hojas del elemento de cerramiento, y el marco de la caja de persiana, si corresponde, junquillos, perfiles elastoméricos para la sujeción del vidrio, cuñas, y todos los elementos necesarios para la fijación y sellado del vidrio.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Todos los perfiles que conforman el marco y la hoja u hojas del elemento serán del material indicado en la descripción del mismo.

El elemento cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por el Director Facultativo.

El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra será tal que, sometidos a las condiciones previsibles más desfavorables, su flecha sea < 1/300 de su longitud.

La calidad de los herrajes no rebajará la calidad del cerramiento practicable sin estos herrajes.

Fijaciones entre la hoja y el marco:

- Una hoja batiente y altura de la hoja <= 120 cm: 2 puntos

- Una hoja batiente y altura de la hoja > 120 cm: 3 puntos

Los sistemas de fijación del vidrio, los dispositivos de drenaje, de sellado, de calzado y las medidas y holguras del galce, cumplirán las indicaciones de la UNE 85222.

La unión de los perfiles será ensamblada y encolada.

Los perfiles estarán preparados para recibir el herraje de apertura y cierre, que será del tipo embutido.

Escuadría del marco: >= 68 x 55 mm

Escuadría de la hoja: >= 45 x 68 mm

La madera estará preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e insectos.

La madera utilizada será adecuada para el uso previsto.

Densidad de la madera al 12% de humedad (UNE 56531):

- Pino melis o pino flandes: >= 450 kg/m3

- Roble o iroko: >= 530 kg/m3

Dureza media en la sección tangencial (UNE 56534)> 1,30

La humedad de la madera en el momento de su mecanización estará comprendida entre el 10 y el 15%, según la norma UNE-EN 13183-1.

Las singularidades de la madera como nudos, fendas, bolsas de resina, entrecascos, coloraciones anormales de la albura, médula vista o daños producidos por insectos cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 942.

Las caras vistas no tendrán nudos muertos y saltadizos. En el caso que aparezcan la madera deberá sanearse.

Los nudos de arista cumplirán las especificaciones de las dos caras en las que se encuentran.

Los perfiles no tendrán fendas o fisuras profundas.

La madera no presentará pudriciones ni rastros de ataques de insectos. Sólo se admiten los de polilla negra con los límites establecidos en la UNE-EN 942.

No se admite la gema, excepto cuando queda oculta una vez colocado el elemento de cerramiento.

VENTANAS O BALCONERAS:

Permeabilidad al aire (UNE-EN 1026): fuga por superficie total y por juntas de apertura a una sobrepresión de 100 Pa. El elemento clasificado según UNE-EN 12207, cumplirá alguno de los dos valores siguientes:

- Clase 0: Sin clasificar

- Clase 1: (ensayo a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 y <= 12,50 m3/hm

- Clase 2: (ensayo a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 y <= 6,75 m3/hm

- Clase 3: (ensayo a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 y <= 2,25 m3/hm

- Clase 4: (ensayo a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 y <= 0,75 m3/hm

Estanqueidad al agua (UNE-EN 1027): Cumplirá los valores correspondientes a su clasificación según UNE-EN 12208

Resistencia al viento (UNE-EN 12211): Cumplirá los valores correspondientes a su clasificación según UNE-EN 12210

Las ventanas o balconeras serán consideradas aptas al realizar todos y cada uno de los ensayos de maltrato (UNE 85203) y (UNE 85215) y los ensayos del dispositivo de situación y apertura restringida de las mismas normas.

Sistemas de cierre:

- Una hoja batiente y altura de la hoja <= 120 cm: 2 puntos

- Una hoja batiente y altura de la hoja > 120 cm: 3 puntos

- Dos hojas batientes: 3 puntos

- Corredera: 1 punto

La parte inferior del marco y del travesaño inferior de las hojas, tendrán perforaciones que permitan la salida del agua infiltrada o condensada.

Si el marco es cubrejuntas y/o con galce para persiana, éstos formarán una sola pieza con el montante del marco.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

Si el material ha de ser un componente de los huecos del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades:

- Transmitancia térmica U (W/m2K)

- Absortividad

Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en contacto con el suelo.

3.2.17 Materiales para cerramientos practicables de acero en perfiles laminados

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de perfiles de acero galvanizado que forman el marco y el bastidor de la puerta, así como el herraje de abertura y cierre.

Para el paramento de la puerta se han considerado las siguientes soluciones:

- Dos planchas de acero esmaltado con o sin mirilla

- Barrotes de tubo de acero

- Lamelas horizontales fijas de acero

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos superficiales. No tendrá grietas ni desprendimientos en el recubrimiento.

Todos los perfiles que conforman el marco y el bastidor de la puerta serán del material indicado en la descripción del mismo.

El elemento cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por el Director Facultativo.

La calidad de la cerrajería colocada no será inferior a la calidad inicial de la puerta.

Las bisagras estarán formadas por dos piezas de acero protegido contra la corrosión y conectadas por medio de arandela. Las palas tendrán la superficie plana y paralela al eje de giro, sin rebabas ni defectos y con taladros avellanados para la fijación al marco y a la hoja.

Fijaciones entre la hoja y el marco: 3 puntos

Los perfiles se deberán obtener mediante operaciones de perfilado, plegado o conformado en frío.

Su aspecto será uniforme y no tendrá grietas, marcas, ondulaciones apreciables a simple vista, ni otros defectos superficiales.

Presentarán en toda su longitud una sección recta uniforme.

La unión entre los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia), y se admitirá también la unión con tornillos autorroscantes en el caso que el perfil disponga de pliegues realizados especialmente para alojar la rosca del tornillo.

Si el elemento puede formar parte de un cerramiento exterior, estará clasificado en función de la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207 en alguna de las clases siguientes, ensayado según UNE-EN 1026: Clase 0, 1, 2, 3 o 4

Yeso de la pared de los perfiles:

- Perfiles básicos: >= 0,8 mm

- Perfiles complementarios: >= 0,4 mm

Recubrimiento de galvanizado (UNE-EN 10142):

- Z 275: perfiles básicos conformados a partir de banda galvanizada

- Z 200: perfiles complementarios conformados a partir de banda galvanizada

- Z 200: perfiles conformados a partir de banda prepintada

La unión entre los perfiles del bastidor y las planchas, barrotes o lamelas del paramento de la puerta se hará mediante soldadura.

Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frío).

Separación entre perfiles del bastidor: <= 600 mm

Flecha de los perfiles del bastidor (L = luz): <= L/100

Espesor de las patas de anclaje del marco: >= 1 mm

Distancia entre patas de anclaje del marco: <= 600 mm

Distancia patas de anclaje-extremos del marco: <= 200 mm

Montante fijo de ventilación:

- Altura del montante de ventilación: <= 300 mm

- Distancia montante ventilación-cantos: >= 150 mm

Mirilla superior:

- Distancia mirilla-cantos: >= 150 mm

Los sistemas de fijación del vidrio, los dispositivos de drenaje, de sellado, de calzado y las medidas y holguras del galce, cumplirán las indicaciones de la UNE 85222.

Dimensiones:

- Puerta de una hoja

- Ancho de la hoja: <= 120 cm

- Puertas de dos hojas

- Ancho de la hoja: >= 60 cm

Tolerancias:

- Dimensiones: ± 1 mm

- Espesor de la hoja: ± 0,5 mm

- Rectitud de aristas: ± 1 mm/m

- Planeidad: ± 1 mm/m

- Torsión del perfil: ± 1°/m

- Las tolerancias de los perfiles cumplirán las especificaciones de la UNE 36-579.

PARAMENTO CON PLANCHAS DE ACERO:

Las planchas de acero tendrán el espesor indicado en la Documentación Técnica y podrán resistir sin superar las deformaciones máximas admisibles, los esfuerzos a los que se verán sometidos.

No tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado superficial.

El color será uniforme, y si el acabado es plastificado o prelacado, coincidirá con el indicado en la Documentación Técnica o el escogido por el Director Facultativo.

En las puertas con mirilla, ésta incluirá un elemento vidriado transparente, colocado a la altura de la vista, que deberá cumplir las condiciones exigidas en el resto de la hoja.

Tolerancias:

- Las tolerancias de la plancha deberán cumplir las especificaciones de la UNE-EN 10143.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

Si el material ha de ser componente del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante ha de declarar los valores de las propiedades higrotérmicas según lo especificado en el apartado 4.1 del CTE DB HE 1.

Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estará en contacto con el suelo.

3.2.18 Cerramiento de vidrio de abertura automática, colocado (D)

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Cerramiento de vidrio de abertura automática con vidrio laminar, perfiles de aluminio, radares detectores de presencia, célula fotoeléctrica de seguridad y cuadro de control, colocado y conexionado.

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Replanteo

- Colocación de las fijaciones mecánicas de los vidrios fijos

- Sellado de vidrios fijos

- Colocación y anclaje de la estructura autoportante

- Montaje de la puerta

- Montaje de los mecanismos de accionamiento y conexionado eléctrico

- Equilibrado de la puerta

- Limpieza del conjunto

CONDICIONES GENERALES:

La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

Las hojas quedarán al nivel y en el plano previstos.

Los mecanismos de deslizamiento garantizarán un accionamiento suave y silencioso.

Las guías se fijarán a los paramentos mediante anclajes galvanizados.

No existirá contacto directo entre vidrio y vidrio, vidrio y metal, ni entre vidrio y hormigón.

Los herrajes de colgar y de seguridad, tendrá las dimensiones y características adecuadas a la superficie y peso de las hojas.

Los accesorios y automatismos de abertura y cierre estarán situados en la posición indicada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.

Tendrá hechas las conexiones eléctricas, de acuerdo con el esquema de la DT o las instrucciones del fabricante.

Todos los materiales que intervienen en la instalación serán compatibles entre sí. Por ese motivo, el montaje y las conexiones de los equipos estarán hechos con los materiales y accesorios suministrados por el fabricante, o expresamente aprobados por éste.

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, se situarán en emplazamientos que permitan la plena accesibilidad de todas sus partes.

Solape de las hojas con las lunas laterales: 22 mm

Holgura de las hojas:

- Holgura superior: 3 mm

- Holgura inferior: 7 mm

- Holgura entre las hojas: 2 mm

Tolerancias de ejecución:

- Aplomado: ± 2 mm

- Holgura puerta-hueco: ± 2 mm

- Alineación de los herrajes de colgar y la guía: ± 2 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de la documentación técnica del fabricante. Se seguirá la secuencia de montaje propuesta por el fabricante.

Todos los elementos se inspeccionarán antes de su colocación.

Una vez colocado, se comprobará que el funcionamiento es correcto, en las cuatro posiciones del cuadro de control.

Su instalación no alterará las características de los elementos.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

La partida incluye la colocación de las fijaciones mecánicas de los montantes fijos.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio

3.2.19 Cierrapuertas para puerta de vidrio, colocado

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Accesorios necesarios para la colocación de vidrios templados fijos o móviles, completamente instalados.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Cerradura para puerta, colocada en el vidrio

- Cierrapuertas empotrado en el pavimento

- Conjunto de pomos cromados o de acero inoxidable, colocados en el vidrio

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

Cierrapuertas:

- Apertura de agujeros en el pavimento para introducir el cierrapuertas

- Fijación de la caja

- Acabado del encuentro del pavimento con la caja

- Colocación de los mecanismos

- Regulación

- Colocación de la tapeta de protección

CIERRAPUERTAS:

Quedará nivelado y enrasado con el pavimento.

Funcionará correctamente y tendrá un accionamiento suave.

El eje de giro del cierrapuertas estará en la misma vertical que el punto de rotación superior.

Tolerancias de instalación:

- Alineación de los puntos de giro: ± 2 mm

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Las cerraduras y cierres se colocarán en los huecos y muescas preparados en las hojas de vidrio.

La caja del cierrapuertas se colocará dentro del agujero del pavimento realizado a tal efecto.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPV/1975: Particiones. Puertas. Vidrio

3.2.20 Inodoros

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Inodoro para fijación mural o para colocar sobre pavimento.

Se han considerado los siguientes materiales:

- Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente al soporte

En función de la colocación los inodoros pueden ser:

- Inodoros murales, instalados en voladizo separados del suelo.

- Inodoros de pie, con pie instalado sobre el suelo.

En función de donde caen los excrementos los inodoros pueden ser:

- Inodoros de fondo plano, donde los excrementos caen en el agua profunda que contiene la taza

- Inodoros de descarga directa, donde los excrementos caen directamente al sifón.

En función de la composición los inodoros pueden ser:

- Inodoro de tanque bajo, es la combinación de un inodoro y una cisterna para formar un conjunto funcional

- Inodoro monobloque es el inodoro que se ha fabricado de una sola pieza la taza y la cisterna.

- Inodoro independiente, es el inodoro que puede conectarse a una cisterna o a un fluxor.

Los inodoros se clasifican:

- Clase 1: Inodoros y conjuntos que pueden utilizar un volumen de descarga de 4, 5, 6, 7 o 9 litros indistintamente.

- Clase 2: Conjuntos de inodoros que para a ser utilizados con fluxor o otro dispositivo de descarga y que utilicen un volumen de descarga de 6 litros como máximo, o una descarga de doble mando que combina una descarga de 6 litres como a máximo y una descarga reducida no superior a 2/3 del volumen de descarga máxima.

Hay dos dispositivos de descarga:

- Tipo A: Cisterna de tipo válvula

- Tipo C: Fluxor.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Será impermeable.

No presentará manchas, desportillamientos, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas.

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.

Los ángulos y las aristas serán redondeados.

Dispondrá de un orificio de conexión para el tubo de alimentación y de dos agujeros practicados para la fijación del asiento y la tapa.

Cumplirá las condiciones requeridas por el Director Facultativo.

Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con la UNE 67001:

- Resistencia a los ácidos: Sin reducción del brillo

- Resistencia a los álcalis: Sin reducción del brillo

- Resistencia al choque térmico: Sin signos visibles de desconchados, resquebrajamiento o grietas

- Resistencia a las manchas: Sin reducción de brillo o manchas permanentes

- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra

Características mecánicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con la UNE 67001:

- Resistencia a las cargas estáticas:

- Inodoros murales: 4000 N

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con las superficies protegidas.

Almacenamiento: Apilados en lugares protegidos de impactos y de la intemperie, en módulos de dos unidades, con un número máximo de tres módulos separados por tablones de madera.

3.2.21 Lavabos

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Lavabo con soporte mural, con pedestal, con semipedestal, para empotrar, para semiempotrar, para fijar bajo encimera o para apoyar sobre encimera o mueble.

Se han considerado los siguientes materiales:

-Porcelana sanitaria con un acabado superficial de esmalte cerámico, unido íntimamente al soporte

-Gres con un acabado superficial de esmalte cerámico, de color blanco, unido íntimamente al soporte

-Material sintético, formado por una parte orgánica y dos partes minerales naturales

CARACTERISTICAS GENERALES:

Será impermeable.

La superficie visible será esmaltada. Se considera superficie visible la parte de la pieza que en posición instalada, es observable por una persona de pie a un metro de distancia.

El aparato no tendrá defectos superficiales que afecten a su funcionamiento o su limpieza, como faltas de esmalte, manchas, desportillamientos, etc.

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.

Las superficies serán lisas y continuas.

Los ángulos y las aristas serán redondeados.

La cubeta del aparato tendrá un desagüe, de tal manera que permita el vaciado completo, sin que se produzcan embalsados.

Cumplirá las condiciones requeridas por el Director Facultativo.

Características físico-químicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con la UNE 67001:

- Resistencia a los ácidos: Sin reducción del brillo

- Resistencia a los álcalis: Sin reducción del brillo

- Resistencia al choque térmico: Sin signos visibles de desconchados, resquebrajamiento o grietas

- Resistencia a las manchas: Sin reducción de brillo o manchas permanentes

- Absorción de agua por la masa de porcelana: =< 0,75 peso muestra

Características mecánicas de aparatos sanitarios de cerámica de acuerdo con la UNE 67001:

-Resistencia a las cargas estáticas:

-Lavabos y lavamanos murales: 1500 N

Tolerancias:

- Anchura (lavabo): - 5 mm

Los lavabos con rebosadero tienen definidas las clases de rebosadero y el caudal correspondiente, de acuerdo con la UNE-EN 14688:

- CL 25: 0,25 l/s

- CL 20 : 0,20 l/s

- CL 15: 0,15 l/s

- CL 10: 0,10 l/s

- CL 00: sin rebosadero

Características esenciales de acuerdo con UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:

- Aptitud para la limpieza

- Resistencia de carga

- Protección contra el desbordamiento

- Durabilidad

La designación del lavabo se realiza indicando con distintos dígitos; el nombre de la Normativa (UNE-EN 14688), tipo de rebosadero (CL) y si es necesario se añade la capacidad del rebosadero (OF), la aptitud pera la limpieza (CA), la resistencia de carga (LR) y la durabilidad (DA):

EN 14688 CL

OF - CA - LR DA

La designación del lavabo pera uso colectivo se realiza indicando con distintos dígitos; el nombre de la Normativa (EN 14296), la aptitud para la limpieza (CA), la resistencia de carga (LR) y la durabilidad (DA):

EN 14296 CA LR DA

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con las superficies protegidas.

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie. Se colocarán en posición vertical.

3.2.22 Grifería y accesorios para lavabos

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Grifos y accesorios para lavabos, de diferentes tipos y de diferentes diámetros de entrada y salida.

Todos los elementos son de latón cromado, dorado o esmaltado.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Grifo
- Batería mezcladora
- Caño

Se han considerado los siguientes tipos de grifos:

- Mezcladora
- Monomando

- Temporizada
- Sencilla

CARACTERISTICAS GENERALES:

Estará exento de picaduras y otros desperfectos. El revestimiento será continuo en toda la superficie.

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.

Los elementos de latón cromado o dorado estarán recubiertos exteriormente con dos capas, una de níquel y la otra de cromo.

Las piezas interiores serán de materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.

Los ángulos y las aristas serán redondeados.

Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.

Espesor del cuerpo: >= 2 mm

Espesor de la primera capa de recubrimiento: >= 5 micras

Espesor de la segunda capa de recubrimiento: >= 0,25 micras

Resistencia a la corrosión del recubrimiento (UNE 37551): No aparecerán burbujas, exfoliaciones, picaduras o desapariciones del recubrimiento

Adherencia del recubrimiento (UNE 37551): No se producirán escamas ni desprendimientos

GRIFO O BATERIA:

El mecanismo de mando permitirá un accionamiento de abertura, de cierre, de regulación de caudal (y de mezcla de agua en el grifo mezclador o monomando), suave y preciso.

En el grifo mezclador, el órgano de mando del agua caliente estará colocado a la izquierda con el distintivo rojo y el del agua fría a la derecha con el distintivo azul.

En el grifo monomando, el órgano de mando indicará con los distintivos rojo y azul el sentido de giro para obtener agua caliente o agua fría.

En el grifo sencillo, la palanca de accionamiento tendrá un distintivo azul para el agua fría, y un distintivo rojo para el agua caliente.

Caudal mínimo de agua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s

Estanqueidad del agua con el obturador cerrado antes y después de la colocación, a 16 bar (UNE 19703): No se producirán fugas

Estanqueidad del agua con el obturador abierto y la boca tapada antes y después de la colocación, a 4 bar (UNE 19-703): No se producirán fugas

Resistencia mecánica con el obturador cerrado con presión de 25 bar (UNE 19-703): No se producirán deformaciones permanentes

Resistencia a torsión del órgano de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En bolsa de plástico dentro de caja protectora.

Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:

Cada bolsa o caja tendrá de forma indeleble y bien visible los datos siguientes:

- Nombre del fabricante o marca comercial
- Instrucciones de instalación y montaje

OPERACIONES DE CONTROL:

Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Solicitar al fabricante la documentación de los materiales escogidos.

- Control de recepción de los materiales, comprobando que sus características se corresponden con lo especificado en el proyecto.

- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:

Se controlará aleatoriamente sobre cada partida recibida.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

En caso de discrepancias con las exigencias del proyecto se aceptará o rechazará el material según criterio de la DF.

3.2.23 Secamanos

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Secamanos eléctrico.

CONDICIONES GENERALES:

Cuando el aparato llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa, su recepción debe realizarse comprobando únicamente sus características aparentes.

Motor: 100 W.

Calefactor: 1800 W.

Dimensiones mínimas:

- Altura: 300 mm.

- Ancho: 220 mm.

- Profundidad: 65 mm.

Temporizador: 45".

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Se deben suministrar embalados en cajas con una placa de identificación con la siguiente información:

- Nombre del fabricante.
- Potencia.

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4 CONDICIONES DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

4.1 Unidades de obra no reseñadas. Partidas alzadas a justificar

Se definirán como obras no reseñadas o partidas alzadas aquellas que no puedan ser definidas total o parcialmente, sino a medida que avanzan los trabajos.

Las obras no reseñadas o partidas alzadas se ejecutarán de acuerdo con las instrucciones del Director Facultativo, con el espíritu e intención contenido en el presente documento y de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el Director Facultativo.

El coste directo de las unidades de obra no reseñadas o partidas alzadas se determinará por aplicación de los precios unitarios de mano de obra, materiales y maquinaría contenidos en la justificación de precios incluida en el expediente. Una vez determinado el Coste Directo, se aplicará a dicha cantidad el porcentaje de Costes Indirectos, para obtener el coste de Ejecución Material. A los costes de Ejecución Material, determinados según lo indicado anteriormente, se aplicarán los coeficientes reglamentarios especificados en el Resumen del Presupuesto y la Baja obtenida en la licitación de las obras

4.2 Partidas alzadas de abono íntegro

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán íntegramente una vez constatado la realización satisfactoria de la misma por parte de la Dirección de Obra.

4.3 Puerto Alcudia

4.3.1 Oficinas APB

4.3.1.1 *Actuaciones previas*

- Demolición de mostrador

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Desmontaje de mostradores no accesibles

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Carga y transporte a vertedero

Criterios de medición

m3 de volumen medida según las especificaciones de la DT

4.3.1.2 *Actuaciones de mejora de accesibilidad*

- Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Suministro y colocación de barandilla

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Puerta abatible exterior

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Puerta interior de madera

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Pavimento de piezas igual a las existentes

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Vinilo adhesivo para señalización

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Colocación placa de señalización de orientación

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Instalación de bucle de inducción magnética

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Mostrador de atención al público accesible

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

4.3.2 Estación marítima

4.3.2.1 *Actuaciones previas*

- Desmontaje de mostradores no accesibles

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Carga y transporte a vertedero

  Criterios de medición

  m3 de volumen medida según las especificaciones de la DT

4.3.2.2 *Actuaciones de mejora de accesibilidad*

- Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Vinilo adhesivo para señalización

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Mostrador de atención al público accesible

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Recolocación de señal

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Instalación de bucle de inducción magnética

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

4.3.3 Lonja

4.3.3.1 *Actuaciones previas*

- Repicado de rampa existente

  Criterios de medición

  m3 de volumen medida según las especificaciones de la DT

- Carga y transporte a vertedero

  Criterios de medición

  m3 de volumen medida según las especificaciones de la DT

4.3.3.2 *Actuaciones de mejora de accesibilidad*

- Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Suministro y colocación de barandilla

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, de dos hojas batientes

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Puerta abatible exterior

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Colocación señal vertical,hormigonado

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Formación de rampa accesible

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Marca vial itinerario peatonal reflectante, blanca

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Colocación placa de señalización de orientación

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

4.4 Puerto Maó

4.4.1 EM Cruceros

4.4.1.1 *Actuaciones previas*

- Desmontaje de mostradores no accesibles

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Carga y transporte a vertedero

  Criterios de medición

  m3 de volumen medida según las especificaciones de la DT

4.4.1.2 *Actuaciones de mejora de accesibilidad*

- Suministro y colocación de barandilla

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Instalación de bucle de inducción magnética

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Mostrador de atención al público accesible

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido

Criterios de medición

m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Vinilo adhesivo para señalización

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

4.4.2 EM Cos Nou

4.4.2.1 *Actuaciones previas*

- Desmontaje de mostradores no accesibles

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Carga y transporte a vertedero

  Criterios de medición

  m3 de volumen medida según las especificaciones de la DT

4.4.2.2 *Actuaciones de mejora de accesibilidad*

- Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Instalación de bucle de inducción magnética

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Mostrador de atención al público accesible

Criterios de medición

Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Vinilo adhesivo para señalización

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

4.5 Puerto de Eivissa

4.5.1 APB

4.5.1.1 *Actuaciones previas*

- Desmontaje de mostradores no accesibles

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Carga y transporte a vertedero

  Criterios de medición

  m3 de volumen medida según las especificaciones de la DT

4.5.1.2 *Actuaciones de mejora de accesibilidad*

- Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Suministro y colocación de barandilla

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Puerta abatible exterior

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Vinilo adhesivo para señalización

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Instalación de bucle de inducción magnética

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Mostrador de atención al público accesible

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

4.5.2 Estación Marítima

4.5.2.1 *Actuaciones previas*

- Desmontaje de mostradores no accesibles

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Carga y transporte a vertedero

Criterios de medición

m3 de volumen medida según las especificaciones de la DT

4.5.2.2 *Actuaciones de mejora de accesibilidad*

- Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Instalación de bucle de inducción magnética

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Mostrador de atención al público accesible

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Colocación placa de señalización de orientación

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

4.5.3 Edificio Martillo

4.5.3.1 *Actuaciones de mejora de accesibilidad*

- Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Colocación señal vertical, hormigonado

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Vinilo adhesivo para señalización

Criterios de medición

Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

4.6 Puerto de La Savina

4.6.1 Estación marítima

4.6.1.1 *Actuaciones previas*

- Desmontaje de mostradores no accesibles

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Carga y transporte a vertedero

  Criterios de medición

  m3 de volumen medida según las especificaciones de la DT

4.6.1.2 *Actuaciones de mejora de accesibilidad*

- Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Suministro y colocación de barandilla

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante

  Criterios de medición

  m de longitud medida según las especificaciones de la DT

- Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

  Criterios de medición

  m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT

- Vinilo adhesivo para señalización

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Instalación de bucle de inducción magnética

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

- Mostrador de atención al público accesible

  Criterios de medición

  Unidad realmente ejecutada, sometida a la aprobación de la Dirección Facultativa

4.7 Partida de abono integro en Seguridad y Salud

4.7.1 Seguridad y salud

- Partida de abono integro en Seguridad y Salud

  Criterios de medición

  Según criterios establecidos para las partidas alzadas de abono íntegro.

5 DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Comprobación del replanteo

El Director Facultativo entregará al Contratista una relación de puntos de referencia materializados sobre el terreno en el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figurarán las coordenadas de los vértices establecidos y la cota ±0,00 elegida, que será el Cero del Puerto.

Antes de iniciar las obras el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia del Director Facultativo, el plano general de replanteo. Así mismo se harán levantamientos topográficos de contraste de las zonas afectadas por las obras.

A continuación, se levantará un acta de replanteo firmada por los representantes de ambas partes. Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra.

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta de comprobación del replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.

Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en esta acta de replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota ±0,00 elegida, que será el Cero del Puerto.

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, tanto terrestres como marítimos. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros, bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito al Director Facultativo que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales.

El Director Facultativo sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por cuenta del Contratista.

5.2 Plazo para comenzar a ejecutar las obras

El Acta de Comprobación del Replanteo deberá firmarse dentro del mes siguiente a la fecha de la firma del contrato.

Cuando el resultado de la Comprobación del Replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio del Director Facultativo y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si

resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el acta de Comprobación del Replanteo.

Las obras deberán quedar terminadas en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones que ha de regir la contratación de las obras.

5.3 Ejecución de las obras

Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y al Proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste diere al Contratista el Director Facultativo, que serán de obligado cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrito.

El Contratista es completamente responsable de la elección del lugar de emplazamiento de los recintos de acopio, talleres, almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies o lugares comprendidos en el actual recinto portuario sin la previa aprobación y sin que tenga derecho a reclamación alguna por este hecho o por la necesidad o conveniencia de cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de iniciados los trabajos.

Las superficies ocupadas del recinto portuario para el desarrollo de los trabajos y que estén reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, estarán exentas del pago de tasas de ocupación. Además, el Contratista deberá hacerse cargo de los gastos y costes reflejados en el apartado “Gastos a cuenta del contratista” de este Pliego que sean necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción, el Contratista es responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción.

Los efectos del Contrato se regularán en todo por las disposiciones que rigen la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5.4 Recepción de los trabajos

Una vez terminadas las obras, se efectuará la recepción, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

A la recepción de los trabajos concurrirá el Facultativo designado por la APB y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si los trabajos se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Facultativo designado los dará por recibidos, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando los trabajos no se hallen en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta, señalándose los defectos observados, fijando un plazo para remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, se le podrá conceder un nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

5.5 Liquidación de la obra

Dentro del plazo de un (1) mes, contados a partir de la fecha de la recepción, deberá acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación de trabajos. Si en el Pliego de Condiciones se hubieran establecidos plazos parciales, la liquidación se referirá única y exclusivamente al último tramo, zona o parte de la obra, debiendo ir precedida de las correspondientes liquidaciones parciales únicas y definitivas de los trabajos recibidos según plazos parciales establecidos.

5.6 Propiedad industrial y comercial

El Contratista será responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados en la ejecución de la obra y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercios.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes.

Las reclamaciones de terceros titulares de licencias, patentes, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de comercio utilizados, deberán ser resueltas por el Contratista, quien se hará cargo de las consecuencias que se deriven de las mismas.

5.7 Medidas de seguridad

El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que puedan dictar el Ministerio de Trabajo y Economía Social y demás Organismos competentes en materias de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las normas de seguridad que correspondan a las características de los mismos, así como las “Instrucciones de Seguridad en los puertos de la Autoridad de Baleares” disponibles en www.portsdebalears.com

El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad un plan que especifique las medidas prácticas de seguridad que para la consecución de las precedentes prescripciones estime necesario tomar en los trabajos.

Este plan deberá precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las complementarias que correspondan a riesgos particulares de los trabajos, con el objeto de asegurar eficazmente:

- La seguridad del propio personal de la APB y del de terceros.
- La higiene, medicina del Trabajo, primeros auxilios y cuidados a enfermos y accidentados.
- La seguridad de sus instalaciones.
- La seguridad de las instalaciones portuarias en general, sean de propiedad de la APB o de terceros.
- La seguridad del tráfico portuario afectado, tanto marítimo como terrestre.

Asimismo, el contratista (y sus subcontratistas), con carácter previo al inicio de sus actividades, habrán de ser homologados por la Oficina de Coordinación de Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales de la Autoridad Portuaria de Baleares (OCAE). Y tendrán la obligación de comunicar los riesgos que puedan proyectar sobre terceros, así como recabar información en relación a los riesgos que puedan ocasionarles otras actividades en la zona, y adoptar las medidas preventivas oportunas.

5.8 Obligaciones de carácter social

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones del tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras.

El Director Facultativo podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.

El Contratista está obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, durante la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral.

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se requieran en la obra.

5.9 Seguro de obra

El Contratista adjudicatario de la obra vendrá obligado a contratar un seguro que cubra los daños materiales y personales que puedan afectar a los trabajos durante su ejecución y asimismo un seguro de responsabilidad civil de daños a terceros que puedan causarse en el emplazamiento de los trabajos durante la ejecución de las mismos. La cobertura de los mismos será como mínimo la indicada en el pliego de condiciones de licitación.

El coste de estos seguros será a cuenta del Contratista, debiendo incluirlo en el cálculo de los costes indirectos, de conformidad a lo previsto en este documento.

Una copia compulsada de las pólizas deberá ser entregada a la APB con anterioridad a la firma del contrato.

En el caso de que el Contratista incumpliese cualquiera de las obligaciones que le impone esta cláusula, y sin perjuicio de los plazos de gracia que la APB pueda conceder, dará lugar a la resolución de la adjudicación.

5.10 Organización y policía de las obras

El Contratista será responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las zonas de actuación. Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes y por el Director Facultativo designado por la APB.

5.11 Interferencia con la explotación portuaria

Las diversas operaciones de construcción y demolición se llevarán a cabo de forma que se cause la menor interferencia posible en el uso del puerto.

Si resultara necesario desplazar cualquier parte de la instalación o interrumpir las obras, dicho desplazamiento o interrupción de operaciones se efectuará siempre que así lo ordene el Director Facultativo, por cuenta y riesgo del Contratista.

5.12 Inadecuada colocación de materiales

Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista perdiera, vertiera, hundiera o inadvertidamente colocara cualquier material, instalación, maquinaria o accesorios que, en opinión del Director Facultativo pudieran representar un peligro y obstrucción para la navegación o que, en cualquier otra forma, pudieran ser objetables, los recuperará y retirará con la mayor prontitud sin coste adicional alguno.

Hasta que se efectúe dicha recuperación y retirada, el Contratista dará aviso inmediato de toda obstrucción que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando la correspondiente descripción y situación de la misma.

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal requisito dichas obstrucciones serán señalizadas o retiradas, o ambas cosas, por oficio y el coste de dicha señalización o retirada, o ambas cosas será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

5.13 Señalización de las obras

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las vallas, balizas, y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director Facultativo.

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar las otras partes de las obras objeto del Contrato de acuerdo a las instrucciones y con los medios que prescriban el Director del Contrato y otras Autoridades competentes, conforme a las disposiciones vigentes. El

Contratista será responsable de cualquier daño derivado de falta o negligencia en el cumplimiento de este artículo.

Serán de cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de todas las luces, medios y equipos necesarios para dar cumplimiento a lo indicado en este artículo.

5.13.1 Señales luminosas y operaciones

El Contratista colocará, a su cargo, señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las operaciones de acuerdo con las órdenes del Director Facultativo y de las Autoridades competentes. Cada noche se encenderán las luces, desde la puesta hasta la salida del sol.

El Contratista será el responsable de cualquier daño que resulte como consecuencia de la falta o negligencia.

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrá, desde la puesta a la salida del sol, las luces necesarias para la adecuada observación de las operaciones de construcción. Estos trabajos deberán ser autorizados por el Director Facultativo.

5.13.2 Balizas y miras

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá, a su cargo y en las debidas condiciones, todas las balizas, boyas y otros indicadores que sean necesarios para definir y realizar los trabajos y facilitar su inspección. Igualmente, instalará y mantendrá miras referidas a la cota cero (0) del Puerto en lugares accesibles desde cualquier punto de la zona de los trabajos con el objetivo de poder determinar, en cualquier momento, las cotas exactas de las zonas de trabajo.

Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos de construcción en cualquier momento en el que las balizas o los indicadores no puedan verse o seguir adecuadamente.

El Director Facultativo proporcionará, a petición del Contratista, una línea base topográfica en tierra así como los puntos altimétricos de referencia y las cotas que resulten razonablemente necesarias para la instalación de las balizas, boyas y miras.

5.14 Retirada de las instalaciones provisionales de obra

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones y estructuras provisionales, incluidas las balizas, boyas, y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra en el plazo de tres (3) meses, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de la obra.

Si el mencionado Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones serán consideradas como obstáculo o impedimento y podrán ser retiradas de oficio.

El coste de dichas retiradas en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

5.15 Obligaciones generales

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de la misma; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro; daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de la limpieza y evacuación de desperdicios y basura; desagües, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y limpieza general de la obra; la adquisición de aguas y energía necesarias para la obra; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados por la liquidación así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.

5.16 Permisos y licencias

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan en el contrato.

5.17 Gastos de cuenta del contratista

La siguiente relación comprende algunos gastos por cuenta del contratista de acuerdo con las condiciones que determina este Pliego:

La siguiente relación comprende algunos gastos por cuenta del contratista de acuerdo con las condiciones que determina este Pliego:

- Eventuales daños ocasionados por condiciones meteorológicas y meteomarítimas extremas (tanto a la obra como instalaciones existentes) serán reparados por el Contratista sin coste adicional, considerándose su responsabilidad contratar un servicio de alerta meteorológica y meteomarítima y tomar todas las precauciones necesarias para que la obra, el personal y eventuales instalaciones existentes no sufran daño.
- Los gastos y costes de las acciones necesarias para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos ocultos, que se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia.
- Los gastos derivados de las tasas de ocupación de aquellas superficies no previstas en el Plan de Seguridad y Salud para el desarrollo de los trabajos
- Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e instalaciones auxiliares.
- Los gastos y costes de cualquier adquisición y/o alquiler de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales o para la explotación de canteras.
- Los gastos y costes de seguros de protección de la obra y de los acopios contra el deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes, así como los de guardería y vigilancia.
- Los gastos y costes de limpiezas y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia y terminación final.
- Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y luces de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

- Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de la obra a su terminación.
- Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras.
- Los gastos derivados de los consumos de agua y electricidad de la red de distribución, sea de la titularidad que sea.
- Los gastos y costes del suministro de agua a la obra en caso que no haya red de distribución, y de generación de energía eléctrica (combustible, grupo electrógeno, etc.)
- Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.
- Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del comportamiento de las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos y los datos topográficos y batimétricos que requiera la obra.
- Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc., dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra.
- Los gastos y costes de replanteo, liquidaciones de la obra y elaboración de los planos as-built.
- Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se expliciten en otros apartados de este Pliego.
- Los gastos y costes en que haya de incurrir para la obtención de licencias, derechos de patente y permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos.
- Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y valorados en el presupuesto.
- Reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos etc., dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas derivadas de la obra.
- Limpieza general de la obra y la limpieza y señalización de carreteras y caminos de acceso.
- Retirada de los materiales rechazados.
- Corrección de las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los ensayos y pruebas.

Todos los gastos, costes y tasas definidas en este artículo están contenidas en los precios unitarios del contrato.

5.18 Programa de trabajo

En el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de notificación de la autorización de iniciación de las obras, el Contratista presentará un Programa detallado de Trabajos, en el que se especifiquen los medios humanos y mecánicos que se adscriben a la obra y que no podrán ser retirados de la misma sin autorización del Director Facultativo, así como los plazos parciales y totales y las valoraciones mensuales y acumuladas.

En dicho programa deberán concretarse los siguientes extremos:

1.- Lugar de procedencia de los distintos materiales, sistema de explotación de yacimiento, medio de selección y transporte a emplear, forma y lugar de acopios, etc.

2.- Descripción detallada del sistema de obra a emplear en cada tajo, donde figure la organización y sistema de ejecución de cada unidad de obra indicando maquinaria a emplear en cada tajo, potencias, rendimientos previstos, medios humanos y auxiliares.

3.- Ritmo de las obras en concordancia con los medios previsto y relación entre los distintos tajos, acompañando un diagrama gráfico detallado (PERT, GANTT, DIAGRAMA ESPACIOS - TIEMPO, etc.).

4.- Relación y descripción detallada de las instalaciones a construir como auxiliares de obra, con indicación del plazo en que estarán terminadas.

5.- Plazos parciales previstos en relación con la consecución del plazo total.

6.- Programa de incorporación de medios humanos y maquinaria acorde con las partidas anteriores.

El programa se estudiará de forma que no se produzcan interferencias que puedan afectar a las instalaciones del Puerto, extremo que habrá de justificarse detalladamente.

Asimismo, el programa se redactará de manera que en todo momento se respeten las servidumbres y limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes.

Una vez aprobado el programa de trabajo será preceptivo en todos los extremos, así como el cumplimiento de los plazos parciales, que señalen para la ejecución de las obras.

La aceptación del programa y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará ninguna exención de la responsabilidad del Contratista en el caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su actuación con ellos de acuerdo con las instrucciones del Director Facultativo. Adaptará el programa de trabajo a dicha coordinación sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, ni justificar retraso en los plazos señalados.

5.19 Personal técnico afecto a las obras

El Contratista vendrá obligado a mantener al frente de los trabajos un Jefe de Obra con titulación competente para la ejecución de los trabajos descritos en el presente expediente. Su designación deberá comunicarse al Director Facultativo para su aprobación antes del comienzo del replanteo de las obras, no pudiendo ausentarse de las mismas sin autorización.

5.20 Libros de órdenes y de incidencias

Se dispondrá en las oficinas de obra, de un libro de órdenes y de incidencias a disposición permanente del Director Facultativo, en el que se transmitirán las órdenes e instrucciones que se comuniquen al Contratista. Será responsabilidad del Contratista poner en obra el Libro de Órdenes y de Incidencias, abonando los costes correspondientes, que se consideran incluidos en los precios de la obra.

5.21 Subcontratistas o destajistas

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra, siendo preciso que previamente obtenga la oportuna autorización del Director Facultativo para lo que, previamente, deberá informar al mismo acerca de su intención y de la extensión de la subcontratación.

El Director Facultativo está facultado para decidir la exclusión de un destajista por estimar al mismo incompetente, o por no reunir las necesarias condiciones. Comunicará esta decisión al Contratista y este deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este destajo.

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Administración como consecuencia del desarrollo por aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la Administración de todas las actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.

5.22 Contradicciones, omisiones o errores

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director de las obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el contrato.

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente haga el Director Facultativo.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto por el Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo.

5.23 Ensayos

El Director Facultativo ordenará los ensayos de materiales y unidades de obra previstos en este Pliego y los que considere además necesarios.

Los ensayos se efectuarán y supervisarán por Laboratorios de Obras homologados con arreglo a las Normas de Ensayos aprobadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y en su defecto las normas UNE.

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el Director Facultativo.

Será por cuenta del Contratista el coste de los ensayos que se realicen. Los ensayos y otras acciones precisas para comprobar la existencia de vicios o defectos ocultos, serán con cargo al Contratista, en caso de confirmarse dichos vicios o defectos.

En cualquier caso, el Contratista adjudicatario de las obras deberá presentar antes del comienzo de las obras ante el Director Facultativo, para su aprobación, un Plan de Calidad, Control, Auscultación y Seguimiento para su aprobación. Dicho plan deberá incorporar, ampliar y detallar las medidas que se proponen en los Anejos y Pliego de este Proyecto.

5.24 Materiales

No se procederá al empleo de ninguno de los materiales que integran las unidades de obra, sin que antes sea examinado y aceptado por el Director Facultativo, salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego.

Cuando la procedencia de algún material no esté fijada en este Pliego, será obtenido por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno, siempre que tal origen sea aprobado por el Director Facultativo.

La fijación de la procedencia de los materiales o su cambio autorizado no serán en ningún caso motivo de variación de los precios ofertados ni del plazo de la obra.

El Contratista notificará al Director Facultativo, con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se propone utilizar. Aportará, cuando así lo solicite el Director Facultativo, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido previamente aprobada por el Director Facultativo

En el caso de que la procedencia de los materiales fuese señalada concretamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dicha procedencia. Si, posteriormente, se comprobara que los materiales de dicha procedencia son inadecuados o insuficientes, el Contratista estará obligado a proponer nuevas procedencias. La aprobación de dicho cambio no presupondrá, como se ha dicho, aumento de los precios ni de los plazos ofertados, aunque el origen de materiales esté a mayor distancia.

En el caso de no haberse definido, por culpa del Contratista, dentro del plazo de un mes, la procedencia de algún material, el Director Facultativo podrá fijar dicha procedencia de los materiales, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados. Pudiendo además incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los plazos.

5.25 Equipos y maquinaria

El Contratista está obligado a aportar el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de la obra en los plazos contratados.

Si para la adjudicación del contrato hubiera sido una condición necesaria la aportación de un equipo concreto y el contratista se hubiera comprometido a aportarlo durante la licitación, el Director Facultativo exigirá el cumplimiento de tal condición.

El Director Facultativo deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las obras, sin que tal aprobación signifique responsabilidad alguna sobre el

resultado o rendimiento de los equipos. Esa responsabilidad es del Contratista en todos los casos.

La maquinaría y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse de la obra sin el consentimiento del Director Facultativo. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo. En este caso el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso no será computable a los efectos de cumplimiento de plazos de la obra.

5.26 Relaciones valoradas y certificaciones

Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los datos de las mismas, el Director Facultativo formulará mensualmente las relaciones valoradas y las certificaciones de obras ejecutadas durante el mes de que se trate, las cuales servirán de base para los abonos que mensualmente se hagan al Contratista. La tramitación de certificaciones y en su caso, las incidencias que pudieran surgir con el Contratista, se realizarán según se dispone en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El Contratista queda obligado a proporcionar al Director Facultativo cuantos elementos y medios le reclame para tales operaciones, así como presenciarlos, sometiéndolos a los procedimientos que ella fije para realizarlas y a suscribir los documentos de los datos obtenidos, pudiendo consignar en ellos de modo conciso las observaciones y reparos que crea oportunos, a reserva de presentar otros datos sobre el particular, en un plazo no mayor de seis (6) días.

Se tomarán además, cuantos datos estime oportuno el Director Facultativo después de la ejecución de las obras y en ocasión de la liquidación final.

Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena cuenta de la liquidación final de los trabajos.

El Contratista facilitará mensualmente, por duplicado ejemplar, la documentación fotográfica necesaria para la constatación a efectos administrativos, del progresivo avance de las obras.

5.27 Relaciones legales y responsabilidades con el público

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias de los Organismos competentes que sean necesarios para la ejecución de las obras y de acuerdo con la legislación vigente.

Además, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios ocasionales a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una señalización insuficiente o defectuosa imputable a aquel.

Asimismo, serán de cuenta del adjudicatario las indemnizaciones a que hubiere lugar por perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, daños causados a sus bienes por apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de caminos provisionales, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, siempre que no se hallen comprendidas en el presente Proyecto o se deriven de una actuación culpable o negligente del Contratista.

El Contratista estará obligado a obtener toda la información referente a servicios afectados por las obras tanto si son del Puerto como de compañías externas, con independencia de la información existente en el proyecto, y será responsable de cualquier avería o accidente que se pueda ocasionar por este motivo.

5.28 Documentación a presentar

A la entrega de los trabajos, el Contratista presentará cuanta documentación sea necesaria para la correcta instalación y mantenimiento de todos los equipos y trabajos descritos en el presente Documento.

Tras la finalización de los trabajos, el Contratista deberá entregar cuanta documentación sea necesaria para la liquidación de las obras. Los textos deberán presentarse tratados con un procesador de textos compatible con Microsoft Word 2013 y los planos deberán presentarse en soporte informático (formato DWG para Autocad versión 2014). El plano de planta se adaptará a la simbología y necesidades del Sistema de Información Geográfica seleccionado por la APB (ORUS), debiéndose adaptar los formatos, colores, tipos de letra y capas de dibujo que determine la APB. Los planos se completarán con las especificaciones descriptivas necesarias de forma que quede claramente registrada la forma y el contenido del trabajo descrito en estas especificaciones y en los planos.

Adicionalmente el Contratista mantendrá en orden y actualizado el dossier de calidad de la obra. A la finalización de los trabajos deberá aportar el lote completo de la documentación relativa al aseguramiento de la calidad de la obra.

Previamente la Autoridad Portuaria de Baleares, facilitará al Contratista el (los) plano (s) de la zona de obra en dicho soporte en el que figuran los vértices topográficos a tener en cuenta para el levantamiento de dichos planos. El origen de la altimetría coincidirá con el "CERO" del Puerto.

También se facilitará la relación de elementos gráficos, niveles, colores, etc., utilizados en la Cartografía de la APB para que sean tenidos en cuenta en la confección de los citados planos.

Las entregas realizadas serán introducidas en el GIS de la APB, comprobando en él la validez de los datos facilitados. En caso de no cumplir estos requisitos, la entrega será devuelta al Contratista, debiendo éste corregir los errores detectados.

Previamente al inicio de las obras, durante su ejecución y una vez finalizadas las mismas, el Contratista se responsabilizará de obtener y entregar a la Dirección tantas cuantas fotografías

sean necesarias para que la realidad de cada una de las tres fases citadas con anterioridad pueda ser retenida y dispuesta en todo momento de forma cronológica. Asimismo, al finalizar las obras, el Contratista deberá entregar una colección de dicha información fotográfica ordenada cronológicamente (un ejemplar en el caso de Palma y dos ejemplares en el de los demás puertos).

5.29 Documentación fotográfica

Previamente al inicio de las obras, durante su ejecución y una vez finalizadas las mismas, el Contratista se responsabilizará de obtener tantas cuantas fotografías sean necesarias para que la realidad de cada una de las tres fases citadas con anterioridad pueda ser retenida y dispuesta en todo momento de forma cronológica, extremo éste que se comprobará mensualmente al entregar, junto a la relación valorada, la colección de fotografías correspondiente.

6 CONSIDERACIÓN FINAL

Con todo lo expuesto en esta memoria y en los documentados citados en el apartado anterior, quedan completamente definidas las obras contenidas en este proyecto, y se justifica la solución adoptada, razón por la que se da por finalizado el presente documento.

En Palma de Mallorca, septiembre de 2024

El Autor del Proyecto

Carlos Torralba Feliu

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Revisado y conforme,

El Jefe de Área de Infraestructuras

Víctor Darder Gallardo

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Vº Bº

El Director

Antonio Ginard López

Ing. de Caminos, Canales y Puertos

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

MEDICIONES

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01	**PUERTO ALCUDIA**					
01.01	**OFICINAS APB**					
01.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
01.01.01.01	**u Demolición de mostrador**					
	Demolición de estructura del mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E6.05 Demolición del mostrador no accesible de obra		4,00			4,00
						4,000
01.01.01.02	**u Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio**					
	Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.02 Sustitución puerta acceso al edificio por el nuevo it.	1				1,00
	E5.02 Op 1. Sustitución puerta abatible de 80 cm de paso	1				1,00
						2,000
01.01.01.03	**m Desmontaje de mostradores no accesibles**					
	Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.01 Desmonte de mostrador no accesible situado en la oficina		1,45			1,45
						1,450
01.01.01.04	**m3 Carga y transporte a vertedero**					
	Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	Vidrio	1,4	2,00	0,80	0,01	0,02
	Madera	1,4	2,00	0,80	0,50	2,24 2
	Desmonte de mostrador no accesible situado en las oficinas	1,4	0,90	1,20	0,50	4,54 6
						6,800

IDOM

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
01.01.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E7.01 Pasamanos doble altura escalera fija	2	11,05			22,10
						22,100
01.01.02.02	**m Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E7.01 Barandilla con pasamanos accesible (en rellano y espacio n		2,60			2,60
						2,600
01.01.02.03	**u Puerta abatible exterior** Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.02 Sustitución puerta de acceso	1				1,000
						1,000
01.01.02.04	**u Puerta interior de madera** Suministro y colocación de puerta interior de madera para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, acabado a definir por el Director Facultativo, incluso herrajes de cierre y de colgar. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E5.02 Op 1. Substitución puerta abatible de 80 cm de paso	1				1,00
						1,000
01.01.02.05	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.					

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E7.01 Señalización de escalones	2	1,50			3,00
						3,000
01.01.02.06	**m2 Pavimento de piezas igual a las existentes** Suministro y colocación pavimento de loseta, de dimensiones y características similares a las existentes, sentada con mortero de cemento de 3 cm de espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E6.05 Sustitución de pavimento tras demolición del mostrador		2,05			2,05
						2,050
01.01.02.07	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.01 Mostradores		8,43			8,43
						8,430
01.01.02.08	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.02 Vinilo adhesivo para señalización de puerta de acceso	1				1,00
	E3.01 Señalización de acceso	1				1,00
	E6.05 Colocación de señalización indicando itinerario accesible	1				1,00
						3,000
01.01.02.09	**u Colocación placa de señalización de orientación** Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E3.01 Colocación placa señalización de orientación colgada techo	1				1,00

IDOM

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
						1,000
01.01.02.10	**u Instalación de bucle de inducción magnética**					
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.01 Bucle de inducción magnética	2				2,00
						2,000
01.01.02.11	**u Mostrador de atención al público accesible**					
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.01-02 Unidad de mostrador de atención al público accesible	2				2,00
						2,000
01.01.02.12	**u Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera**					
	Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E17.01-02 Cambio unidades asientos de zonas espera por unidades	2				2,00
						2,000

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.02	**ESTACIÓN MARÍTIMA**					
01.02.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
01.02.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.03 Desmonte de mostrador no accesible situado en las oficina		2,41			2,41
						2,410
01.02.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.03 Desmonte de mostrador no accesible situado en las oficina	1,4	2,41	1,20	0,50	2,02
						2,020
01.02.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
01.02.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E9.04-5 Pasamanos inferior escaleras		80,30			80,30
						80,300
01.02.02.02	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E7.05 Tira antideslizante de color negro de 50 mm para señal	1	10,00			10,00
	E10.01 Línea demarcación del peldaño	1	7,00			7,00
						17,000
01.02.02.03	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales,					

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.05 Vinilo adhesivo para señalización puerta de vidrio	10				10,00
	E5.04 Vinilo adhesivo para señalización puerta de vidrio	10				10,00
	E6.01 Colocación de señalización indicando itinerario accesible	2				2,00
	E22.01 Señalización bucle inducción magnética	1				1,00
	E22.01 Señalización seguridad a usuarios implantes cocleares	1				1,00
						24,000
01.02.02.04	**u Mostrador de atención al público accesible**					
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.03 Unidad de mostrador de atención al público accesible	1				1,00
						1,000
01.02.02.05	**u Recolocación de señal**					
	Desmontaje, traslado y posterior montaje de señal existente. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E6.01 Recolocación señal de direccionamiento	1				1,00
						1,000
01.02.02.06	**u Instalación de bucle de inducción magnética**					
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.03 Bucle de inducción magnética	2				2,00
	E22.01 Bucle de inducción magnética	1				1,00
						3,000

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.03	**LONJA**					
01.03.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
01.03.01.01	**m3 Repicado de rampa existente**					
	Repicado de superficie de hormigón, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E1.03 Nueva rampa		8,70			8,70
						8,700
01.03.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero**					
	Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E1.03 Repicado de rampa existente	1,4	8,70			12,18
						12,180
01.03.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
01.03.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**					
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E1.03 Nueva rampa	1	5,46			5,46
	E7.02 Sustitución de barandilla existente por barandilla	1	9,87			9,87
	E9.02 Pasamanos	1	14,41			14,41
						29,740
01.03.02.02	**m Suministro y colocación de barandilla**					
	Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E1.03 Nueva rampa	1	5,46			5,46
	E7.02-3 Substitución de barandilla existente por barandilla	1	9,87			9,87
						15,330
01.03.02.03	**u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, de dos hojas batientes**					
	Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, dos hojas batientes, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco.					

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E5.03 Sustitución puertas de doble hoja	3				3,00
						3,000
01.03.02.04	**u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente** Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E5.03 Sustitución de ancho libre de paso inferior de 71 cm	3				3,00
						3,000
01.03.02.05	**u Puerta abatible exterior** Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E5.03 Sustitución de puertas almacenillo	17				17,000
						17,000
01.03.02.06	**u Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio** Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de dimensiones adecuadas para el hueco de obra, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales para su instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.03 Sustitución puerta de acceso	2				2,00
						2,000

IDOM

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
01.03.02.07	**u Colocación señal vertical, hormigonado**					
	Colocación de tubo de acero galvanizado de señal vertical, colocado en tierra hormigonado. Incluye placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 55x70 cm, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E1.03 Señalización aviso vehículos	1				1,00
						1,000
01.03.02.08	**m2 Formación de rampa accesible**					
	Formación de rampa compuesta por recrecido de hormigón de 15 cm de espesor medio y suministro y colocación de pavimento cerámico, recibido con mortero adhesivo, previa preparación de la superficie a la colocación. El solado incluye rejuntado, devastado, pulido y abrillantado. Incluye encofrado y parte proporcional de junta de acero inoxidable en cambio de pavimentos. Totalmente terminado y ejecutado conforme a especificaciones del CTE.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E1.03 Nueva rampa	1	5,46	1,60		8,74
						8,740
01.03.02.09	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**					
	Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E1.03 Pavimento táctil a comienzo y final de la rampa	2	1,50			3,00
	E7.02-3 Señalización bajo-escalera	1	7,95			7,95
						10,950
01.03.02.10	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**					
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E1.03 Inicio y final de la rampa		5,67			5,67
	E7.02-3 Pavimento táctil en escalera y escalón		2,00			2,00
						7,670
01.03.02.11	**m2 Marca vial itinerario peatonal reflectante, blanca**					
	Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además					

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E1.03 Pintura señalización itinerario peatonal		5,30			5,30
						5,300
01.03.02.12	**u Colocación placa de señalización de orientación** Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E6.03 Colocación placa señalización de orientación colgada	2				2,00
						2,000

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	
02	**PUERTO MAÓ**						
02.01	**EM CRUCEROS**						
02.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**						
02.01.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles**						
	Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.02 Desmonte de mostrador no accesible situado en las Oficina	3	4,60			13,80	
						13,800	
02.01.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero (Mahón)**						
	Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.02 Desmonte de mostrador no accesible situado en las oficina	1,4	4,60	1,20	0,50	11,59	*3*
						11,590	
02.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**						
02.01.02.01	**m Suministro y colocación de barandilla**						
	Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E9.01 Pasamanos anclado a pared colindante a la escalera	1	6,15			6,15	
						6,150	
02.01.02.02	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**						
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E7.01 Señalización de escalones		3,78			3,78	
	E12.01 Pavimento táctil señalización acceso ascensores		1,51			1,51	
	E14.01 Pavimento podotáctil		9,44			9,44	
						14,730	

IDOM

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
02.01.02.03	**u Instalación de bucle de inducción magnética**					
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.02 Bucle de inducción magnética	7				7,00
						7,000
02.01.02.04	**u Mostrador de atención al público accesible**					
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.02 Unidad de mostrador de atención al público accesible	3				3,00
						3,000
02.01.02.05	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**					
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E9.01 Pasamanos anclado a pared colindante a la escalera	1	11,30			11,30
	E12.01 Pasamanos en los dos paramentos verticales	1	5,93			5,93
						17,230
02.01.02.06	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**					
	Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E7.01 Señalización de escalones		45,00			45,00
						45,000
02.01.02.07	**u Vinilo adhesivo para señalización**					
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.01 Colocación señalización por franjas en puerta vidrio	7				7,00
						7,000

IDOM

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
02.01.02.08	**u Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera**					
	Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E17.04 Cambio unidades de asientos de zonas de espera	2				2,00
						2,000

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	
02.02	**EM COS NOU**						
02.02.01	**ACTUACIONES PREVIAS**						
02.02.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.03 Desmonte de mostrador no accesible situado en la Oficina	2	2,00			4,00	
						4,000	
02.02.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero (Mahón)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.03 Desmonte de mostrador no accesible situado en la oficina	1,4	2,00	1,20	0,50	3,36	2
						3,360	
02.02.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**						
02.02.02.01	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E8.06 R3. Pavimento táctil a comienzo y final de la rampa		3,91			3,91	
	E14.03 Pavimento podotáctil		6,85			6,85	
						10,760	
02.02.02.02	**u Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.03 Bucle de inducción magnética	2				2,00	
						2,000	
02.02.02.03	**u Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.						

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.03 Montaje mostrador accesible	2				2,00
						2,000
02.02.02.04	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**					
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E8.06 R3. Pasamanos anclado a pared paramento vertical	1	3,25			3,25
						3,250
02.02.02.05	**u Vinilo adhesivo para señalización**					
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.03 Señalización bucle de inducción magnética	2				2,00
	E5.05 Señalización SIA aseo adaptado	2				2,00
						4,000

IDOM

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
03	**PUERTO EIVISSA**					
03.01	**APB**					
03.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**					
03.01.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles**					
	Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".					
	En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.01 Desmonte de mostrador no accesible situado en la Oficina	2,19	2,19			
						2,190
03.01.01.02	**u Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio**					
	Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".					
	En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.01 Sustitución puerta de acceso	1				1,00
						1,000
03.01.01.03	**m3 Carga y transporte a vertedero (Ibiza)**					
	Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.					
	En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.01 Sustitución puerta de acceso	1,4	2,00	0,80	0,10	0,22
	E14.01 Desmonte de mostrador no accesible situado en la Oficina	1,4	2,19	1,20	0,50	1,84
						2,060
03.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
03.01.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**					
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.02 Pasamanos doble altura escalera fija	2	11,05			22,10
	E9.01 Pasamanos anclado a pared colindante a la escalera Oficina	1	9,13			9,13
	E9.02 Pasamanos anclado a pared colindante a escalera Capitanía	1	27,28			27,28
						58,510

IDOM

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
03.01.02.02	**m Suministro y colocación de barandilla**					
	Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E9.01 Barandilla escalera accesible Oficinas APB	1	16,25			16,25
	E9.02 Barandilla escalera accesible Capitanía Marítima	1	5,50			5,50
						21,750
03.01.02.03	**u Puerta abatible exterior**					
	Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.01 Sustitución puerta de acceso	1				1,000
						1,000
03.01.02.04	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**					
	Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E7.01 Señalización de escalones		34,60			34,60
						34,600
03.01.02.05	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**					
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E7.01 Pavimento táctil en escalera y escalón		4,50			4,50
	E7.02 Pavimento táctil en escalera y escalón		8,40			8,40
	E14.01Pavimento podotáctil		1,90			1,90
						14,800
03.01.02.06	**u Vinilo adhesivo para señalización**					
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.					
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los					

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.01 Colocación señalización por franjas en puerta corredera	1				1,00
	E5.01-03 Colocación señalización por franjas en puerta corredera	6				6,00
	E7.02 Señalización bajo-escalera	6				6,00
						13,000
03.01.02.07	**u Instalación de bucle de inducción magnética**					
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.01 Bucle de inducción magnética	1				1,00
						1,000
03.01.02.08	**u Mostrador de atención al público accesible**					
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.01 Unidad de mostrador de atención al público accesible	1				1,00
						1,000
03.01.02.09	**u Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera**					
	Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E17.01-02 Cambio unidades asientos de zonas espera por unidades	1				1,00
						1,000

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	
03.02	**ESTACIÓN MARÍTIMA**						
03.02.01	**ACTUACIONES PREVIAS**						
03.02.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.02 Desmonte de mostrador no accesible situado en las Oficina	4	3,72			14,88	
						14,880	
03.02.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero (Ibiza)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.02 Desmonte de mostrador no accesible situado en las oficina	1,4	3,72	1,20	0,50	12,50	*4*
						12,500	
03.02.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**						
03.02.02.01	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.02 Pavimento podotáctil	6	8,13			48,78	
						48,780	
03.02.02.02	**u Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.02 Bucle de inducción magnética	4				4,00	
						4,000	
03.02.02.03	**u Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los						

IDOM

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.02 Unidad de mostrador de atención al público accesible	4				4,00
						4,000
03.02.02.04	**u Colocación placa de señalización de orientación**					
	Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E6.02 Colocación placa señalización de orientación colgada	1				1,00
						1,000

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
03.03	**EDIFICIO MARTILLO**					
03.03.01	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**					
03.03.01.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E9.03 Pasamanos anclado a pared colindante a la rampa	1	61,00			61,00
						61,000
03.03.01.02	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E12.01 Señalización SIA ascensor	1				1,00
						1,000
03.03.01.03	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E12.01 Pavimento táctil señalización acceso ascensor		0,60			0,60
						0,600
03.03.01.04	**m Marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor** Suministro y colocación de marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E12.01 Marco cromáticamente contrastado	1	5,35			5,35
						5,350

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	
04	**PUERTO LA SAVINA**						
04.01	**ESTACIÓN MARÍTIMA**						
04.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**						
04.01.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles**						
	Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".						
	En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.01 Desmonte de mostrador no accesible situado en las Oficina	3	4,00			12,00	
						12,000	
04.01.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero (La Savina)**						
	Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.						
	En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E14.01 Desmonte de mostrador no accesible situado en la oficina	1,4	4,00	1,20	0,50	10,08	*3*
						10,080	
04.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**						
04.01.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**						
	Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo.En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E12.01 Pasamanos en los dos paramentos verticales		2,21			2,21	
						2,210	
04.01.02.02	**m Suministro y colocación de barandilla**						
	Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5.						
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.						
	E9.01 Barandilla escalera accesible		20,62			20,62	
						20,620	
04.01.02.03	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**						
	Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.						
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los						

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
	posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E7.01 Señalización de escalones	63,00				63,00
						63,000
04.01.02.04	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**					
	Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E7.01 Pavimento táctil escalera y escalón	5,30				5,30
	E12.01 Pavimento táctil señalización acceso ascensor	3,03				3,03
	E14.01 Bucle de inducción magnética	9,71				9,71
						18,040
04.01.02.05	**u Vinilo adhesivo para señalización**					
	Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E2.01 Colocación de señalización por franjas en fachada	12				12,00
	E14.01 Bucle de inducción magnética	7				7,00
						19,000
04.01.02.06	**u Instalación de bucle de inducción magnética**					
	Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E12.01 Bucle de inducción magnética	1				1,00
	E14.01 Bucle de inducción magnética	7				7,00
						8,000
04.01.02.07	**u Mostrador de atención al público accesible**					
	Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.					
	E14.01 Unidad de mostrador de atención al público accesible	3				3,00
						3,000

IDOM

MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD
05	**SEGURIDAD Y SALUD**					
05.01	**u Partida de abono integro en Seguridad y Salud** Partida de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el documento adjunto correspondiente.					
						1,000

CUADRO DE PRECIOS Nº 1

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		**PUERTO ALCUDIA**	
01.01		**OFICINAS APB**	
01.01.01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
01.01.01.01	**u**	**Demolición de mostrador** Demolición de estructura del mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	**13,72**
01.01.01.02	**u**	**Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio** Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	**145,28**
01.01.01.03	**m**	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**62,26**
01.01.01.04	**m3**	**Carga y transporte a vertedero** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	**121,76**

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01.01.02 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

01.01.02.01 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** **333,43**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.02.02 **m** **Suministro y colocación de barandilla** **646,92**

Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.02.03 **u** **Puerta abatible exterior** **1.444,85**

Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.02.04 **u** **Puerta interior de madera** **562,17**

Suministro y colocación de puerta interior de madera para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, acabado a definir por el Director Facultativo, incluso herrajes de cierre y de colgar. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.01.02.05 **m** **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** **32,51**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.02.06 **m2** **Pavimento de piezas igual a las existentes** **45,01**

Suministro y colocación pavimento de loseta, de dimensiones y características similares a las existentes, sentada con mortero de cemento de 3 cm de espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

01.01.02.07 **m2** **Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** **166,26**

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

01.01.02.08 **u** **Vinilo adhesivo para señalización** **46,94**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.01.02.09 **u** **Colocación placa de señalización de orientación** **169,37**

Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.01.02.10	**u**	**Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	**421,49**
01.01.02.11	**u**	**Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	**997,80**
01.01.02.12	**u**	**Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera** Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	**691,79**

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.02		**ESTACIÓN MARÍTIMA**	
01.02.01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
01.02.01.01	**m**	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**62,26**
01.02.01.02	**m3**	**Carga y transporte a vertedero** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	**121,76**
01.02.02		**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**	
01.02.02.01	**m**	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	**333,43**
01.02.02.02	**m**	**Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	**32,51**
01.02.02.03	**u**	**Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**46,94**

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.02.04 **u** **Mostrador de atención al público accesible** **997,80**

Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.02.02.05 **u** **Recolocación de señal** **31,13**

Desmontaje, traslado y posterior montaje de señal existente.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.02.02.06 **u** **Instalación de bucle de inducción magnética** **421,49**

Instalación de bucle de inducción magnética
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.03		**LONJA**	
01.03.01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
01.03.01.01	**m3**	**Repicado de rampa existente**	**175,95**
		Repicado de superficie de hormigón, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.03.01.02	**m3**	**Carga y transporte a vertedero**	**121,76**
		Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		CIENTO VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
01.03.02		**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**	
01.03.02.01	**m**	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**	**333,43**
		Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.03.02.02	**m**	**Suministro y colocación de barandilla**	**646,92**
		Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
01.03.02.03	**u**	**Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, de dos hojas batientes**	**883,92**
		Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, dos hojas batientes, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03.02.04 **u** **Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente** **654,17**

Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.03.02.05 **u** **Puerta abatible exterior** **1.444,85**

Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.02.06 **u** **Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio** **3.423,92**

Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de dimensiones adecuadas para el hueco de obra, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales para su instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.03.02.07	**u**	**Colocación señal vertical, hormigonado** Colocación de tubo de acero galvanizado de señal vertical, colocado en tierra hormigonado. Incluye placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 55x70 cm, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	**223,09**
01.03.02.08	**m2**	**Formación de rampa accesible** Formación de rampa compuesta por recrecido de hormigón de 15 cm de espesor medio y suministro y colocación de pavimento cerámico, recibido con mortero adhesivo, previa preparación de la superficie a la colocación. El solado incluye rejuntado, devastado, pulido y abrillantado. Incluye encofrado y parte proporcional de junta de acero inoxidable en cambio de pavimentos. Totalmente terminado y ejecutado conforme a especificaciones del CTE. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	**198,22**
01.03.02.09	**m**	**Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	**32,51**
01.03.02.10	**m2**	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**166,26**
01.03.02.11	**m2**	**Marca vial itinerario peatonal reflectante, blanca** Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos	**27,26**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		VEINTISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	
01.03.02.12	**u**	**Colocación placa de señalización de orientación**	**169,37**
		Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02		**PUERTO MAÓ**	
02.01		**EM CRUCEROS**	
02.01.01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
02.01.01.01	**m**	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**62,26**
02.01.01.02	**m3**	**Carga y transporte a vertedero (Mahón)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	**39,11**
02.01.02		**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**	
02.01.02.01	**m**	**Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	**646,92**
02.01.02.02	**m2**	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**166,26**
02.01.02.03	**u**	**Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos	**421,49**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.02.04 **u** **Mostrador de atención al público accesible** **997,80**

Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.01.02.05 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** **333,43**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.02.06 **m** **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** **32,51**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.02.07 **u** **Vinilo adhesivo para señalización** **46,94**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.02.08 **u** **Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera** **691,79**

Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.02		**EM COS NOU**	
02.02.01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
02.02.01.01	**m**	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**62,26**
02.02.01.02	**m3**	**Carga y transporte a vertedero (Mahón)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	**39,11**
02.02.02		**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**	
02.02.02.01	**m2**	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**166,26**
02.02.02.02	**u**	**Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	**421,49**
02.02.02.03	**u**	**Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la	**997,80**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

ejecución de los trabajos.

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.02.02.04 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** **333,43**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.02.05 **u** **Vinilo adhesivo para señalización** **46,94**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03		**PUERTO EIVISSA**	
03.01		**APB**	
03.01.01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
03.01.01.01	**m**	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**62,26**
03.01.01.02	**u**	**Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio** Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	**145,28**
03.01.01.03	**m3**	**Carga y transporte a vertedero (Ibiza)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	**39,11**
03.01.02		**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**	
03.01.02.01	**m**	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	**333,43**
03.01.02.02	**m**	**Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total	**646,92**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.02.03 **u** **Puerta abatible exterior** **1.444,85**

Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.02.04 **m** **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** **32,51**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.02.05 **m2** **Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** **166,26**

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

03.01.02.06 **u** **Vinilo adhesivo para señalización** **46,94**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.02.07 **u** **Instalación de bucle de inducción magnética** **421,49**

Instalación de bucle de inducción magnética
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.02.08 **u** **Mostrador de atención al público accesible** **997,80**

Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.01.02.09 **u** **Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera** **691,79**

Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02		**ESTACIÓN MARÍTIMA**	
03.02.01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
03.02.01.01	**m**	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**62,26**
03.02.01.02	**m3**	**Carga y transporte a vertedero (Ibiza)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	**39,11**
03.02.02		**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**	
03.02.02.01	**m2**	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**166,26**
03.02.02.02	**u**	**Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	**421,49**
03.02.02.03	**u**	**Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos	**997,80**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
03.02.02.04	**u**	**Colocación placa de señalización de orientación** Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**169,37**
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.03		**EDIFICIO MARTILLO**	
03.03.01		**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**	
03.03.01.01	**m**	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	**333,43**
03.03.01.02	**u**	**Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	**46,94**
03.03.01.03	**m2**	**Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**166,26**
03.03.01.04	**m**	**Marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor** Suministro y colocación de marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	**30,72**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04		**PUERTO LA SAVINA**	
04.01		**ESTACIÓN MARÍTIMA**	
04.01.01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
04.01.01.01	**m**	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	**62,26**
04.01.01.02	**m3**	**Carga y transporte a vertedero (La Savina)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	**545,94**
04.01.02		**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**	
04.01.02.01	**m**	**Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo.En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	**333,43**
04.01.02.02	**m**	**Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla,formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	**646,92**
04.01.02.03	**m**	**Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total	**32,51**

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.02.04 **m2** **Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** **166,26**

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

04.01.02.05 **u** **Vinilo adhesivo para señalización** **46,94**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.02.06 **u** **Instalación de bucle de inducción magnética** **421,49**

Instalación de bucle de inducción magnética
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.02.07 **u** **Mostrador de atención al público accesible** **997,80**

Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05		**SEGURIDAD Y SALUD**	
05.01	**u**	**Partida de abono integro en Seguridad y Salud** Partida de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el documento adjunto correspondiente.	**5.250,00**

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

En Palma de Mallorca, julio de 2024

El Autor del Proyecto

Carlos Torralba Feliu
Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Revisado y conforme,
El Jefe de Área de Infraestructuras

Víctor Darder Gallardo
Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Vº Bº
El Director

Antonio Ginard López
Ing. de Caminos, Canales y Puertos

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01		**PUERTO ALCUDIA**	
01.01		**OFICINAS APB**	
01.01.01		**ACTUACIONES PREVIAS**	
01.01.01.01	**u**	**Demolición de mostrador** Demolición de estructura del mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	8,96
		Maquinaria	3,73
		Resto de obra y materiales	0,25
		Suma la partida	12,94
		Costes indirectos 6%	0,78
		TOTAL PARTIDA	**13,72**
01.01.01.02	**u**	**Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio** Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	134,37
		Resto de obra y materiales	2,69
		Suma la partida	137,06
		Costes indirectos 6%	8,22
		TOTAL PARTIDA	**145,28**
01.01.01.03	**m**	**Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra	57,59
		Resto de obra y materiales	1,15
		Suma la partida	58,74
		Costes indirectos 6%	3,52
		TOTAL PARTIDA	**62,26**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01.01.01.04 **m3** **Carga y transporte a vertedero**

Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Maquinaria		8,58
Resto de obra y materiales		106,29
Suma la partida		114,87
Costes indirectos	6%	6,89
TOTAL PARTIDA		**121,76**

Maquinaria		8,58
Resto de obra y materiales		106,29
Suma la partida		114,87
Costes indirectos	6%	6,89
TOTAL PARTIDA		**121,76**

01.01.02 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

01.01.02.01 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,64
Resto de obra y materiales		299,92
Suma la partida		314,56
Costes indirectos	6%	18,87
TOTAL PARTIDA		**333,43**

01.01.02.02 **m** **Suministro y colocación de barandilla**

Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		23,33
Resto de obra y materiales		586,97
Suma la partida		610,30
Costes indirectos	6%	36,62
TOTAL PARTIDA		**646,92**

01.01.02.03 **u** **Puerta abatible exterior**

Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		16,84
Resto de obra y materiales		1.346,23
Suma la partida		1.363,07
Costes indirectos	6%	81,78
TOTAL PARTIDA		**1.444,85**

01.01.02.04 **u** **Puerta interior de madera**

Suministro y colocación de puerta interior de madera para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, acabado a definir por el Director Facultativo, incluso herrajes de cierre y de colgar. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		69,95
Resto de obra y materiales		460,40
Suma la partida		530,35
Costes indirectos	6%	31,82
TOTAL PARTIDA		**562,17**

01.01.02.05 **m** **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,64
Maquinaria		0,14
Resto de obra y materiales		24,89
Suma la partida		30,67
Costes indirectos	6%	1,84
TOTAL PARTIDA		**32,51**

01.01.02.06 **m2** **Pavimento de piezas igual a las existentes**

Suministro y colocación pavimento de loseta, de dimensiones y características similares a las existentes, sentada con mortero de cemento de 3 cm de espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

ejecución de los trabajos.

Mano de obra		21,63
Resto de obra y materiales		20,83
Suma la partida		42,46
Costes indirectos	6%	2,55
TOTAL PARTIDA		**45,01**

01.01.02.07 m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		108,66
Resto de obra y materiales		48,19
Suma la partida		156,85
Costes indirectos	6%	9,41
TOTAL PARTIDA		**166,26**

01.01.02.08 u Vinilo adhesivo para señalización

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,91
Resto de obra y materiales		38,37
Suma la partida		44,28
Costes indirectos	6%	2,66
TOTAL PARTIDA		**46,94**

01.01.02.09 u Colocación placa de señalización de orientación

Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		26,54
Resto de obra y materiales		133,24
Suma la partida		159,78
Costes indirectos	6%	9,59
TOTAL PARTIDA		**169,37**

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01.01.02.10 **u** **Instalación de bucle de inducción magnética**

Instalación de bucle de inducción magnética
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,83
Resto de obra y materiales		382,80
Suma la partida		397,63
Costes indirectos	6%	23,86
TOTAL PARTIDA		**421,49**

01.01.02.11 **u** **Mostrador de atención al público accesible**

Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		110,36
Resto de obra y materiales		830,96
Suma la partida		941,32
Costes indirectos	6%	56,48
TOTAL PARTIDA		**997,80**

01.01.02.12 **u** **Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera**

Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,83
Resto de obra y materiales		637,80
Suma la partida		652,63
Costes indirectos	6%	39,16
TOTAL PARTIDA		**691,79**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01.02 ESTACIÓN MARÍTIMA

01.02.01 ACTUACIONES PREVIAS

01.02.01.01 m Desmontaje de mostradores no accesibles

Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		57,59
Resto de obra y materiales		1,15
Suma la partida		58,74
Costes indirectos	6%	3,52
TOTAL PARTIDA		**62,26**

01.02.01.02 m3 Carga y transporte a vertedero

Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Maquinaria		8,58
Resto de obra y materiales		106,29
Suma la partida		114,87
Costes indirectos	6%	6,89
TOTAL PARTIDA		**121,76**

01.02.02 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

01.02.02.01 m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,64
Resto de obra y materiales		299,92
Suma la partida		314,56
Costes indirectos	6%	18,87
TOTAL PARTIDA		**333,43**
Mano de obra		14,64
Resto de obra y materiales		299,92
Suma la partida		314,56
Costes indirectos	6%	18,87
TOTAL PARTIDA		**333,43**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01.02.02.02 **m** **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,64
Maquinaria		0,14
Resto de obra y materiales		24,89
Suma la partida		30,67
Costes indirectos	6%	1,84
TOTAL PARTIDA		**32,51**

01.02.02.03 **u** **Vinilo adhesivo para señalización**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,91
Resto de obra y materiales		38,37
Suma la partida		44,28
Costes indirectos	6%	2,66
TOTAL PARTIDA		**46,94**

01.02.02.04 **u** **Mostrador de atención al público accesible**

Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		110,36
Resto de obra y materiales		830,96
Suma la partida		941,32
Costes indirectos	6%	56,48
TOTAL PARTIDA		**997,80**

01.02.02.05 **u** **Recolocación de señal**

Desmontaje, traslado y posterior montaje de señal existente.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		28,79

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Resto de obra y materiales.....	0,58
		Suma la partida.....	29,37
		Costes indirectos 6%	1,76
		TOTAL PARTIDA.....	**31,13**
01.02.02.06	**u**	**Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra.....	14,83
		Resto de obra y materiales.....	382,80
		Suma la partida.....	397,63
		Costes indirectos 6%	23,86
		TOTAL PARTIDA.....	**421,49**

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01.03 LONJA

01.03.01 ACTUACIONES PREVIAS

01.03.01.01 **m3** **Repicado de rampa existente**

Repicado de superficie de hormigón, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		134,46
Maquinaria		28,28
Resto de obra y materiales		3,25
Suma la partida		165,99
Costes indirectos	6%	9,96
TOTAL PARTIDA		**175,95**

01.03.01.02 **m3** **Carga y transporte a vertedero**

Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Maquinaria		8,58
Resto de obra y materiales		106,29
Suma la partida		114,87
Costes indirectos	6%	6,89
TOTAL PARTIDA		**121,76**

01.03.02 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

01.03.02.01 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,64
Resto de obra y materiales		299,92
Suma la partida		314,56
Costes indirectos	6%	18,87
TOTAL PARTIDA		**333,43**
Mano de obra		14,64
Resto de obra y materiales		299,92
Suma la partida		314,56
Costes indirectos	6%	18,87
TOTAL PARTIDA		**333,43**

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01.03.02.02 **m** **Suministro y colocación de barandilla**

Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		23,33
Resto de obra y materiales		586,97
Suma la partida		610,30
Costes indirectos	6%	36,62
TOTAL PARTIDA		**646,92**

01.03.02.03 **u** **Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, de dos hojas batientes**

Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, dos hojas batientes, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,04
Resto de obra y materiales		828,85
Suma la partida		833,89
Costes indirectos	6%	50,03
TOTAL PARTIDA		**883,92**

01.03.02.04 **u** **Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente**

Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,04
Resto de obra y materiales		612,10
Suma la partida		617,14
Costes indirectos	6%	37,03
TOTAL PARTIDA		**654,17**

01.03.02.05 **u** **Puerta abatible exterior**

Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		16,84
Resto de obra y materiales		1.346,23
Suma la partida		1.363,07
Costes indirectos	6%	81,78
TOTAL PARTIDA		**1.444,85**

01.03.02.06 **u** **Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio**

Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de dimensiones adecuadas para el hueco de obra, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales para su instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		38,79
Resto de obra y materiales		3.191,32
Suma la partida		3.230,11
Costes indirectos	6%	193,81
TOTAL PARTIDA		**3.423,92**

01.03.02.07 **u** **Colocación señal vertical, hormigonado**

Colocación de tubo de acero galvanizado de señal vertical, colocado en tierra hormigonado. Incluye placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 55x70 cm, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		24,34
Maquinaria		2,41
Resto de obra y materiales		183,71
Suma la partida		210,46
Costes indirectos	6%	12,63
TOTAL PARTIDA		**223,09**

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

01.03.02.08 **m2** **Formación de rampa accesible**

Formación de rampa compuesta por recrecido de hormigón de 15 cm de espesor medio y suministro y colocación de pavimento cerámico, recibido con mortero adhesivo, previa preparación de la superficie a la colocación. El solado incluye rejuntado, devastado, pulido y abrillantado. Incluye encofrado y parte proporcional de junta de acero inoxidable en cambio de pavimentos. Totalmente terminado y ejecutado conforme a especificaciones del CTE.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		79,51
Maquinaria		4,67
Resto de obra y materiales		102,82
Suma la partida		187,00
Costes indirectos	6%	11,22
TOTAL PARTIDA		**198,22**

01.03.02.09 **m** **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,64
Maquinaria		0,14
Resto de obra y materiales		24,89
Suma la partida		30,67
Costes indirectos	6%	1,84
TOTAL PARTIDA		**32,51**

01.03.02.10 **m2** **Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		108,66
Resto de obra y materiales		48,19
Suma la partida		156,85
Costes indirectos	6%	9,41
TOTAL PARTIDA		**166,26**

01.03.02.11 **m2** **Marca vial itinerario peatonal reflectante, blanca**

Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		17,66
Maquinaria		2,66
Resto de obra y materiales		5,40
Suma la partida		25,72
Costes indirectos	6%	1,54
TOTAL PARTIDA		**27,26**

01.03.02.12 **u** **Colocación placa de señalización de orientación**

Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		26,54
Resto de obra y materiales		133,24
Suma la partida		159,78
Costes indirectos	6%	9,59
TOTAL PARTIDA		**169,37**

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

02 PUERTO MAÓ
02.01 EM CRUCEROS
02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS

02.01.01.01 **m** **Desmontaje de mostradores no accesibles**

Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		57,59
Resto de obra y materiales		1,15
Suma la partida		58,74
Costes indirectos	6%	3,52
TOTAL PARTIDA		**62,26**

02.01.01.02 **m3** **Carga y transporte a vertedero (Mahón)**

Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Maquinaria		8,58
Resto de obra y materiales		28,32
Suma la partida		36,90
Costes indirectos	6%	2,21
TOTAL PARTIDA		**39,11**

02.01.02 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

02.01.02.01 **m** **Suministro y colocación de barandilla**

Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		23,33
Resto de obra y materiales		586,97
Suma la partida		610,30
Costes indirectos	6%	36,62
TOTAL PARTIDA		**646,92**

02.01.02.02 **m2** **Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		108,66
Resto de obra y materiales		48,19
Suma la partida		156,85
Costes indirectos	6%	9,41
TOTAL PARTIDA		**166,26**

02.01.02.03 **u** **Instalación de bucle de inducción magnética**

Instalación de bucle de inducción magnética
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,83
Resto de obra y materiales		382,80
Suma la partida		397,63
Costes indirectos	6%	23,86
TOTAL PARTIDA		**421,49**

02.01.02.04 **u** **Mostrador de atención al público accesible**

Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		110,36
Resto de obra y materiales		830,96
Suma la partida		941,32
Costes indirectos	6%	56,48
TOTAL PARTIDA		**997,80**

02.01.02.05 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,64
Resto de obra y materiales		299,92

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN		PRECIO
		Suma la partida		314,56
		Costes indirectos	6%	18,87
		TOTAL PARTIDA		**333,43**

02.01.02.06 **m** **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra			5,64
Maquinaria			0,14
Resto de obra y materiales			24,89
Suma la partida			30,67
Costes indirectos		6%	1,84
TOTAL PARTIDA			**32,51**

02.01.02.07 **u** **Vinilo adhesivo para señalización**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra			5,91
Resto de obra y materiales			38,37
Suma la partida			44,28
Costes indirectos		6%	2,66
TOTAL PARTIDA			**46,94**

02.01.02.08 **u** **Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera**

Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra			14,83
Resto de obra y materiales			637,80
Suma la partida			652,63
Costes indirectos		6%	39,16
TOTAL PARTIDA			**691,79**

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

02.02 EM COS NOU

02.02.01 ACTUACIONES PREVIAS

02.02.01.01 **m** **Desmontaje de mostradores no accesibles**

Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		57,59
Resto de obra y materiales		1,15
Suma la partida		58,74
Costes indirectos	6%	3,52
TOTAL PARTIDA		**62,26**

02.02.01.02 **m3** **Carga y transporte a vertedero (Mahón)**

Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Maquinaria		8,58
Resto de obra y materiales		28,32
Suma la partida		36,90
Costes indirectos	6%	2,21
TOTAL PARTIDA		**39,11**

02.02.02 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

02.02.02.01 **m2** **Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		108,66
Resto de obra y materiales		48,19
Suma la partida		156,85
Costes indirectos	6%	9,41
TOTAL PARTIDA		**166,26**

02.02.02.02 **u** **Instalación de bucle de inducción magnética**

Instalación de bucle de inducción magnética
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra			14,83
Resto de obra y materiales			382,80
Suma la partida			397,63
Costes indirectos		6%	23,86
TOTAL PARTIDA			**421,49**

02.02.02.03 **u** **Mostrador de atención al público accesible**

Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra			110,36
Resto de obra y materiales			830,96
Suma la partida			941,32
Costes indirectos		6%	56,48
TOTAL PARTIDA			**997,80**

02.02.02.04 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra			14,64
Resto de obra y materiales			299,92
Suma la partida			314,56
Costes indirectos		6%	18,87
TOTAL PARTIDA			**333,43**

02.02.02.05 **u** **Vinilo adhesivo para señalización**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra			5,91
Resto de obra y materiales			38,37
Suma la partida			44,28
Costes indirectos		6%	2,66
TOTAL PARTIDA			**46,94**

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

03 PUERTO EIVISSA
03.01 APB
03.01.01 ACTUACIONES PREVIAS

03.01.01.01 **m** **Desmontaje de mostradores no accesibles**

Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		57,59
Resto de obra y materiales		1,15
Suma la partida		58,74
Costes indirectos	6%	3,52
TOTAL PARTIDA		**62,26**

03.01.01.02 **u** **Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio**

Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		134,37
Resto de obra y materiales		2,69
Suma la partida		137,06
Costes indirectos	6%	8,22
TOTAL PARTIDA		**145,28**

03.01.01.03 **m3** **Carga y transporte a vertedero (Ibiza)**

Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Maquinaria		8,58
Resto de obra y materiales		28,32
Suma la partida		36,90
Costes indirectos	6%	2,21
TOTAL PARTIDA		**39,11**

03.01.02 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

03.01.02.01 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,64
Resto de obra y materiales		299,92
Suma la partida		314,56
Costes indirectos	6%	18,87
TOTAL PARTIDA		**333,43**

03.01.02.02 **m** **Suministro y colocación de barandilla**

Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		23,33
Resto de obra y materiales		586,97
Suma la partida		610,30
Costes indirectos	6%	36,62
TOTAL PARTIDA		**646,92**

03.01.02.03 **u** **Puerta abatible exterior**

Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		16,84
Resto de obra y materiales		1.346,23
Suma la partida		1.363,07
Costes indirectos	6%	81,78
TOTAL PARTIDA		**1.444,85**

03.01.02.04 **m** **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,64
Maquinaria		0,14
Resto de obra y materiales		24,89
Suma la partida		30,67
Costes indirectos	6%	1,84
TOTAL PARTIDA		**32,51**

03.01.02.05 m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		108,66
Resto de obra y materiales		48,19
Suma la partida		156,85
Costes indirectos	6%	9,41
TOTAL PARTIDA		**166,26**

03.01.02.06 u Vinilo adhesivo para señalización

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,91
Resto de obra y materiales		38,37
Suma la partida		44,28
Costes indirectos	6%	2,66
TOTAL PARTIDA		**46,94**

03.01.02.07 u Instalación de bucle de inducción magnética

Instalación de bucle de inducción magnética
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,83
Resto de obra y materiales		382,80
Suma la partida		397,63
Costes indirectos	6%	23,86
TOTAL PARTIDA		**421,49**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

03.01.02.08 **u** **Mostrador de atención al público accesible**

Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		110,36
Resto de obra y materiales		830,96
Suma la partida		941,32
Costes indirectos	6%	56,48
TOTAL PARTIDA		**997,80**

03.01.02.09 **u** **Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera**

Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,83
Resto de obra y materiales		637,80
Suma la partida		652,63
Costes indirectos	6%	39,16
TOTAL PARTIDA		**691,79**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

03.02 ESTACIÓN MARÍTIMA

03.02.01 ACTUACIONES PREVIAS

03.02.01.01 m Desmontaje de mostradores no accesibles

Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		57,59
Resto de obra y materiales		1,15
Suma la partida		58,74
Costes indirectos	6%	3,52
TOTAL PARTIDA		**62,26**

03.02.01.02 m3 Carga y transporte a vertedero (Ibiza)

Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Maquinaria		8,58
Resto de obra y materiales		28,32
Suma la partida		36,90
Costes indirectos	6%	2,21
TOTAL PARTIDA		**39,11**

03.02.02 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

03.02.02.01 m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		108,66
Resto de obra y materiales		48,19
Suma la partida		156,85
Costes indirectos	6%	9,41
TOTAL PARTIDA		**166,26**
Mano de obra		108,66
Resto de obra y materiales		48,19
Suma la partida		156,85
Costes indirectos	6%	9,41

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		TOTAL PARTIDA.....	**166,26**
03.02.02.02	**u**	**Instalación de bucle de inducción magnética**	
		Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra.....	14,83
		Resto de obra y materiales.....	382,80
		Suma la partida.....	397,63
		Costes indirectos 6%	23,86
		TOTAL PARTIDA.....	**421,49**
03.02.02.03	**u**	**Mostrador de atención al público accesible**	
		Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra.....	110,36
		Resto de obra y materiales.....	830,96
		Suma la partida.....	941,32
		Costes indirectos 6%	56,48
		TOTAL PARTIDA.....	**997,80**
03.02.02.04	**u**	**Colocación placa de señalización de orientación**	
		Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra.....	26,54
		Resto de obra y materiales.....	133,24
		Suma la partida.....	159,78
		Costes indirectos 6%	9,59
		TOTAL PARTIDA.....	**169,37**

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

03.03 EDIFICIO MARTILLO

03.03.01 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

03.03.01.01 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,64
Resto de obra y materiales		299,92
Suma la partida		314,56
Costes indirectos	6%	18,87
TOTAL PARTIDA		**333,43**

03.03.01.02 **u** **Vinilo adhesivo para señalización**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,91
Resto de obra y materiales		38,37
Suma la partida		44,28
Costes indirectos	6%	2,66
TOTAL PARTIDA		**46,94**

03.03.01.03 **m2** **Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		108,66
Resto de obra y materiales		48,19
Suma la partida		156,85
Costes indirectos	6%	9,41
TOTAL PARTIDA		**166,26**

03.03.01.04 **m** **Marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor**

Suministro y colocación de marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

Mano de obra		5,91
Resto de obra y materiales		23,07
Suma la partida		28,98
Costes indirectos	6%	1,74
TOTAL PARTIDA		**30,72**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

04 PUERTO LA SAVINA
04.01 ESTACIÓN MARÍTIMA
04.01.01 ACTUACIONES PREVIAS

04.01.01.01 **m** **Desmontaje de mostradores no accesibles**

Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio".
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		57,59
Resto de obra y materiales		1,15
Suma la partida		58,74
Costes indirectos	6%	3,52
TOTAL PARTIDA		**62,26**

04.01.01.02 **m3** **Carga y transporte a vertedero (La Savina)**

Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon.
En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Maquinaria		477,34
Resto de obra y materiales		37,70
Suma la partida		515,04
Costes indirectos	6%	30,90
TOTAL PARTIDA		**545,94**

04.01.02 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD

04.01.02.01 **m** **Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido**

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		14,64
Resto de obra y materiales		299,92
Suma la partida		314,56
Costes indirectos	6%	18,87
TOTAL PARTIDA		**333,43**

04.01.02.02 **m** **Suministro y colocación de barandilla**

Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO

y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		23,33
Resto de obra y materiales		586,97
Suma la partida		610,30
Costes indirectos	6%	36,62
TOTAL PARTIDA		**646,92**

04.01.02.03 **m** **Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante**

Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,64
Maquinaria		0,14
Resto de obra y materiales		24,89
Suma la partida		30,67
Costes indirectos	6%	1,84
TOTAL PARTIDA		**32,51**

04.01.02.04 **m2** **Colocación pavimento PTI ranurado y direccional**

Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		108,66
Resto de obra y materiales		48,19
Suma la partida		156,85
Costes indirectos	6%	9,41
TOTAL PARTIDA		**166,26**

04.01.02.05 **u** **Vinilo adhesivo para señalización**

Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1.
En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

Mano de obra		5,91
Resto de obra y materiales		38,37

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		Suma la partida.....	44,28
		Costes indirectos 6%	2,66
		TOTAL PARTIDA.....	**46,94**
04.01.02.06	**u**	**Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra.....	14,83
		Resto de obra y materiales.....	382,80
		Suma la partida.....	397,63
		Costes indirectos 6%	23,86
		TOTAL PARTIDA.....	**421,49**
04.01.02.07	**u**	**Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	
		Mano de obra.....	110,36
		Resto de obra y materiales.....	830,96
		Suma la partida.....	941,32
		Costes indirectos 6%	56,48
		TOTAL PARTIDA.....	**997,80**

IDOM

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05		**SEGURIDAD Y SALUD**	
05.01	**u**	**Partida de abono integro en Seguridad y Salud** Partida de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el documento adjunto correspondiente.	

Sin descomposición

Suma la partida.....		4.952,83
Costes indirectos	6%	297,17
TOTAL PARTIDA.....		**5.250,00**

El contratista no puede, bajo ningún concepto de error u omisión en estos detalles, reclamar modificación alguna en los precios señalados en esta Justificación de Precios.
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

En Palma de Mallorca, julio de 2024

El Autor del Proyecto

Carlos Torralba Feliu
Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Revisado y conforme,
El Jefe de Área de Infraestructuras

Víctor Darder Gallardo
Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Vº Bº
El Director

Antonio Ginard López
Ing. de Caminos, Canales y Puertos

PRESUPUESTO

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	**PUERTO ALCUDIA**			
01.01	**OFICINAS APB**			
01.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**			
01.01.01.01	**u Demolición de mostrador** Demolición de estructura del mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**4,000**	**13,72**	**54,88**
01.01.01.02	**u Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio** Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,000**	**145,28**	**290,56**
01.01.01.03	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**1,450**	**62,26**	**90,28**
01.01.01.04	**m3 Carga y transporte a vertedero** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**6,800**	**121,76**	**827,97**
	TOTAL 01.01.01			**1.263,69**
01.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**			
01.01.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**22,100**	**333,43**	**7.368,80**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.02.02	**m Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	2,600	646,92	1.681,99
01.01.02.03	**u Puerta abatible exterior** Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	1,000	1.444,85	1.444,85
01.01.02.04	**u Puerta interior de madera** Suministro y colocación de puerta interior de madera para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, acabado a definir por el Director Facultativo, incluso herrajes de cierre y de colgar. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	1,000	562,17	562,17
01.01.02.05	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	3,000	32,51	97,53
01.01.02.06	**m2 Pavimento de piezas igual a las existentes** Suministro y colocación pavimento de loseta, de dimensiones y características similares a las existentes, sentada con mortero de cemento de 3 cm de espesor, incluso parte proporcional de junta de dilatación, enlechado y limpieza, medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	2,050	45,01	92,27
01.01.02.07	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura.	8,430	166,26	1.401,57

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.			
01.01.02.08	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**3,000**	**46,94**	**140,82**
01.01.02.09	**u Colocación placa de señalización de orientación** Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**1,000**	**169,37**	**169,37**
01.01.02.10	**u Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,000**	**421,49**	**842,98**
01.01.02.11	**u Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,000**	**997,80**	**1.995,60**
01.01.02.12	**u Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera** Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,000**	**691,79**	**1.383,58**
	TOTAL 01.01.02			**17.181,53**
	TOTAL 01.01			**18.445,22**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02	**ESTACIÓN MARÍTIMA**			
01.02.01	**ACTUACIONES PREVIAS**			
01.02.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,410**	**62,26**	**150,05**
01.02.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,020**	**121,76**	**245,96**
	TOTAL 01.02.01			**396,01**
01.02.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**			
01.02.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**80,300**	**333,43**	**26.774,43**
01.02.02.02	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**17,000**	**32,51**	**552,67**
01.02.02.03	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**24,000**	**46,94**	**1.126,56**
01.02.02.04	**u Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra	**1,000**	**997,80**	**997,80**

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.			
01.02.02.05	**u Recolocación de señal** Desmontaje, traslado y posterior montaje de señal existente. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**1,000**	**31,13**	**31,13**
01.02.02.06	**u Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**3,000**	**421,49**	**1.264,47**
	TOTAL 01.02.02			**30.747,06**
	TOTAL 01.02			**31.143,07**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03	**LONJA**			
01.03.01	**ACTUACIONES PREVIAS**			
01.03.01.01	**m3 Repicado de rampa existente** Repicado de superficie de hormigón, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	8,700	175,95	1.530,77
01.03.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	12,180	121,76	1.483,04
	TOTAL 01.03.01			**3.013,81**
01.03.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**			
01.03.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	29,740	333,43	9.916,21
01.03.02.02	**m Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	15,330	646,92	9.917,28
01.03.02.03	**u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, de dos hojas batientes** Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, dos hojas batientes, para una luz que se adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	3,000	883,92	2.651,76
01.03.02.04	**u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente** Suministro y montaje de puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz que se	3,000	654,17	1.962,51

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	adapte al hueco de obra disponible, precio alto, colocada, color a definir por el Director Facultativo. En caso de que no cumpla el hueco de obra con la normativa, se incluye las obras y materiales derivados de las actuaciones necesarias para la adaptación de dicho hueco. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.			
01.03.02.05	**u Puerta abatible exterior** Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**17,000**	**1.444,85**	**24.562,45**
01.03.02.06	**u Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio** Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de dimensiones adecuadas para el hueco de obra, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales para su instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,000**	**3.423,92**	**6.847,84**
01.03.02.07	**u Colocación señal vertical, hormigonado** Colocación de tubo de acero galvanizado de señal vertical, colocado en tierra hormigonado. Incluye placa de orientación o situación para señales de tráfico, de acero galvanizado y pintado, de 55x70 cm, acabada con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**1,000**	**223,09**	**223,09**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03.02.08	**m2 Formación de rampa accesible** Formación de rampa compuesta por recrecido de hormigón de 15 cm de espesor medio y suministro y colocación de pavimento cerámico, recibido con mortero adhesivo, previa preparación de la superficie a la colocación. El solado incluye rejuntado, devastado, pulido y abrillantado. Incluye encofrado y parte proporcional de junta de acero inoxidable en cambio de pavimentos. Totalmente terminado y ejecutado conforme a especificaciones del CTE. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	8,740	198,22	1.732,44
01.03.02.09	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	10,950	32,51	355,98
01.03.02.10	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	7,670	166,26	1.275,21
01.03.02.11	**m2 Marca vial itinerario peatonal reflectante, blanca** Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina autopropulsada En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	5,300	27,26	144,48
01.03.02.12	**u Colocación placa de señalización de orientación** Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	2,000	169,37	338,74

TOTAL 01.03.02	**59.927,99**
TOTAL 01.03	**62.941,80**
TOTAL 01	**112.530,09**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	**PUERTO MAÓ**			
02.01	**EM CRUCEROS**			
02.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**			
02.01.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**13,800**	**62,26**	**859,19**
02.01.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero (Mahón)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**11,590**	**39,11**	**453,28**
	TOTAL 02.01.01			**1.312,47**
02.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**			
02.01.02.01	**m Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**6,150**	**646,92**	**3.978,56**
02.01.02.02	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**14,730**	**166,26**	**2.449,01**
02.01.02.03	**u Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**7,000**	**421,49**	**2.950,43**
02.01.02.04	**u Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias	**3,000**	**997,80**	**2.993,40**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.			
02.01.02.05	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**17,230**	**333,43**	**5.745,00**
02.01.02.06	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**45,000**	**32,51**	**1.462,95**
02.01.02.07	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**7,000**	**46,94**	**328,58**
02.01.02.08	**u Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera** Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,000**	**691,79**	**1.383,58**
	TOTAL 02.01.02			**21.291,51**
	TOTAL 02.01			**22.603,98**

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

IDOM

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02	**EM COS NOU**			
02.02.01	**ACTUACIONES PREVIAS**			
02.02.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**4,000**	**62,26**	**249,04**
02.02.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero (Mahón)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**3,360**	**39,11**	**131,41**
	TOTAL 02.02.01			**380,45**
02.02.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**			
02.02.02.01	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**10,760**	**166,26**	**1.788,96**
02.02.02.02	**u Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,000**	**421,49**	**842,98**
02.02.02.03	**u Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,000**	**997,80**	**1.995,60**
02.02.02.04	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye	**3,250**	**333,43**	**1.083,65**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.			
02.02.02.05	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**4,000**	**46,94**	**187,76**
	TOTAL 02.02.02			**5.898,95**
	TOTAL 02.02			**6.279,40**
	TOTAL 02			**28.883,38**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	**PUERTO EIVISSA**			
03.01	**APB**			
03.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**			
03.01.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,190**	**62,26**	**136,35**
03.01.01.02	**u Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio** Desmontaje de carpintería existente, metálica, madera o aluminio, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**1,000**	**145,28**	**145,28**
03.01.01.03	**m3 Carga y transporte a vertedero (Ibiza)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,060**	**39,11**	**80,57**
	TOTAL 03.01.01			**362,20**
03.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**			
03.01.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**58,510**	**333,43**	**19.508,99**
03.01.02.02	**m Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**21,750**	**646,92**	**14.070,51**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.01.02.03	**u Puerta abatible exterior** Suministro y montaje de puerta de aluminio lacado, color a definir por el Director Facultativo de 60 micras de espesor, con RPT, sello de calidad QUALICOAT, colocada sobre premarco de aluminio fijado a la fábrica mediante patillas de 100 mm longitud mínima, con el marco atornillado al premarco. Compuesta por una hoja batiente, para un hueco de obra existente y que cumpla con la normativa, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con doble acristalamiento de 4+4 KSIF PLUS/12/4+4, incluso masillas de sellado, herrajes de cierre y de colgar de acero inoxidable, perfectamente nivelada y aplomada. Incluye barra antipánico interior. En caso de que el hueco de la puerta no fuera el definido por la normativa, se incluye la modificación de este con las respectivas actuaciones de obra y materiales correspondientes. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	1,000	1.444,85	1.444,85
03.01.02.04	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	34,600	32,51	1.124,85
03.01.02.05	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	14,800	166,26	2.460,65
03.01.02.06	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	13,000	46,94	610,22
03.01.02.07	**u Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	1,000	421,49	421,49
03.01.02.08	**u Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además	1,000	997,80	997,80

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.			
03.01.02.09	**u Unidad de hasta un total de 4 asientos para zona de espera** Desmontaje, traslado dentro del mismo edificio y acopio de unidades de asientos existentes e instalación de nuevas unidades de hasta un total de 4 asientos accesibles. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	1,000	691,79	691,79
	TOTAL 03.01.02			**41.331,15**
	TOTAL 03.01			**41.693,35**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.02	**ESTACIÓN MARÍTIMA**			
03.02.01	**ACTUACIONES PREVIAS**			
03.02.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**14,880**	**62,26**	**926,43**
03.02.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero (Ibiza)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**12,500**	**39,11**	**488,88**
	TOTAL 03.02.01			**1.415,31**
03.02.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**			
03.02.02.01	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**48,780**	**166,26**	**8.110,16**
03.02.02.02	**u Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**4,000**	**421,49**	**1.685,96**
03.02.02.03	**u Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**4,000**	**997,80**	**3.991,20**
03.02.02.04	**u Colocación placa de señalización de orientación** Colocación de placa de señalización de orientación con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los	**1,000**	**169,37**	**169,37**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.

TOTAL 03.02.02 ..... 13.956,69

TOTAL 03.02 ..... 15.372,00

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.03	**EDIFICIO MARTILLO**			
03.03.01	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**			
03.03.01.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**61,000**	**333,43**	**20.339,23**
03.03.01.02	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**1,000**	**46,94**	**46,94**
03.03.01.03	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**0,600**	**166,26**	**99,76**
03.03.01.04	**m Marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor** Suministro y colocación de marco cromáticamente contrastado por el exterior del ascensor. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**5,350**	**30,72**	**164,35**
	TOTAL 03.03.01			**20.650,28**
	TOTAL 03.03			**20.650,28**
	TOTAL 03			**77.715,63**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	**PUERTO LA SAVINA**			
04.01	**ESTACIÓN MARÍTIMA**			
04.01.01	**ACTUACIONES PREVIAS**			
04.01.01.01	**m Desmontaje de mostradores no accesibles** Desmontaje de mostrador existente con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero, incluso medios auxiliares y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución. Se incluye la separación de los residuos (separando hormigón, acero, madera, etc.) de manera que el transporte a vertedero se realice como escombro "limpio". En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**12,000**	**62,26**	**747,12**
04.01.01.02	**m3 Carga y transporte a vertedero (La Savina)** Carga y transporte de residuos a centro gestión de residuo "limpio", con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos, incluso canon. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**10,080**	**545,94**	**5.503,08**
	TOTAL 04.01.01			**6.250,20**
04.01.02	**ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD**			
04.01.02.01	**m Suministro y colocación de pasamanos AISI 316 acabado pulido** Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido brillante, con soportes del mismo material fijados a los pilares mediante soldadura. Incluye perfil auxiliar de acero inoxidable AISI 316 de unión entre tramos de barandilla, así como montantes verticales rectangulares de 40x10mm anclados mediante pletina atornillada al mismo. En esta partida se incluyen todos los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**2,210**	**333,43**	**736,88**
04.01.02.02	**m Suministro y colocación de barandilla** Suministro y colocación de barandilla, formada por montantes planos de acero inoxidable y de 50x5mm, pletina 5mm de anclaje a suelo, pasamanos de 4cm de diámetro de acero inoxidable, sujetos con perfiles Z de 20x12x4mm. Barrado con huecos no superiores a 10cm. Categoría de uso C5. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**20,620**	**646,92**	**13.339,49**
04.01.02.03	**m Remate con revestimiento cerámico o de piedra tira de carborúndum antideslizante** Suministro y colocación de franjas antideslizantes de señalización podotáctil sobre el pavimento. Anchura de franja de 48mm y altura de 4mm. Incluso pulido previo del pavimento donde se instalarán las franjas. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**63,000**	**32,51**	**2.048,13**
04.01.02.04	**m2 Colocación pavimento PTI ranurado y direccional** Suministro y colocación de pavimento de loseta con tacos de las mismas dimensiones que las losetas existentes, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería junto con franjas podotáctiles indicadores direccionales para formación	**18,040**	**166,26**	**2.999,33**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	de itinerario accesible, de 1200mm de anchura. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.			
04.01.02.05	**u Vinilo adhesivo para señalización** Colocación de vinilo adhesivo para señalización acabado con lámina retrorreflectante clase RA1. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**19,000**	**46,94**	**891,86**
04.01.02.06	**u Instalación de bucle de inducción magnética** Instalación de bucle de inducción magnética En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**8,000**	**421,49**	**3.371,92**
04.01.02.07	**u Mostrador de atención al público accesible** Ejecución del mostrador de atención al público accesible. Se incluyen las actuaciones necesarias asociadas, tales como la reconstrucción de la zona de instalación. En esta partida se incluyen todos los materiales antes comentados, su correspondiente mano de obra y los posibles gastos indirectos subyacentes de la propia partida. También se incluyen todos aquellos materiales, elementos, accesorios, medios (mecánicos, humanos) y recursos necesarios para su total puesta en obra y ayudas de albañilería necesarias para su correcta ejecución, eliminación de restos y limpieza. Además del cumplimiento de las consiguientes medidas de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos.	**3,000**	**997,80**	**2.993,40**
	TOTAL 04.01.02			**26.381,01**
	TOTAL 04.01			**32.631,21**
	TOTAL 04			**32.631,21**

IDOM

Ports de Balears
Autoritat Portuària de Balears

PRESUPUESTO

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	**SEGURIDAD Y SALUD**			
05.01	**u Partida de abono integro en Seguridad y Salud** Partida de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el documento adjunto correspondiente.	**1,000**	**5.250,00**	**5.250,00**
	TOTAL 05			**5.250,00**
	TOTAL			**257.010,31**

IDOM

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	PUERTO ALCUDIA	112.530,09	43,78
02	PUERTO MAÓ	28.883,38	11,24
03	PUERTO EIVISSA	77.715,63	30,24
04	PUERTO LA SAVINA	32.631,21	12,70
05	SEGURIDAD Y SALUD	5.250,00	2,04

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL **257.010,31**

13,00 % Gastos generales 33.411,34
6,00 % Beneficio industrial 15.420,62

Suma..... 48.831,96

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN **305.842,27**

21% IVA..... 64.226,88

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA **370.069,15**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

, .

En Palma de Mallorca, julio de 2024

El Autor del Proyecto

Carlos Torralba Feliu
Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Revisado y conforme,
El Jefe de Área de Infraestructuras

Víctor Darder Gallardo
Ing. de Caminos, Canales y Puertos

Vº Bº
El Director

Antonio Ginard López
Ing. de Caminos, Canales y Puertos
